

実施計画に係る事業進捗状況

令和6年11月19日

独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社淀川本部
丹生事務所

実施内容について（水機構）

①-1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備（道路原形復旧及び改良）

- ・道路整備: R6年度 針川～中河内工区 約 1.7km は災害復旧工事等の中で対応予定
- ・斜面对策: R6年度 鷺見 1箇所 引き続き施工
- ・橋梁整備: R6年度 本設橋の取り付け部の施工及び仮設橋の撤去を実施

⑭-1 残存山林の補償

- ・補償対象地の権利関係確認のため関係者の意向確認を行い、地権者との補償協議を実施中。引き続き、補償契約の進捗を図る。（R6年10月末現在:進捗率:約96% (3,035ha／3,150ha)）

⑭-4 集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

- ・R6年度: 半明、尾羽梨、奥川並地区を整備予定。

⑭-6 付替県道妙理谷工区の管理


- ・水機構にて管理を継続中（R1年度～）
- ・R6年度に安全対策工事が完了し、滋賀県、長浜市に引き渡し予定。

⑮-1 発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

- ・八田部: R6年度は、跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備（整地、構造物撤去、法面除草）を予定。

①-1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備

- ・滋賀県の拡幅工事(水機構が滋賀県より施工受託)と併せ道路原形復旧を実施。
- ・針川～中河内工区の約1.7kmの道路整備については、災害復旧工事等の中で対応予定。

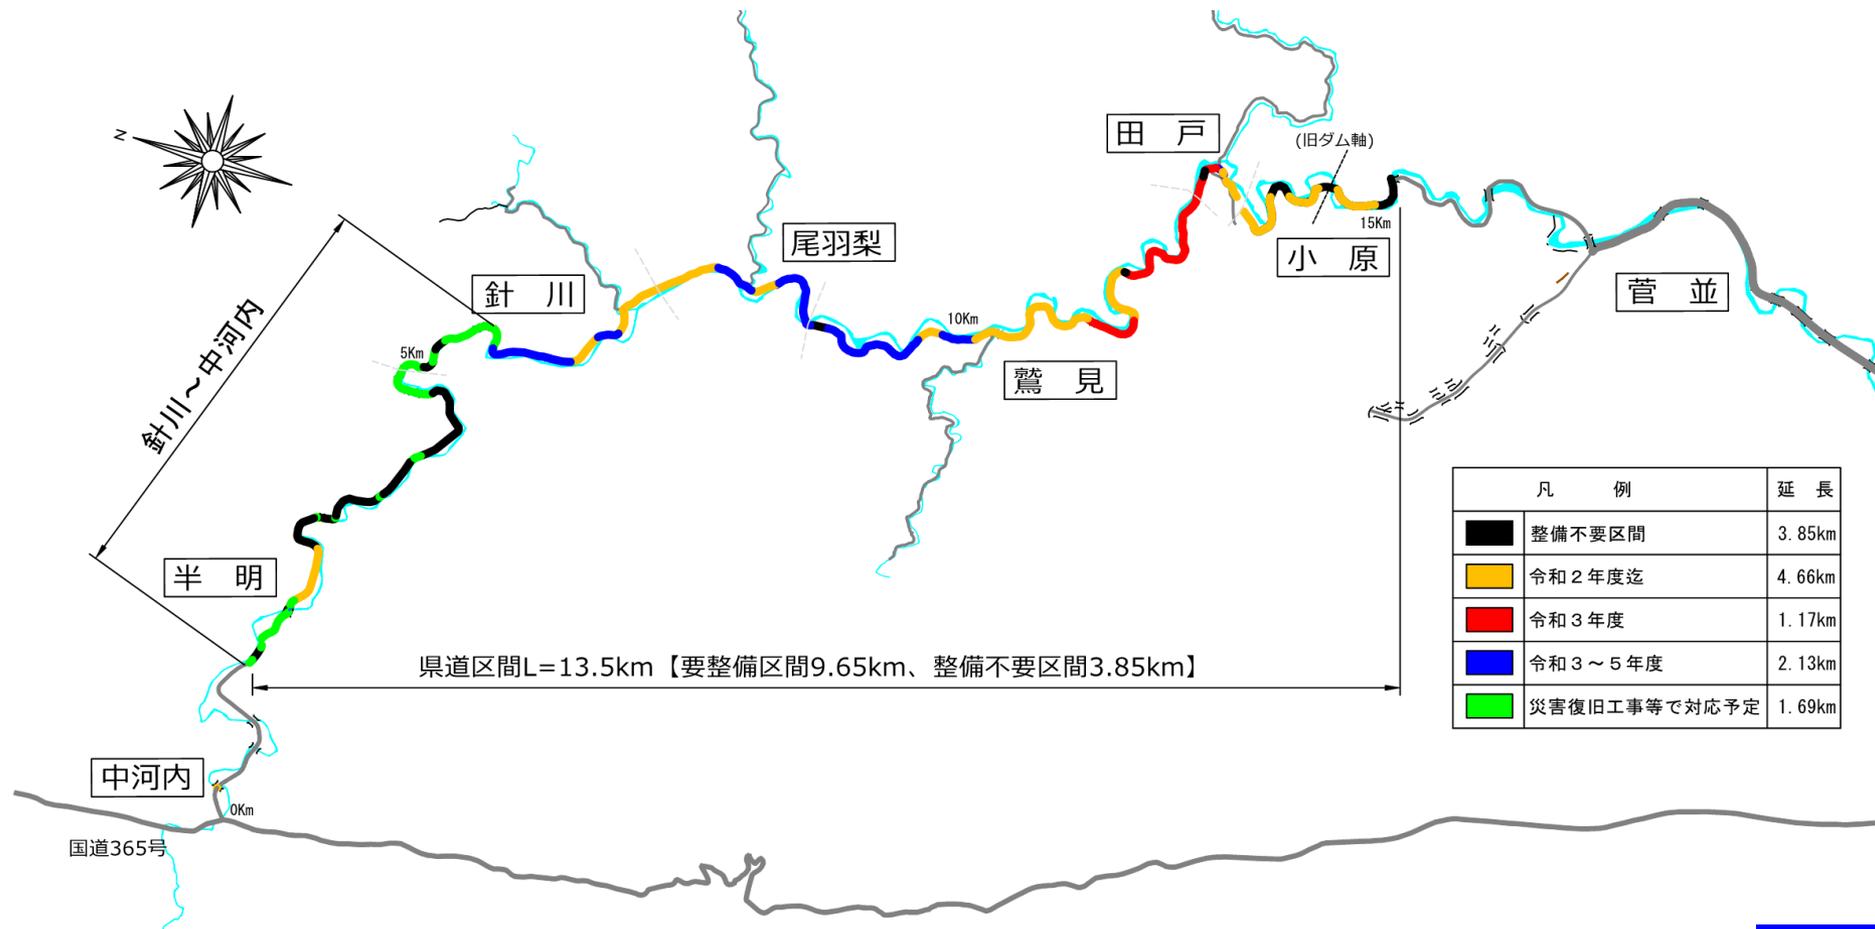

①-1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備 (工事用道路2号線の引き渡しのため)

R6年度～施工中

- ・工事用道路を県道として引き渡すため、R5年度、本設橋の上部工が完成。
- ・R6年度は、本設橋の取り付け部の施工及び仮設橋の撤去を実施。

工事内容


- ・R6年度 取り付け部施工
- ・R6～R7年度 仮設橋撤去(上部工・下部工)



R6/9/26撮影

①-1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備

R5年度～施工中

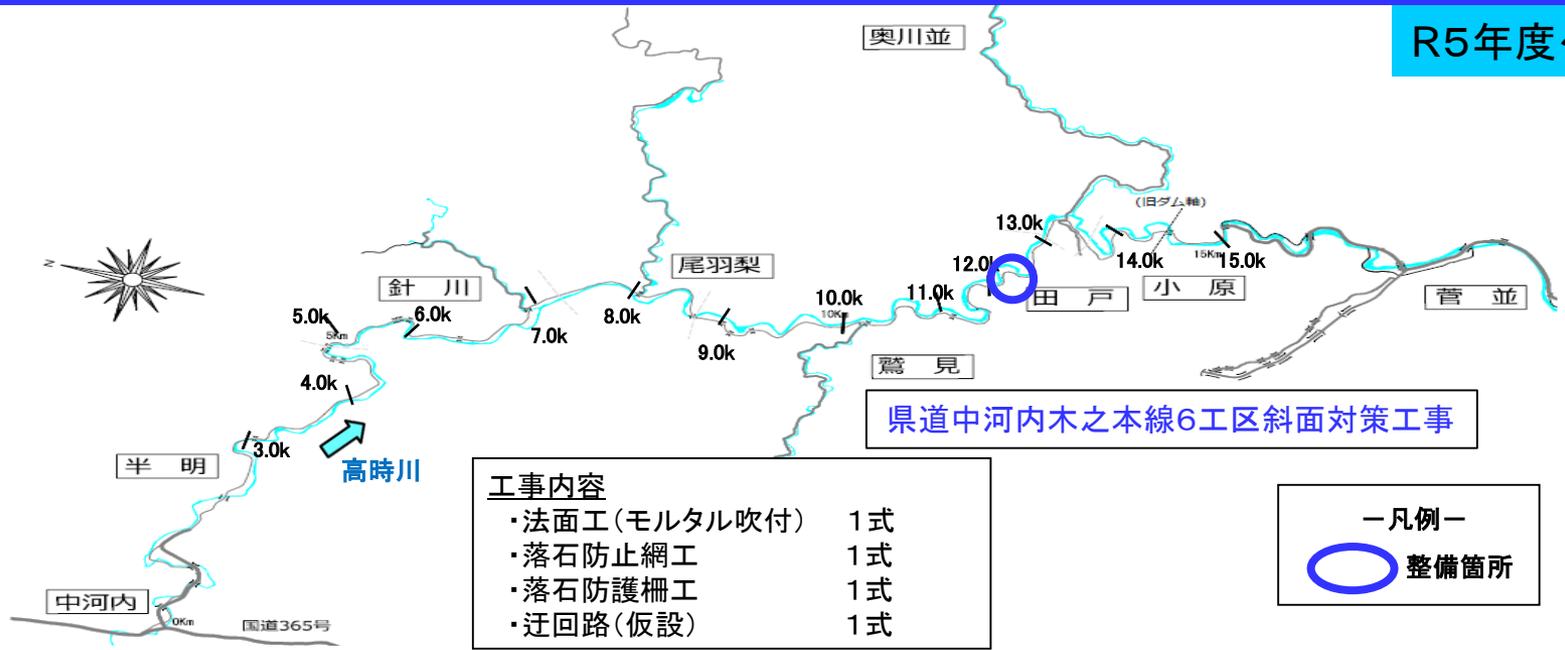


県道中河内木之本線6工区斜面对策工事

工事内容

| | |
|--------------|----|
| ・法面工(モルタル吹付) | 1式 |
| ・落石防止網工 | 1式 |
| ・落石防護柵工 | 1式 |
| ・迂回路(仮設) | 1式 |


—凡例—

 整備箇所

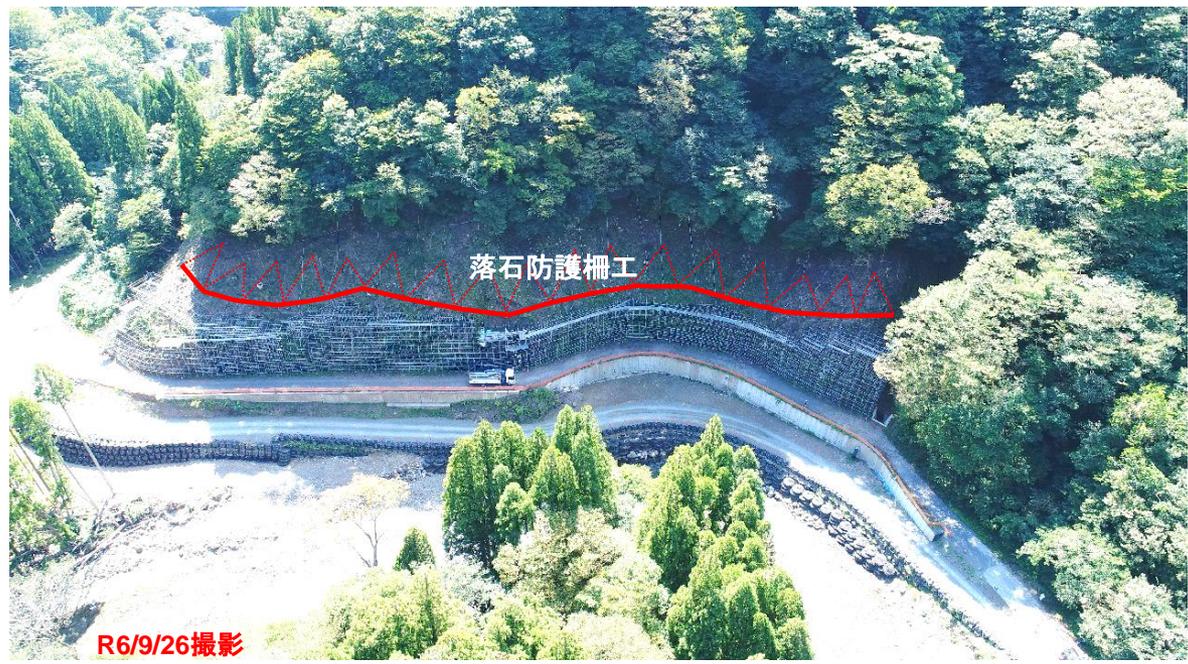

⑭-1 残存山林の補償


・残存山林については、R2年度より補償手続きを開始。R6年度も引き続き、補償契約の進捗を図る。
 (補償対象面積:約3,150ha、R6年10月末現在:契約済面積:約3,035ha、進捗率:約96%)

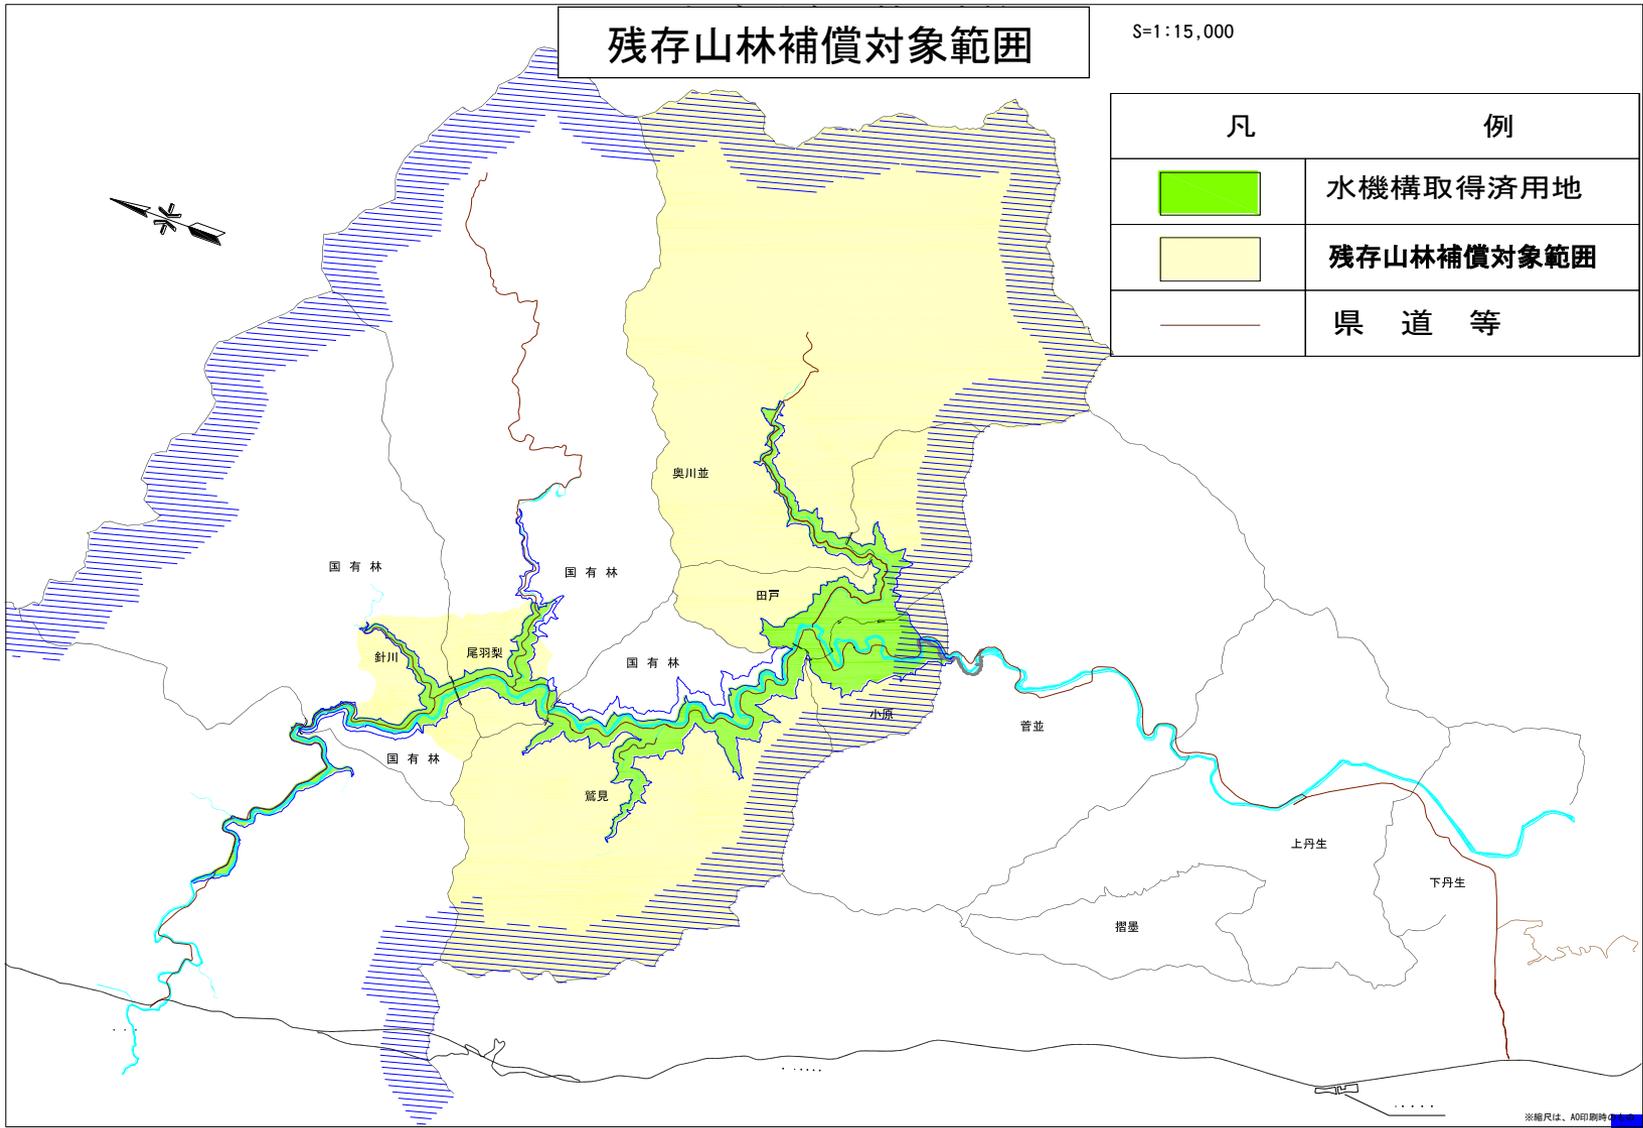

⑭-4 集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

R5年度～施工中


・R6年度は、半明、尾羽梨、奥川並地区の整備を予定。

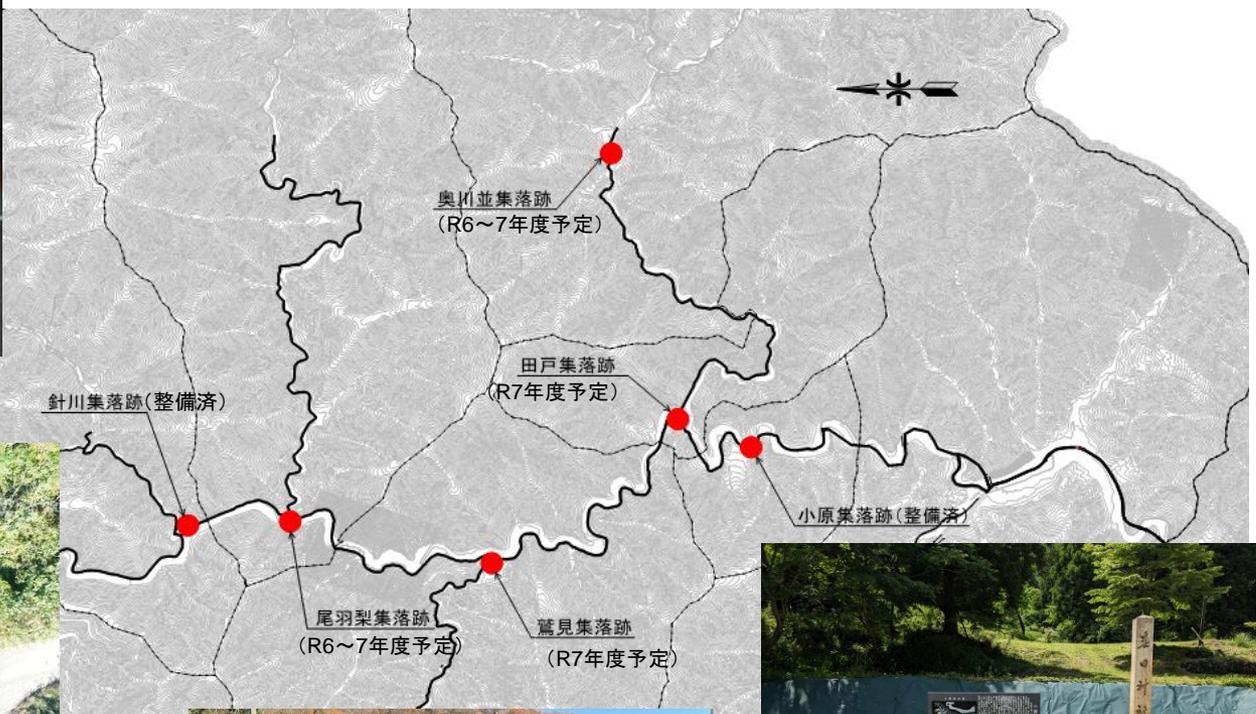

⑭-6 付替県道妙理谷工区の管理

R5年度～R6年度

- ・水機構にて管理を継続中(R1年度～)
- ・R6年度に安全対策工事が完了し、滋賀県、長浜市に引き渡し予定。

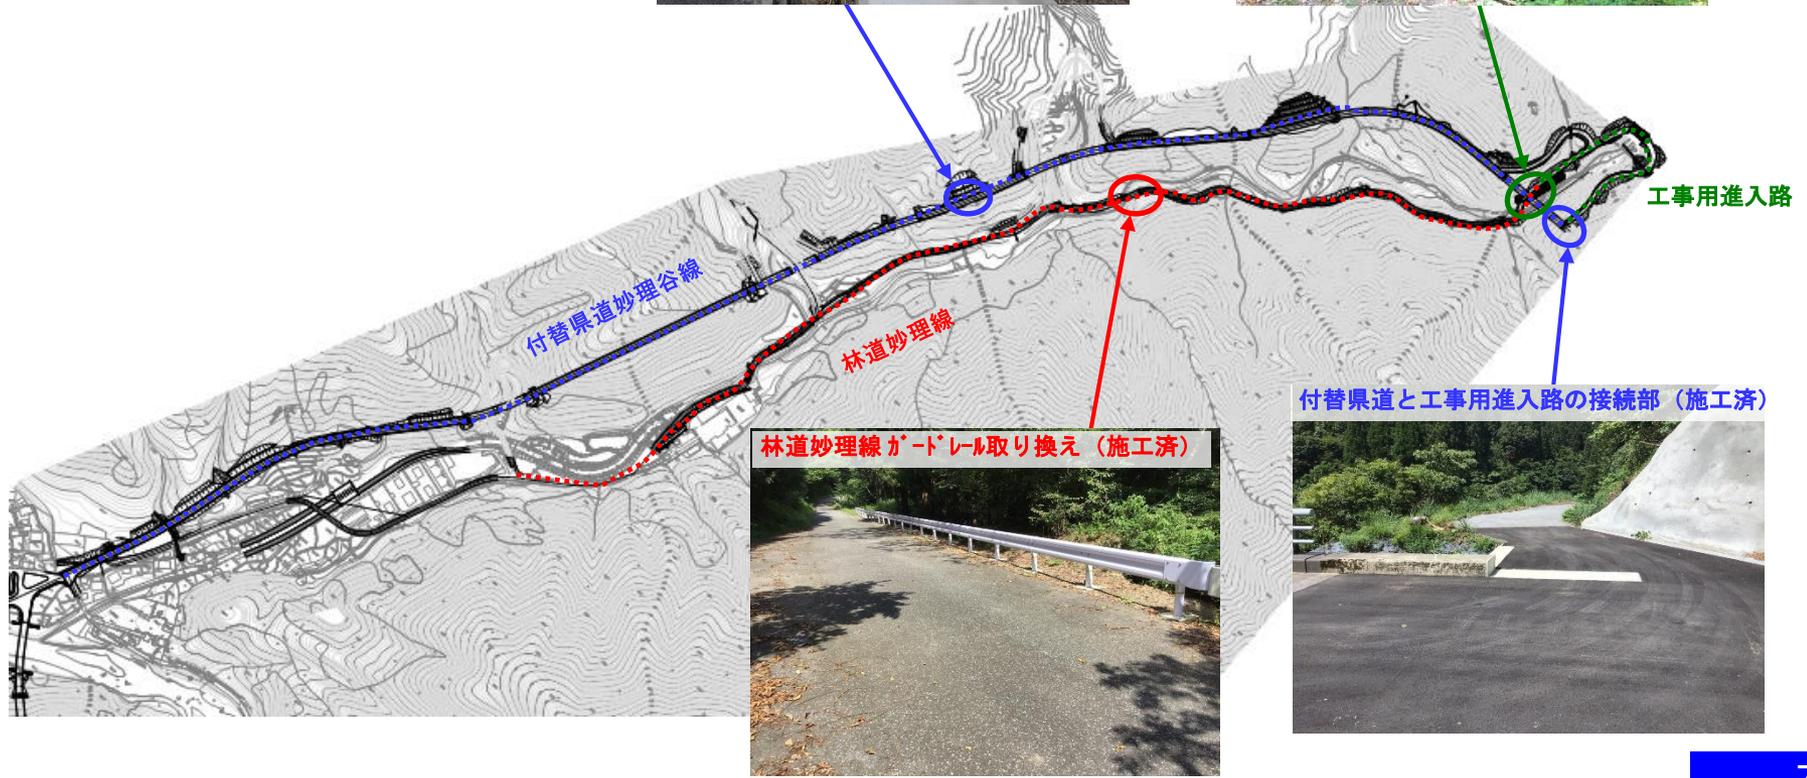

⑮-1 発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

・八田部発生土受入地については、R6年度に跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備（整地、構造物撤去、法面除草）を予定。

