



○窪田遊水地の工事進捗を視覚的に把握いただくため、第36号よりドローンによる空撮写真を掲載しています！

全景（大和川側）



全景（岡崎川側）



R7大和川窪田遊水地掘削他工事【株式会社 城内組】

掘削工 (ICT)



緑の着色範囲で掘削が完了しています。



掘削状況

迂回道路撤去工



迂回道路撤去状況

水路工 (1)



型枠建込状況



工事の進捗

令和8年8月5日時点の進捗

○掘削工 (ICT)

約8,600m³/41,000m³完了。

○迂回道路撤去工

約8,600m³/27,000m³完了。

○水路工 (1)

約130m/260mの掘削→均しコン→外型枠の建込をしています。

R7大和川窪田遊水地北側周囲堤他工事【株式会社 城内組】

擁壁護岸工（重力式擁壁）




コンクリート打設完了

河川土工（盛土工ICT）



盛土状況

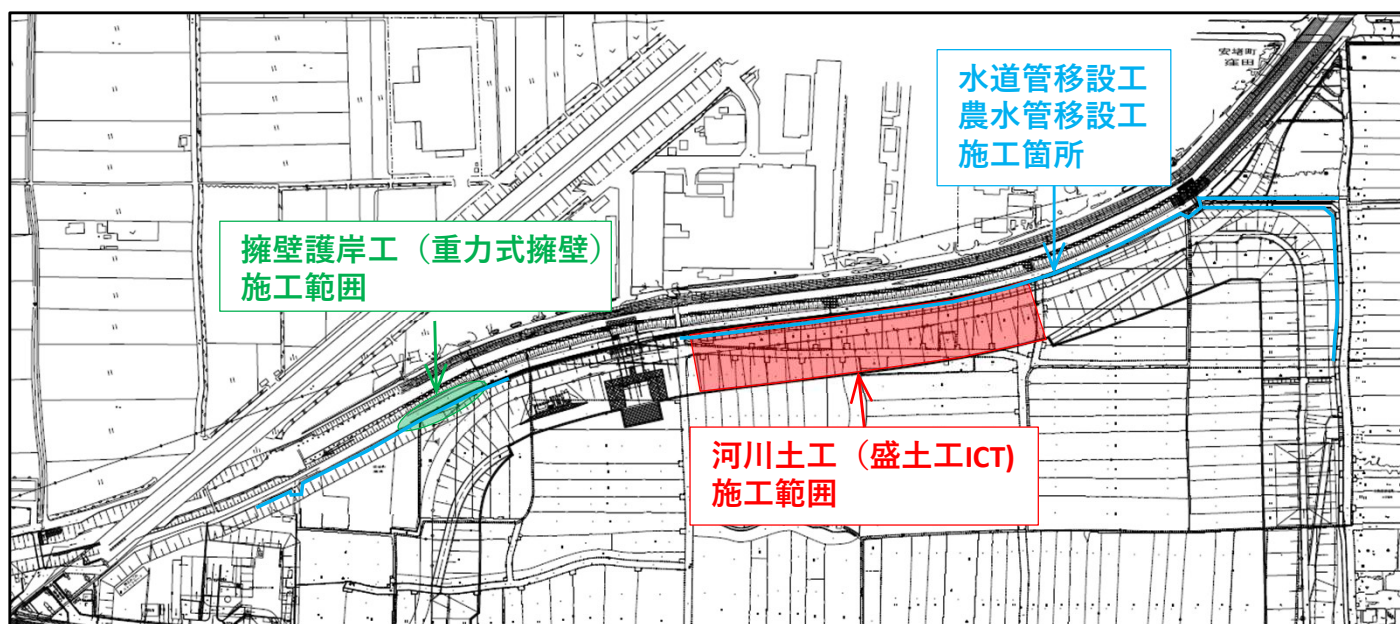

工事の進捗

令和8年8月6日時点での進捗

○河川土工（盛土工ICT）

約1,500m³/46,000m³完了

○擁壁護岸工（重力式擁壁）：42.8m

8月6日コンクリート打設完了。（全延長完了）

8月17日～型枠解体予定

○水道管移設工・農水管移設工

8月17日～施工開始予定

8月の作業

- : 掘削工(ICT)
- : 土質改良工
- : 盛土工(ICT)
- : 工事用車両ルート

改良
ヤード

工事概要

- ★掘削した土を改良ヤードに運搬します。
- ★改良ヤードで改良した土を盛土場へ運搬し、転圧します。



掘削写真

運搬



改良写真

運搬



転圧写真

R7大和川窪田遊水地内水取込樋門発電機棟他新築工事【昌栄建設(株)】


8月の工事内容

①排水樋門上屋

屋根葺き、内部土間コンクリート打設、
外装仕上げ準備

②発電機棟

仮設足場組立、柱・壁など鉄筋・型枠の
組立

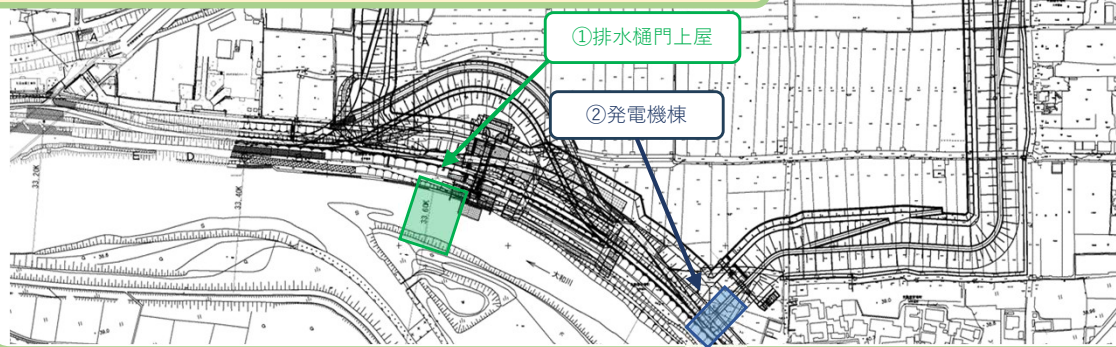

工事の進捗

排水樋門上屋

鉄骨にALC壁、アルミサッシ、屋根の下地材が付いて、建物らしくなりました。
8月も引き続き屋根葺き、内部仕上げ、外装の塗装準備などを行います。



発電機棟

外部足場の組立て状況です。
RC造の建物なので、これから柱、壁、屋根をコンクリートで作ります。その前にコンクリートを補強するための鉄筋、生コンで柱などを形作るための型枠を組立てます。

