

【事業概要】

現在の阪神なんば線淀川橋梁は、河川内に39本と多くの橋脚があり、桁下高が低いため、洪水の流れを阻害し、大規模な洪水が発生した際には、橋梁の堰上げにより、上流で堤防が決壊する恐れがあります。また、橋梁部分は堤防を切り込む形になっており、高潮時には陸閘を閉鎖することで浸水被害を回避している状況です。

橋梁の改築により、橋脚数を減らし、桁下高を上げることで、洪水を安全に流下させるとともに、陸閘をなくすことで高潮時の安全性を確保する事が出来ます。

各工区の工事 2025年度の主な作業内容(予定)

1工区 淀川北岸線付近から福駅西踏切まで

場所打ち杭工、躯体構築工、PC桁吊上工

2工区 福駅西踏切から淀川右岸まで

場所打ち杭工、躯体構築工、福駅建築設備工

3工区 淀川右岸から河川中心まで



上部工架設工

4工区 河川中心から淀川左岸まで

上部工架設工

5工区 淀川左岸から正蓮寺川まで

場所打ち杭工、躯体構築工、高架仮線橋脚構築工

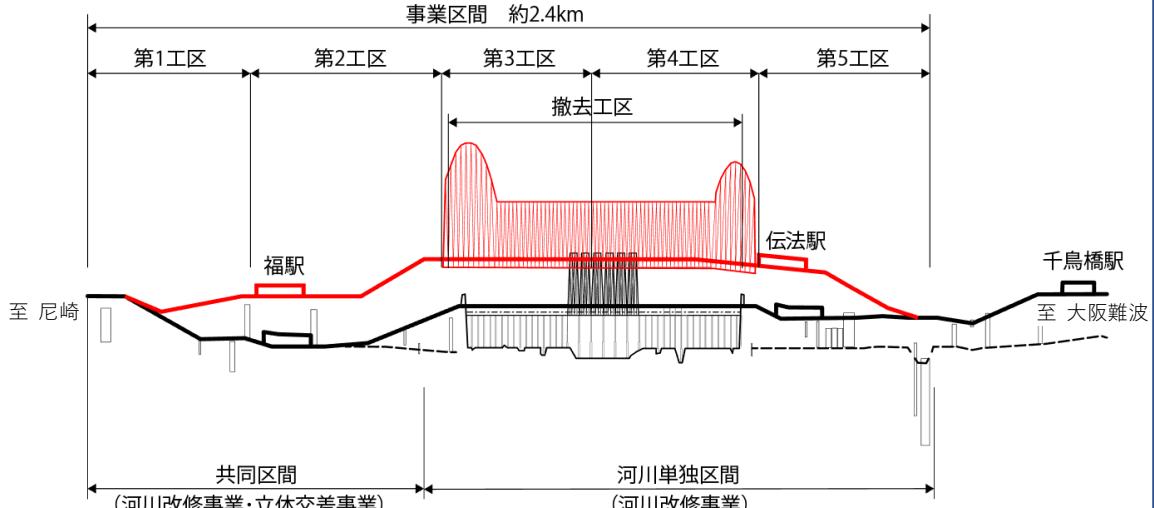

全体工程

現在



【事業進捗報告】－阪神なんば線淀川橋梁改築事業－


(2025.12)

全体位置図



【2025.9～2025.11までの工事】

①躯体構築工（掘削、土留支保工）

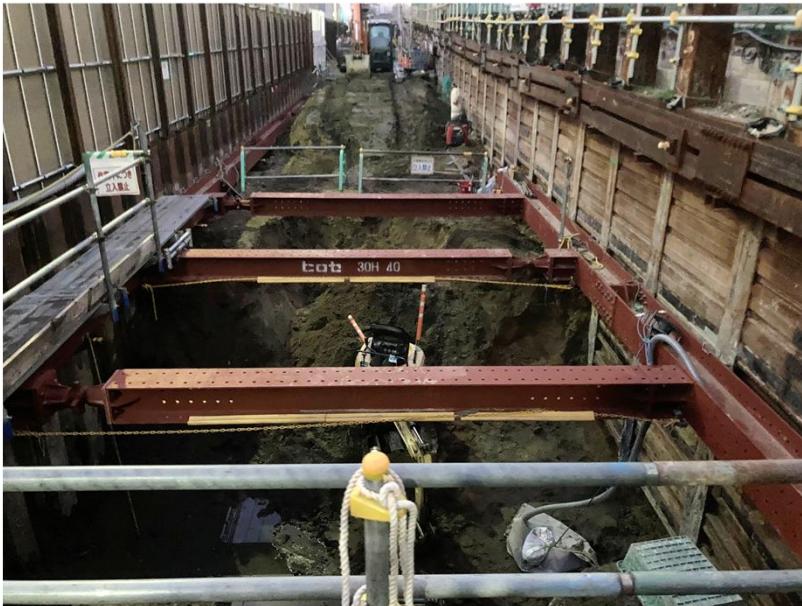

②躯体構築工（掘削、土留支保工）




【2025.9～2025.11までの工事】

①駅舎構築工（福駅）




②躯体構築工（下りホーム）

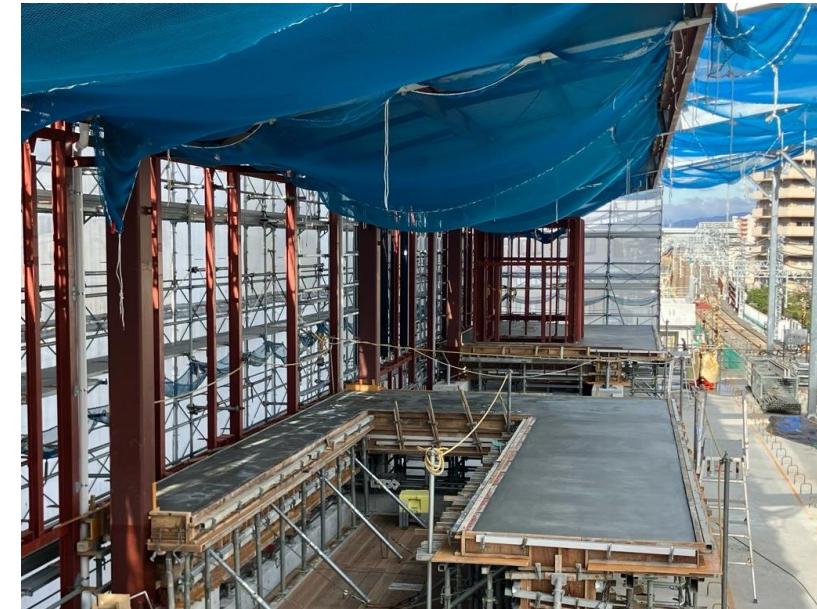

③躯体構築工



④躯体構築工（掘削、土留支保工）

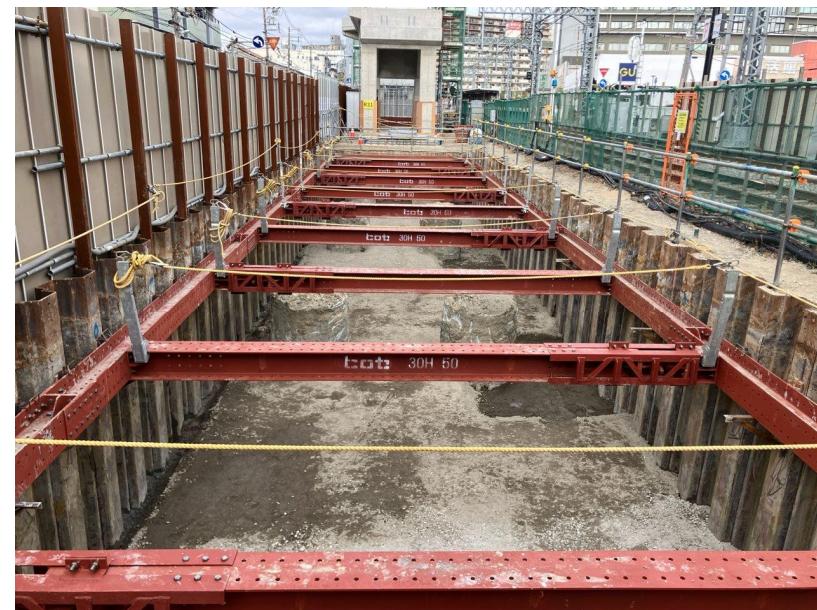

【2025.9～2025.11までの工事】

①上部工架設工



②上部工架設工



③仮桟橋工



【2025.9～2025.11までの工事】

①上部工架設工



②上部工架設工



③上部工架設工



【事業進捗報告】－これまでの工事の様子 5工区－

(2025.12)

【2025.9～2025.11までの工事】

①躯体構築工



②鋼矢板引抜工



③躯体構築工（掘削）



④鋼矢板打設工

