

祝 足羽川ダム 堤体打設 60万m³達成！！

～完成まで残り7万m³！～

R8.3.31

- 足羽川ダム本体建設工事は、令和4年11月19日に定礎式を挙行し、これまでコンクリート打設を進めてきました。
- 打設開始から約3年半で打設量が**60万m³**（一般の25mプール1200杯分）を達成しました！
- 堤体打設完了まで残りわずか7万m³！**令和9年度春**には打設完了予定です。お楽しみに！



R8.3.31撮影



R8.3.31撮影


○堤体コンクリート**60万m³**の打設は、最終的な堤体積約67万m³の約**90%**に相当します。台形の形のダムでは上部の方が細くなるため、高さ96mのうち**75m**まで到達して、ダム高としての進捗は約**78%**となります。

○RC工法（スランプ0の硬練りコンクリート）に加え、受注者が開発したプレミアムベルコン（袋状ベルトコンベア）を活用することで、高速施工を実現。令和7年度には、堤体積全体の**1/3以上**を打設しました。

○令和8年度以降は堤頂部付近となり施工ヤードが狭くなるため、型枠作業等とコンクリート打設を同時に進めることが難しくなるため、**コンクリート打設は夜間のみ**となる計画です。

○打設完了まで残りわずか！写真では味わえない、迫力あるスケール感を体感できる「ダム本体建設工事展望台」へ、ぜひお越しください！

<ダム断面図>

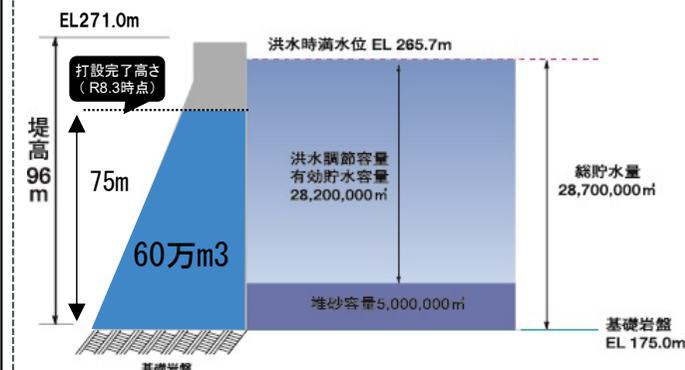

【問合せ先】

国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

〒918-8239 福井県福井市大手3丁目14-9

TEL 0776-27-0642

(代表)

