


熊野川流域における堆積土砂撤去の進捗状況

資料1-3

令和8年1月時点

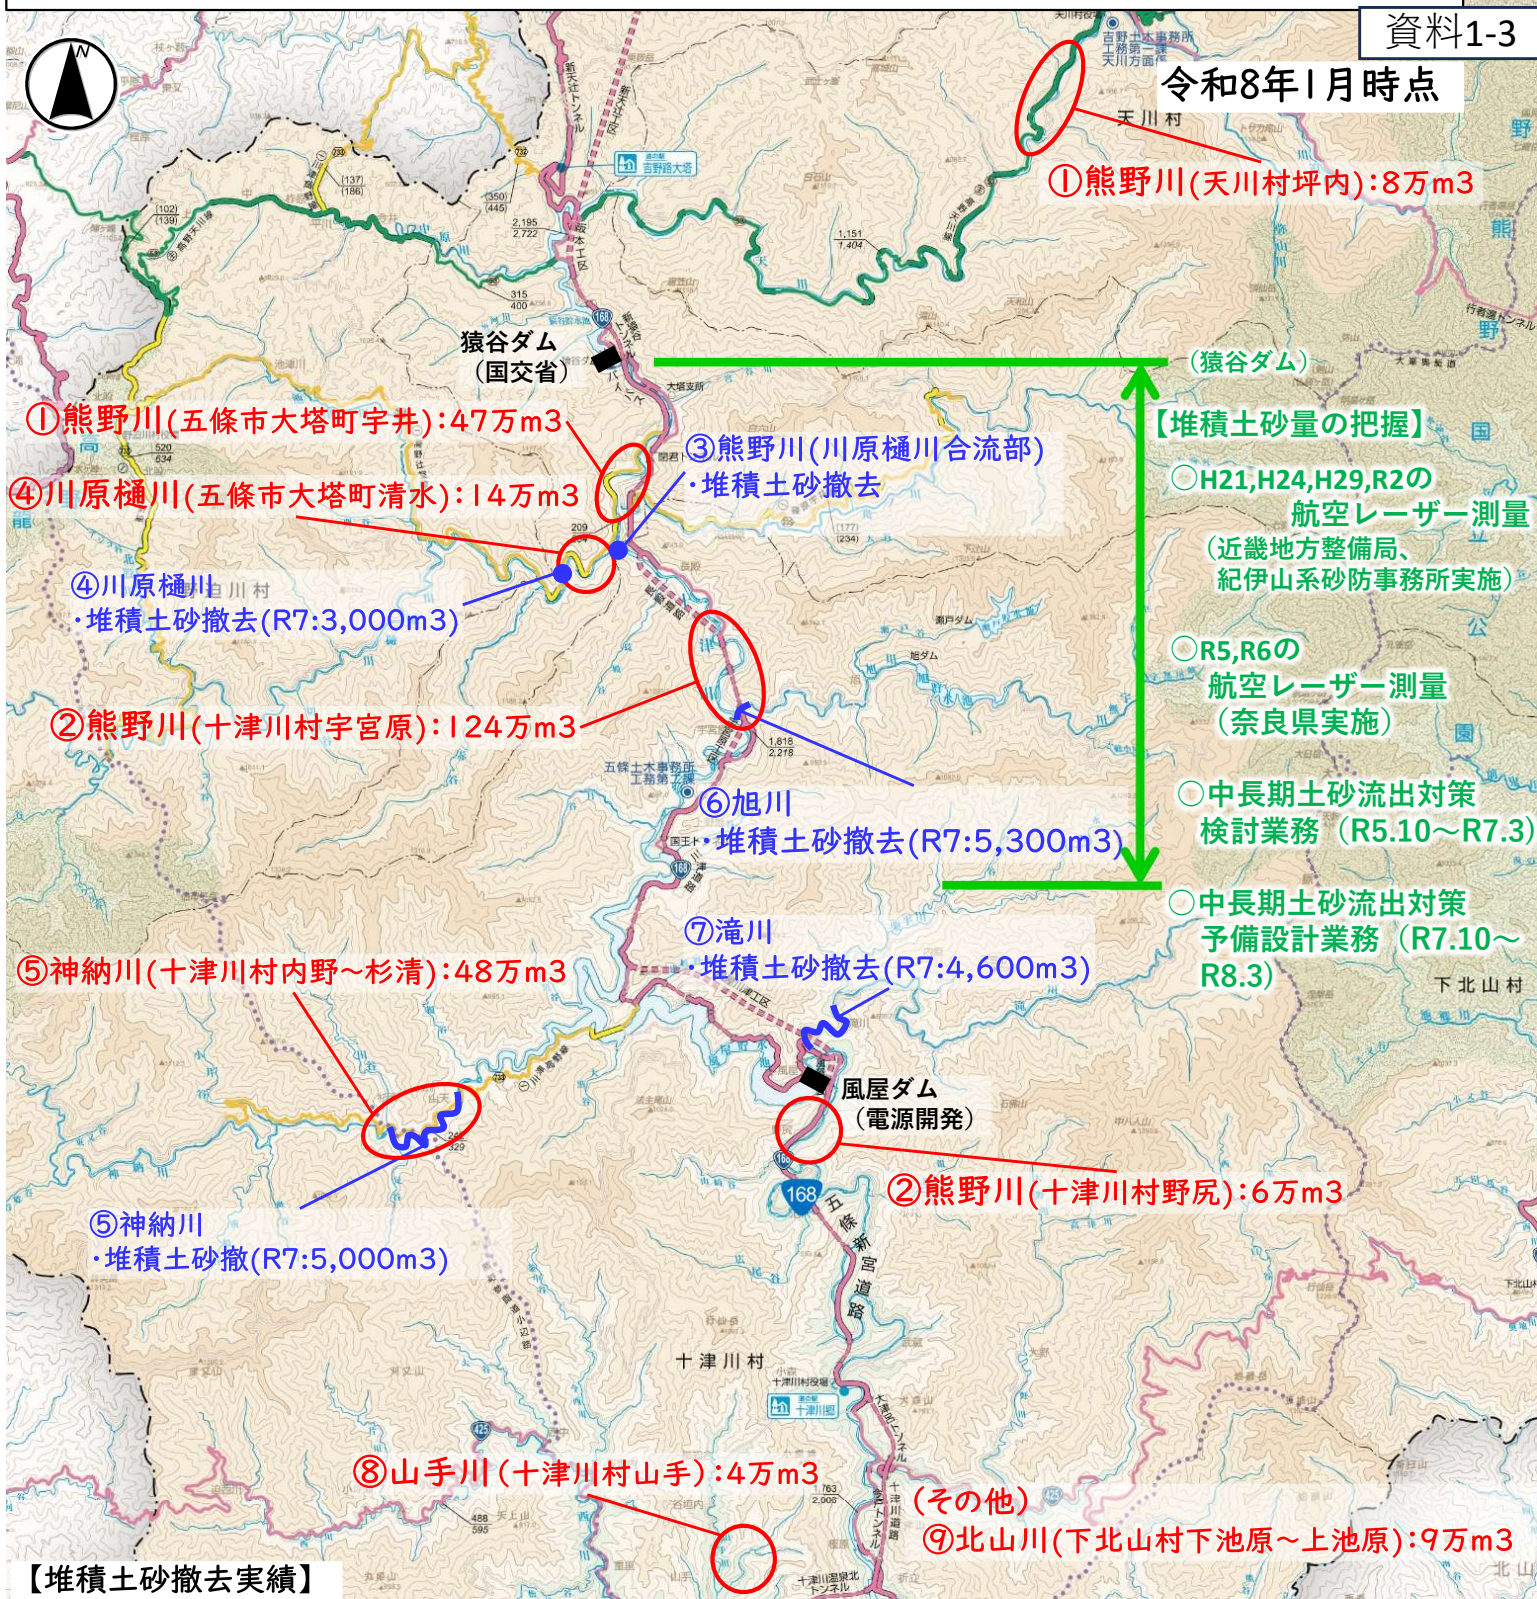

【堆積土砂撤去実績】

河川	箇所	災害復旧対応	災害以外
		H23~H28	H29~R7(予定)
熊野川	① 天川村 五條市	550,000	
	② 十津川村	1,300,000	
	③ 川原樋川合流部		26,800
川原樋川	④ 五條市	140,000	31,000
神納川	⑤ 十津川村	480,000	113,700
旭川	⑥ 十津川村		45,800
滝川	⑦ 十津川村		27,100
山手川	⑧ 十津川村	40,000	
北山川	⑨ 下北山村	90,000	
合計		2,600,000	244,400
