


河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

令和8年2月現在

資料1-4

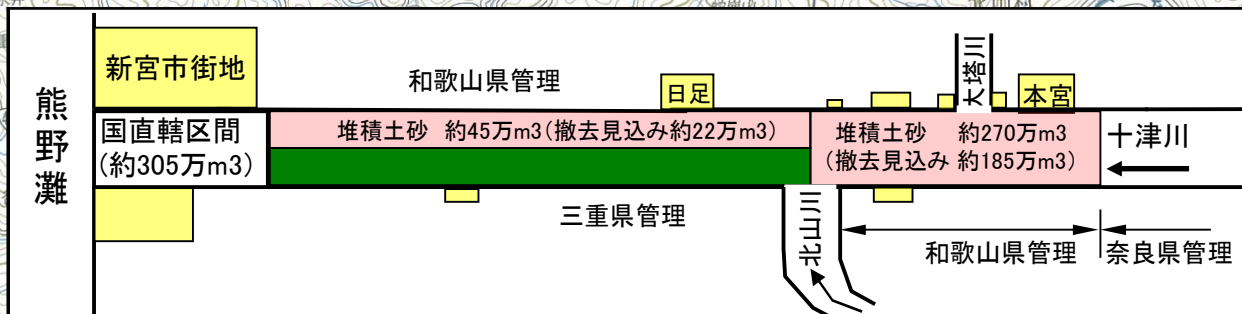

注1: 堆積土砂量は、水面上0.5m以上の堆積土砂量であり、台風12号で堆積した土砂量とは異なる。
注2: 撤去見込み量には、撤去済み量を含む



その他浸没状況 (撤去見込み以外)

河川名	H23～R7掘削量
高田川	約 1万m³
音無川	約 0.03万m³
赤木川	約 4万m³
九重谷川	約 0.25万m³
玉置川	約 0.6万m³
篠尾川	約 0.2万m³
大塔川	約 14万m³
計	約 20万m³

土砂撤去状況

NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	R6まで	R7掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮	交付金	県	約 43万m³	約1万m³	約 44万m³	
②	熊野川	田辺市 請川	20条工事	市	約 44万m³	—	約 44万m³	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万m³	—	約 2万m³	完了
⑦	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m³	—	約 7万m³	完了
⑧	熊野川	新宮市 大居	推進費	県	約 20万m³	—	約 20万m³	完了
⑨	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 29万m³	約5万m³	約 34万m³	H25～
⑩	熊野川	新宮市 相賀ほか	一般採取	民間	約 8万m³	—	約 8万m³	H25～
⑪	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m³	—	約 7万m³	完了
⑫	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	約 14万m³	—	約 14万m³	完了
⑬	熊野川	田辺市 本宮	20条工事	市	約 5万m³	—	約 5万m³	H29～
⑭	熊野川	新宮市 田長	交付金	県	約 5万m³	—	約 5万m³	完了
熊野川合計					約184万m³	約6万m³	約190万m³	
④	音無川	田辺市 一本松	国災	県	約 1万m³	—	約 1万m³	完了
⑤	大塔川	田辺市 川湯	県災	県	約 6万m³	—	約 6万m³	完了
⑥	篠尾川	新宮市 西敷屋	県災	県	約 1万m³	—	約 1万m³	完了
支川合計					約 8万m³	—	約 8万m³	
全体					約192万m³	約6万m³	約198万m³	
