


# 実施計画に係る事業進捗状況

令和5年1月31日

長浜市北部振興局

# 実施内容について（長浜市）

- ②-4 市道丹生小谷線他（舗装修繕）<sup>【継続中】</sup>
- ②-5 市道西村線他（消雪施設整備）<sup>【実施中】</sup><sup>【実施予定】</sup>
- ⑥-2 生活関連施設等の整備（排雪場所整備工事他）<sup>【継続中】</sup>

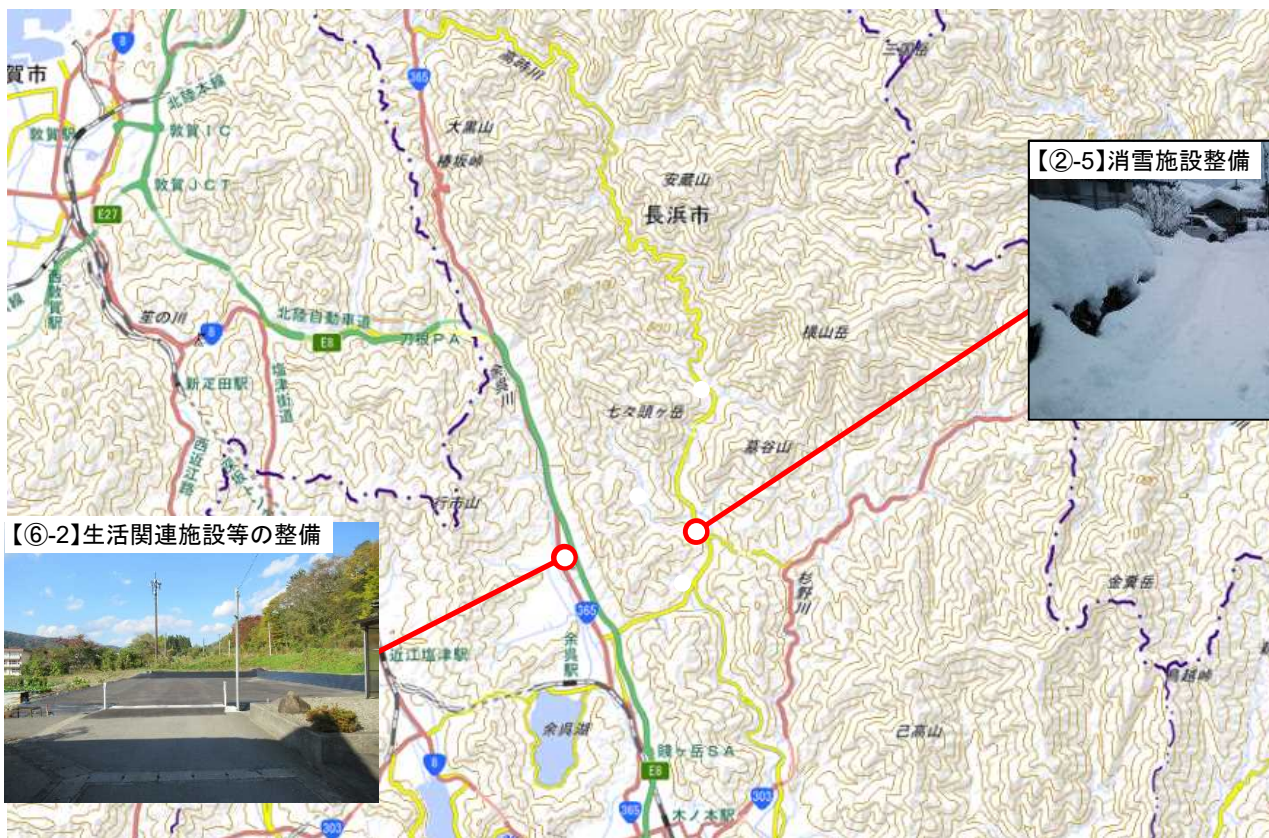

## ②-4 市道丹生小谷線他

【継続中】

・上丹生地区の舗装修繕工事を実施


市道丹生小谷線舗装修繕工事 ※R4年度未実施

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工



①施工済み

標準断面図



②施工前 (R3年度整備箇所)



②施工完了 (R3年度整備箇所)

## ②-5 市道西村線他

【実施中】  
【実施予定】

・消雪施設等整備に関する設計検討を実施中、消雪用水取水施設整備を実施

消雪施設等設計検討 工期：R3. 6. 17 ~ R4. 10. 31

設計数量 L=2,194m

設計内容 詳細設計

消雪用水取水施設整備工事(R5年度実施予定)

取水施設(集水埋渠、取水ポンプ)整備を実施予定

その他、水利権許可手続き及び用地取得業務を実施予定



消雪施設整備

## ⑥-2 生活関連施設等の整備

【継続中】

・排雪場所等の整備及び除雪機械購入の支援を実施

### 排雪場所整備等

東野北畑団地内において排雪場所の整備を実施  
除雪機械(ミニホイールローダ(除雪仕様 1台))の購入の支援  
※消雪整備代替え:東野北畑地域支援限定事業として実施



排雪場所整備

施工前



施工完了

# ◆ 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取り組みの支援

