



# 河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

平成29年5月現在

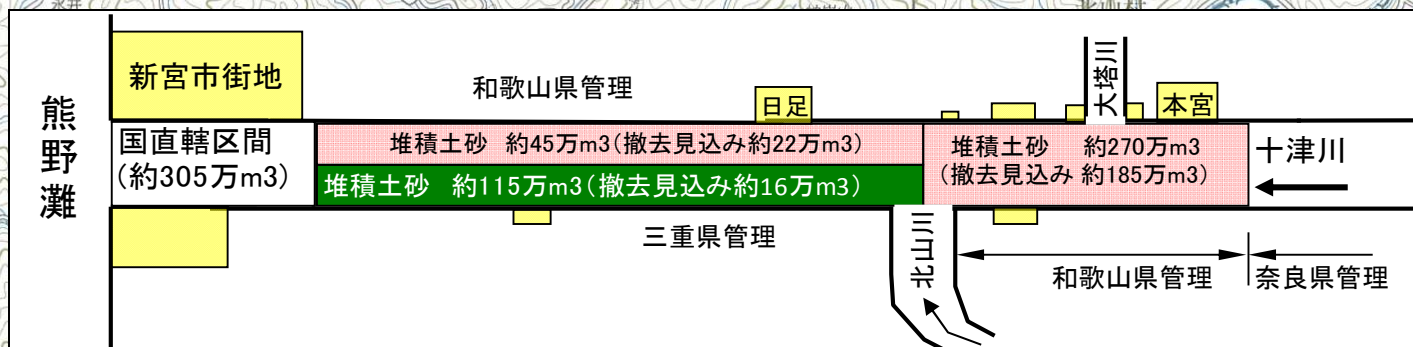

注1: 堆積土砂量は、水面上0.5m以上の堆積土砂量であり、台風12号で堆積した土砂量とは異なる。  
 注2: 撤去見込み量には、撤去済み量を含む  
 注3: 撤去見込み量には、近く策定予定の熊野川圏域河川整備計画に基づく河道掘削及び新たに撤去の見通しが立った河道掘削の予定量を含む

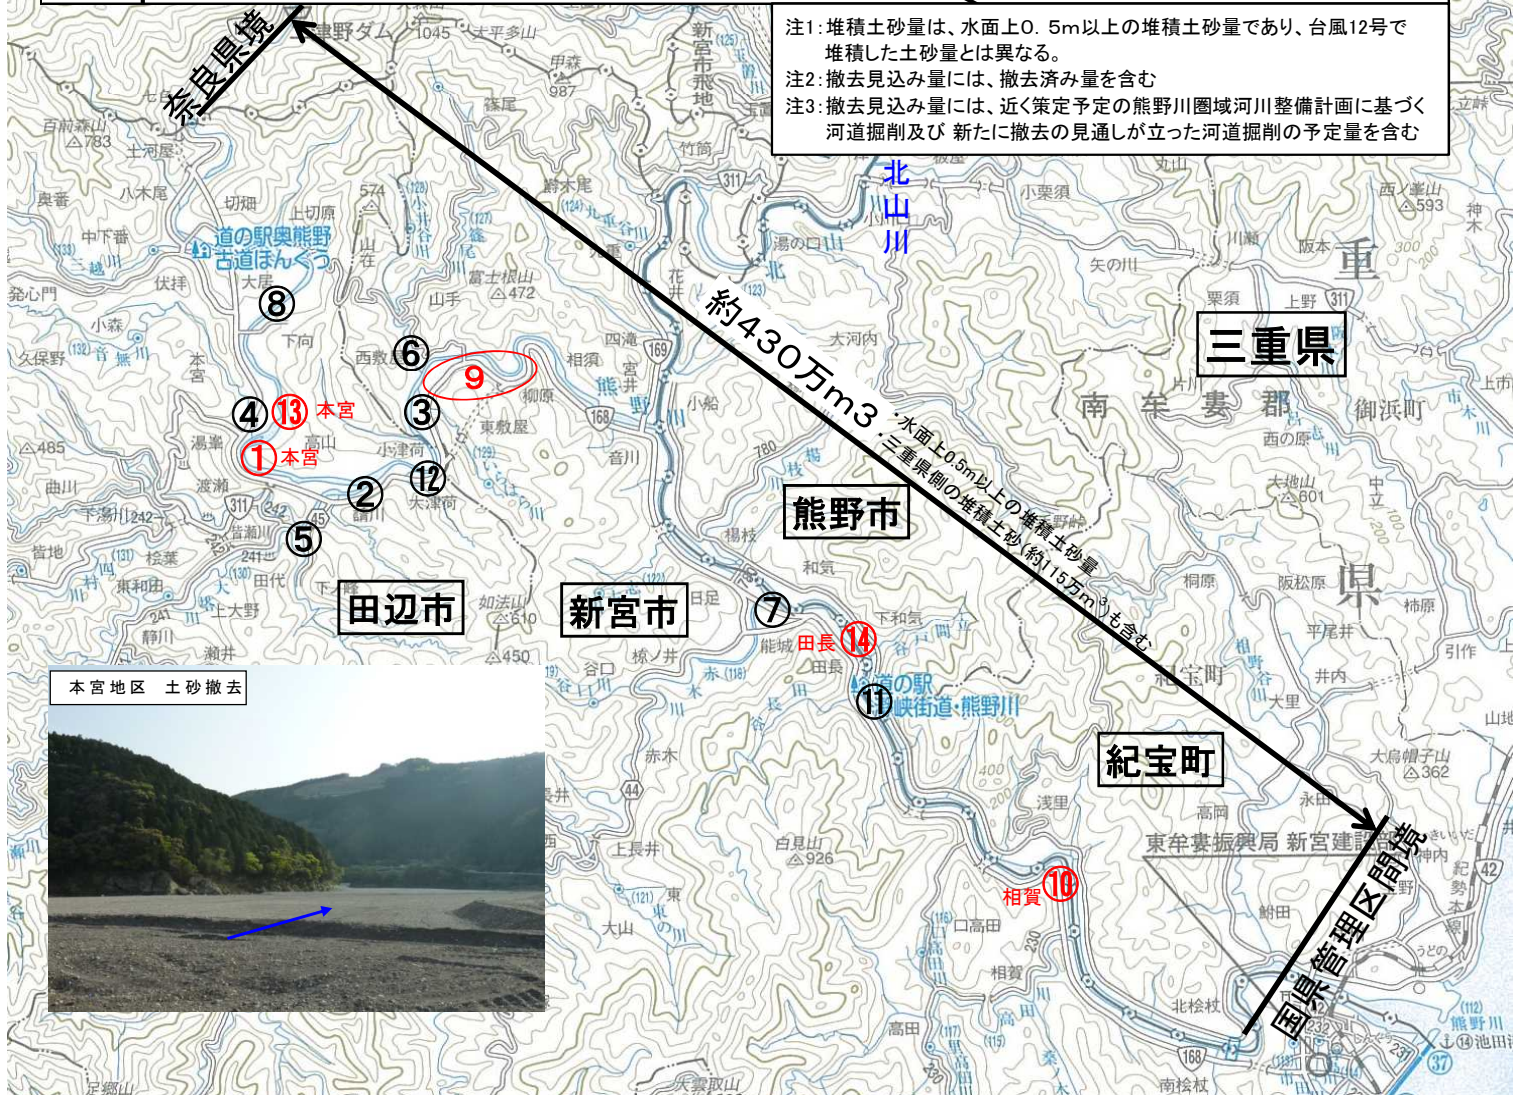

土砂撤去状況								
NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	H28まで	H29掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮	水防災	県	約 27万m <sup>3</sup>	約 6万m <sup>3</sup>	約 40万m <sup>3</sup>	~H30
②	熊野川	田辺市 請川	20条工事	市	約 44万m <sup>3</sup>	—	約 44万m <sup>3</sup>	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万m <sup>3</sup>	—	約 2万m <sup>3</sup>	完了
④	音無川	田辺市 一本松	国災	県	約 1万m <sup>3</sup>	—	約 1万m <sup>3</sup>	完了
⑤	大塔川	田辺市 川湯	県災	県	約 6万m <sup>3</sup>	—	約 6万m <sup>3</sup>	完了
⑥	篠尾川	新宮市 西敷屋	県災	県	約 1万m <sup>3</sup>	—	約 1万m <sup>3</sup>	完了
⑦	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m <sup>3</sup>	—	約 7万m <sup>3</sup>	完了
⑧	熊野川	田辺市 大居	推進費	県	約 20万m <sup>3</sup>	—	約 20万m <sup>3</sup>	完了
⑨	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 13万m <sup>3</sup>	精査中	約 40万m <sup>3</sup>	H25~
⑩	熊野川	新宮市 相賀	一般採取	民間	約 2万m <sup>3</sup>	約 0.6万m <sup>3</sup>	約 3万m <sup>3</sup>	H25~
⑪	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m <sup>3</sup>	—	約 7万m <sup>3</sup>	完了
⑫	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	約 14万m <sup>3</sup>	—	約 14万m <sup>3</sup>	完了
⑬	熊野川	田辺市 本宮	20条工事	市	—	精査中	約 17万m <sup>3</sup>	H29~ ※
⑭	熊野川	新宮市 田長	水防災	県	—	約 1万m <sup>3</sup>	約 5万m <sup>3</sup>	H29~H33 ※
和歌山県合計					約 144万m <sup>3</sup>	約 8万m <sup>3</sup> (+α)	約 207万m <sup>3</sup>	

※ 近く策定予定の熊野川圏域河川整備計画に基づく河道掘削及び新たに撤去の見通しが立った河道掘削
