


堆積土砂対応の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図

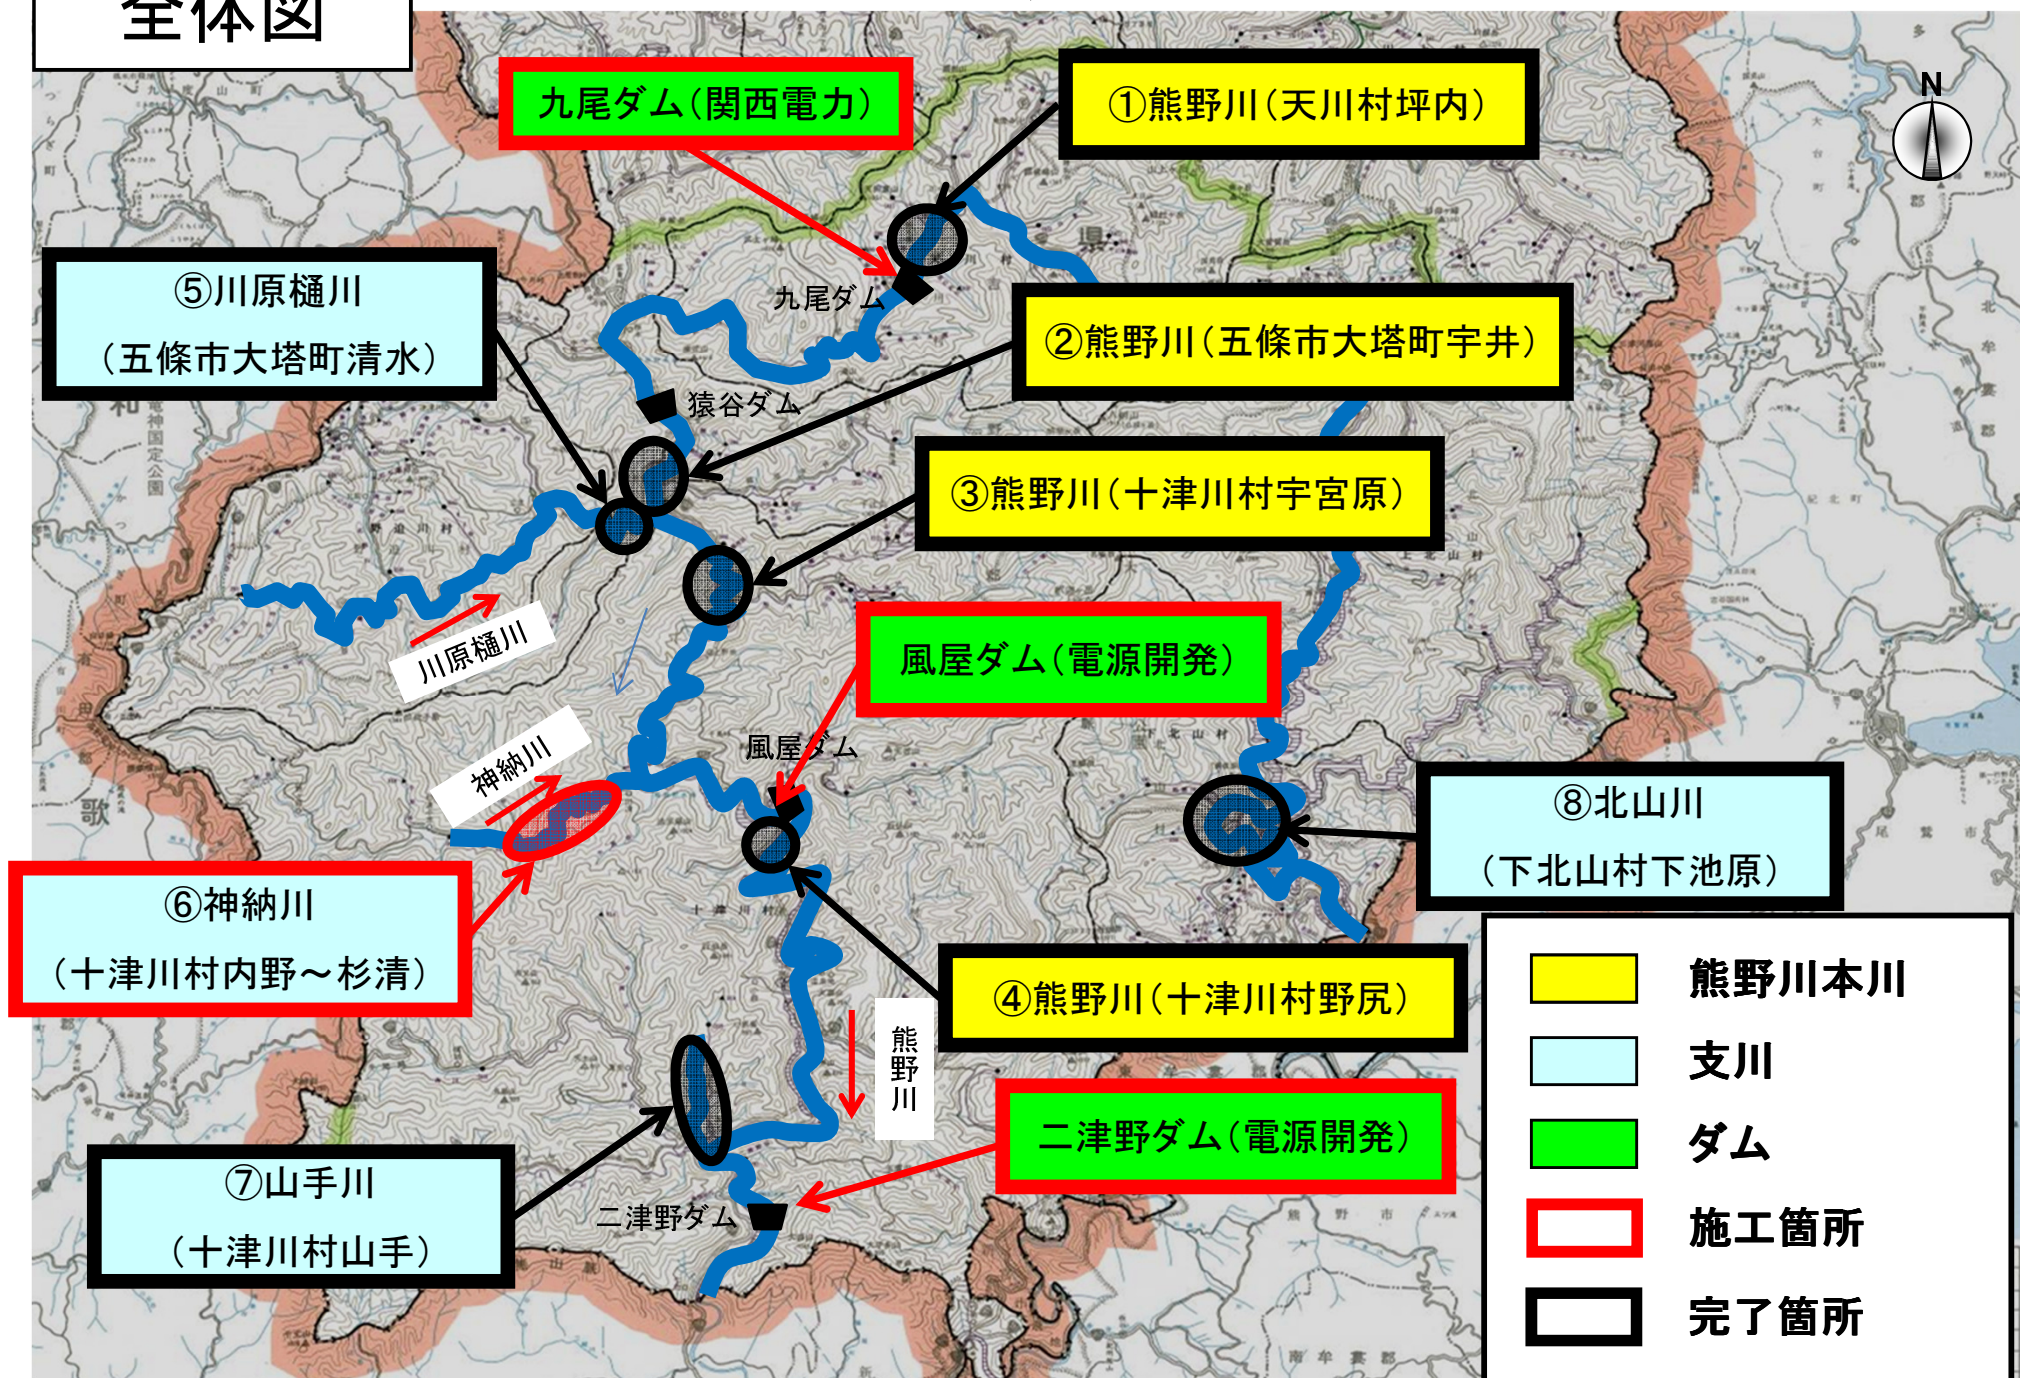

堆積土砂撤去 工程表(奈良県施行分)

河川名	箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27
熊野川	① 天川村 坪内 (つぼのうち)	H23	8万m ³	■ 完了				
	② 大塔町 宇井 (うい)	H23	47万m ³	■	■	■	完了	
	③ 十津川村 宇宮原 (うぐはら)	H23	112万m ³	■	■	■	完了	
		H25	台風18号分12万m ³				■	完了
	④ 十津川村 野尻 (のじり)	H23	6万m ³	■	■	完了		
川原樋川 (かわらびがわ)	⑤ 大塔町 清水	H23	14万m ³	■	■	■	完了	
神納川 (かんのがわ)	⑥ 十津川村 内野～杉清 (うちの) (すぎせ)	H23	21万m ³	■	■	■	完了	
		H25	台風18号分17万m ³				■	
		H26	台風11号分10万m ³				■	
山手川 (やまてがわ)	⑦ 十津川村 山手 (やまて)	H23	4万m ³	■ 完了				
北山川	⑧ 下北山村 下池原	H23	9万m ³	■ 完了				


平成27年度
完了予定

23年災害は今年度完了
26年災害は引き続き実施

全体 85% 100%

(H25台風18号分は除く)

⑥神納川(十津川村内野～杉清)

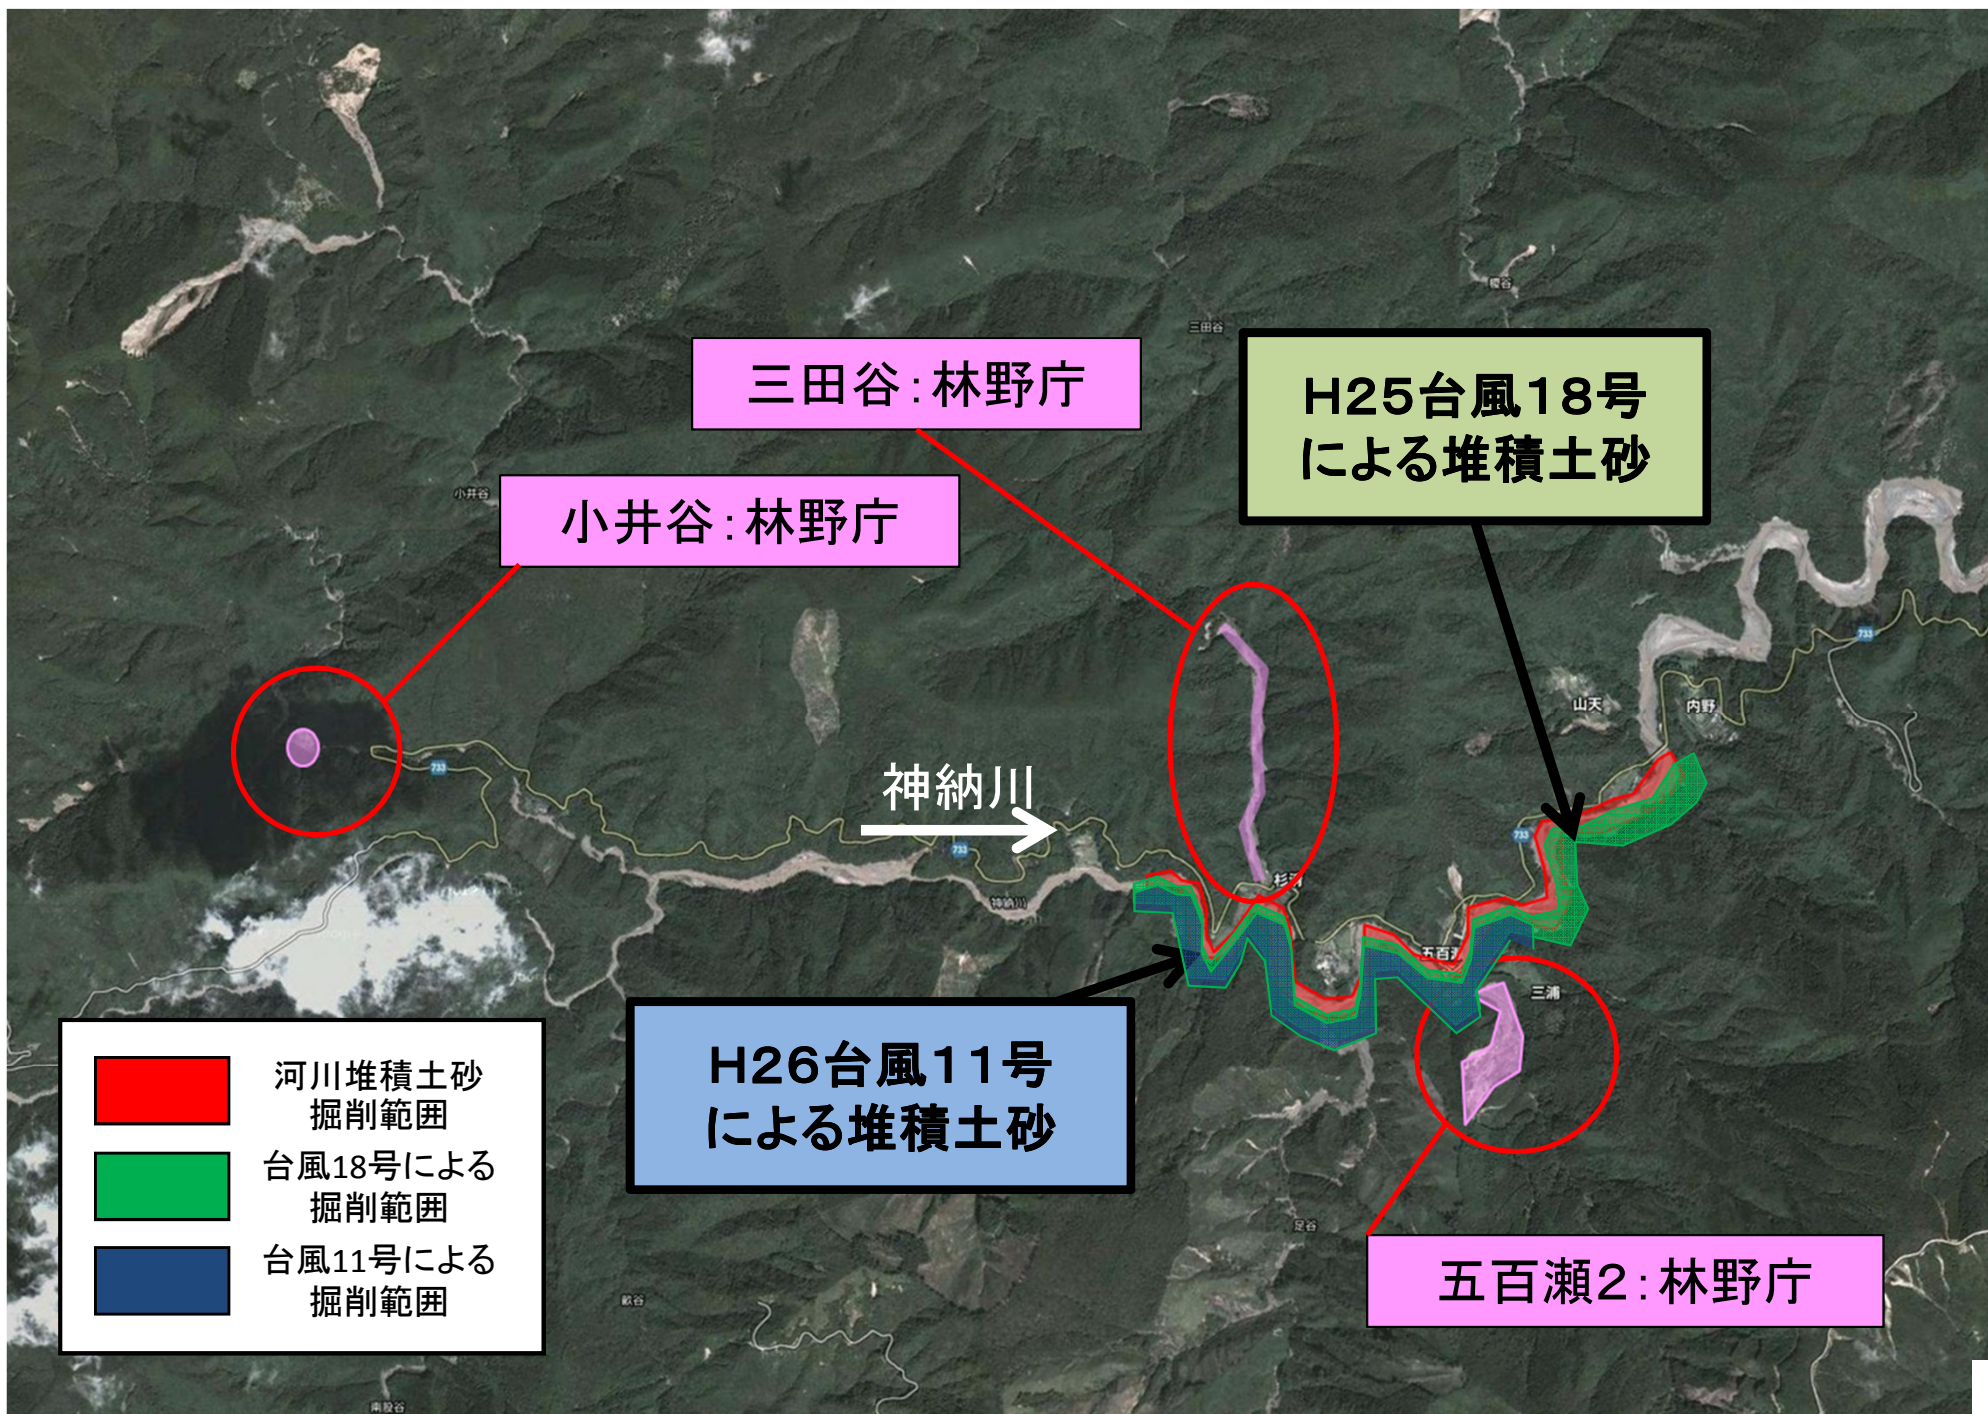

三田谷: 林野庁

小井谷: 林野庁

H25台風18号
による堆積土砂

H26台風11号
による堆積土砂

五百瀬2: 林野庁

- 河川堆積土砂
掘削範囲
- 台風18号による
掘削範囲
- 台風11号による
掘削範囲
