

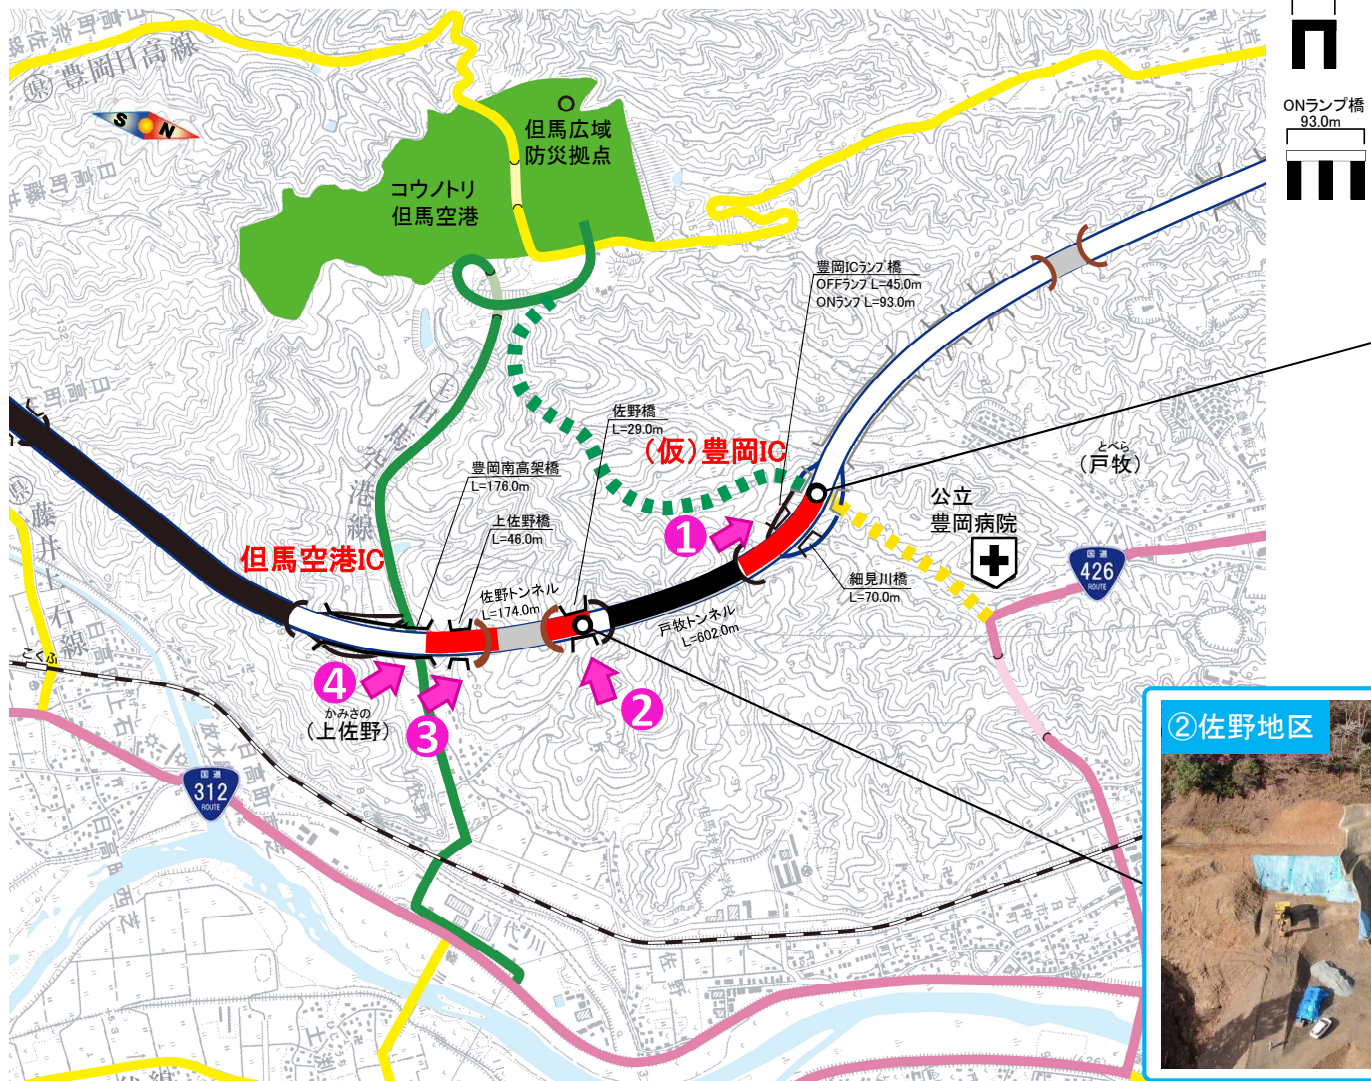


# 北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況(令和5年1月下旬時点)

とよ おか  
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定

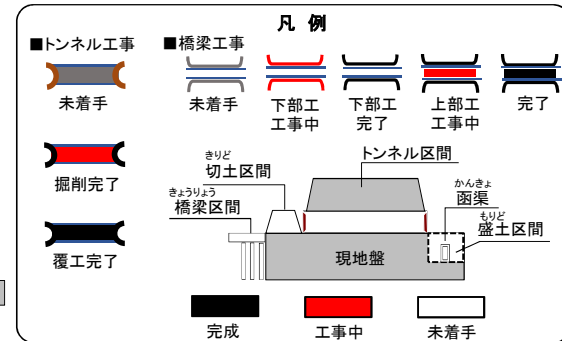

## ①戸牧地区

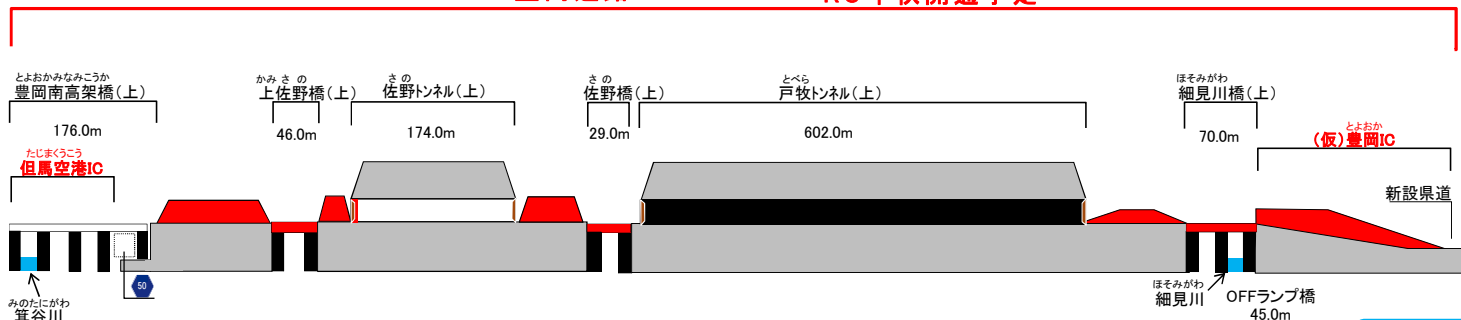

細見川橋(A)の上部工の施工を行っております。現在は、支保工、型枠解体を行っており、今後は車の落下を防止するための壁高欄の施工を進めてまいります。また、北側ではチェーン脱着場(B)の掘削や路体盛土(C)の施工を行っております。

## ②佐野地区






佐野橋の下部工事は令和4年11月に工事が完了しました。今後、上部工の施工を進めてまいります。

注) 図中の構造物名称等は仮称です

# 北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況(令和5年1月下旬時点)

とよ おか  
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定

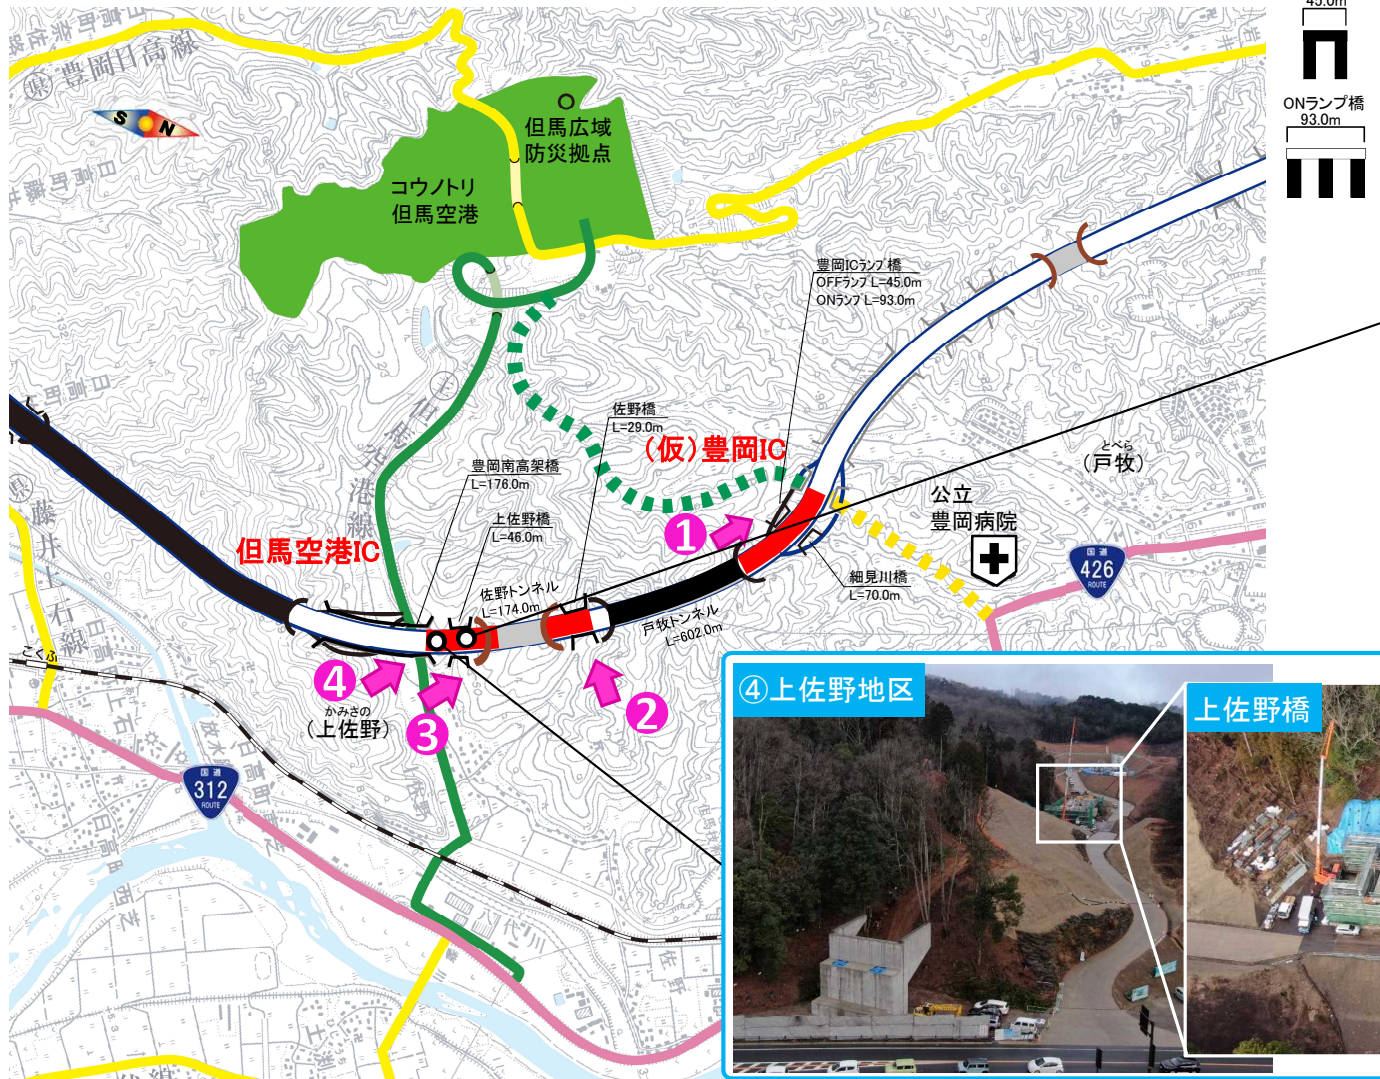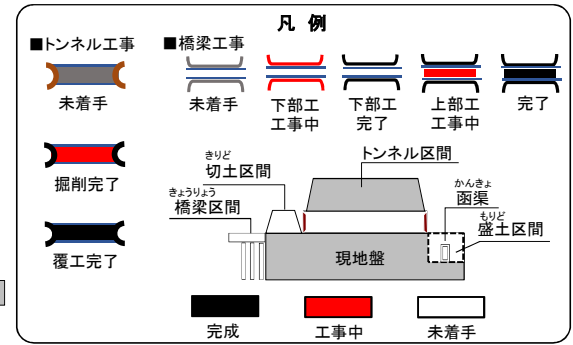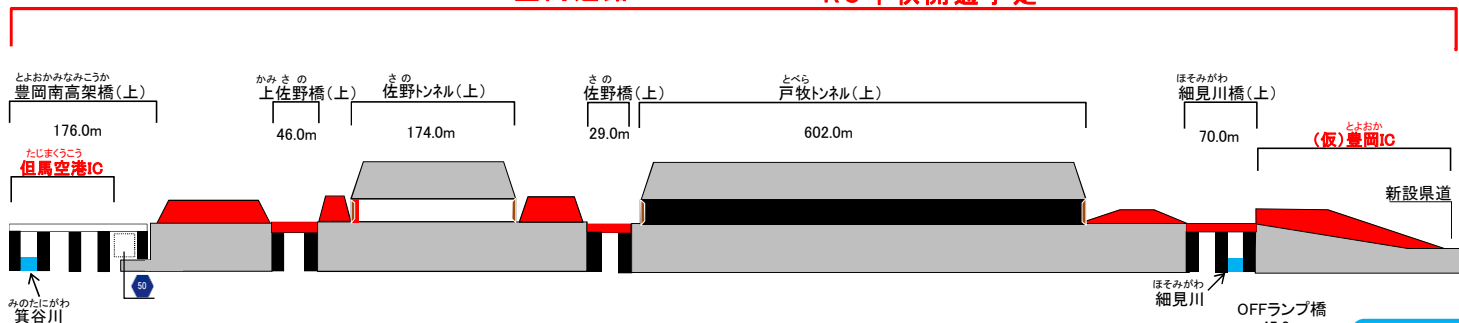

### ③上佐野地区

佐野トンネルの掘削を1月中旬から開始しました。上佐野から戸牧(南から北)に向かって掘削し、現在坑口から約5m付近まで掘削が進んでいます。今後も安全に配慮しながら工事を進めていきます。

### ④上佐野地区

上佐野橋

上佐野橋の下部工事は令和4年7月に完了し、令和4年8月から上部工事に着手しました。現在は、橋梁の橋台や車の落下を防止するための壁高欄の施工を順次行っており、現場では、コンクリートの打設を予定しています。

注) 図中の構造物名称等は仮称です
