



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます 

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事 【(株)城内組】



○防災ステーション建設のための基盤盛土を行う工事です。
令和7年12月18日盛土工事（約30,000m³）が完了しました。
地域の皆様方には、本工事に対してご協力いただきありがとうございました。

着手前



完了



大和川遊水地整備工事 【(株)城内組】



○令和7年11月末に土質改良工事（約5,000m³）は完了し、
(株)大和建设に引き継いでいます。
地域の皆様方には、本工事に対してご協力いただきありがとうございました。

工事概要



矢作建設工業株式会社
YAHAGI

- 1月より樋門本体の岡崎川隣接部分に着手します。
- 12月で地盤改良が完了しました。

主な作業内容

①土工(掘削)

- ・現在の堤防を掘削します。

②地盤改良工

- ・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。

③樋門・樋管本体工


- ・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

←1月の作業内容

④護岸・護床工

- ・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所

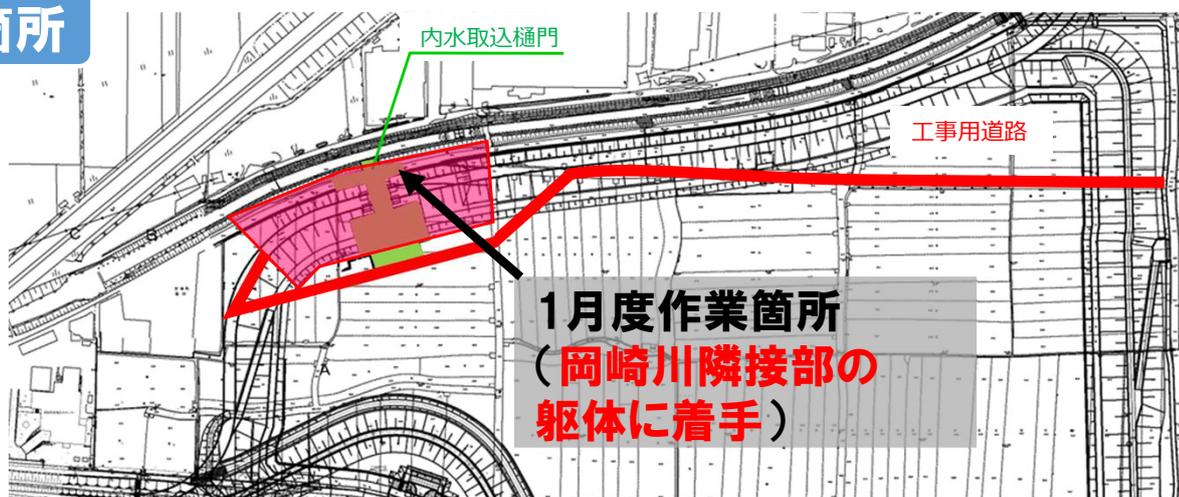

作業の様子



岡崎川近接部の構造物構築に着手しました。

工事に関するご連絡先

- 【発注者】
近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所
- 【受注者】
矢作建設工業株式会社
☎0743-84-8010 (昼間)



大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事【(株)大和建设】

今月の作業

○ 現在、低水護岸（ブロック積）を行っています。
樋門本体工は完了しました。引き続き、築堤盛土や法覆護岸工や土質改良工の施工を行っています。

工事の流れ

今月は、低水護岸（ブロック積）及び根固め工・築堤盛土を行います。

根固め工の施工と並行して仮締切工の撤去も行っていきます。

また、今月も土質改良工を行っています。

粉塵に注意して施工してまいります。

※1月上旬で足場も撤去しました。

現在施工箇所



樋門本体工の完成

○ 12月末で、樋門本体工が完成しました。

今年度は、大きな出水もなく順調に進みました。また、3次元データを使用した模型を活用することで、説明や打合せも円滑に行えました。


工事完了まで、無事故で終われるように引き続き安全に施工を行います。



窪田遊水地排水樋門ゲート設備他新設工事【西田鉄工(株)】

工事概要

- 水門設備の設置、機械室建屋地盤改良（追加）をおこないます。
- 工事期間は、令和8年1月中旬より令和8年5月31日迄の予定です。
- ※1月～3月末：①東側内水取込樋門ゲート②施設ゲート③機械室建屋地盤改良（1/26～2/初旬ごろ）
- 4月～5月末：排水樋門ゲート

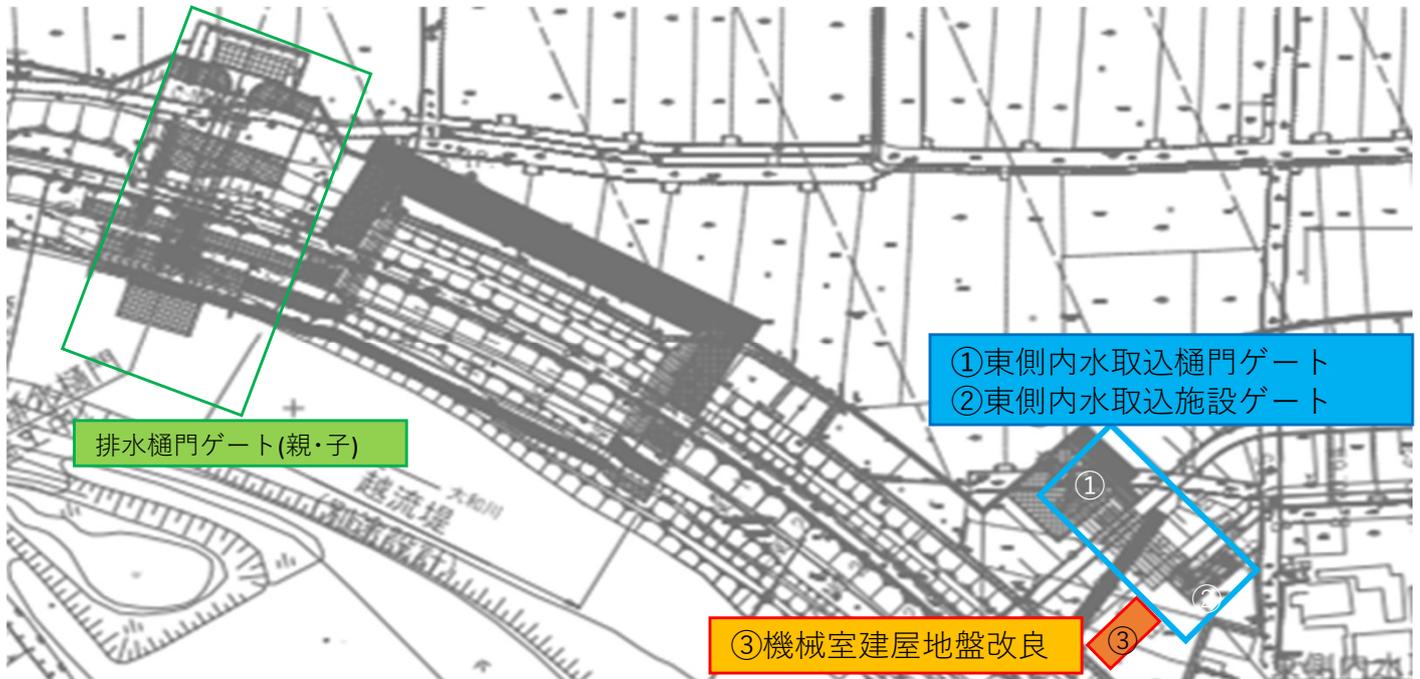

今月の主な作業内容

- ・1/26週の予定 クレーン設置、材料搬入・据付設置、地盤改良開始
- ・各水門にクレーン車を設置します。
- ・材料を熊本県の工場より輸送・搬入し、据付を開始します。
- ・機械室建屋の地盤改良を開始します。

窪田遊水地で使用する材料の多くは、熊本本社工場で製作しています。
今回は普段見ることが難しい本社工場の製作状況をご紹介します。

日本全国で据付けられる水門設備を南は熊本県本
社工場、北は北海道 苫小牧工場の2拠点で製作し
ています



設計図面通りに材料の加工をおこない製品に組
み上げます。
こちらは、内水取込樋門ゲート施設ゲートの扉
体です。
