

熊野川河道掘削の取り組み状況

R4.3月末時点


凡例

区間名

掘削予定量 (R4.3月末時点の掘削量)

【R4年度掘削予定量】

- : 流域界
- : 河川
- : 掘削範囲

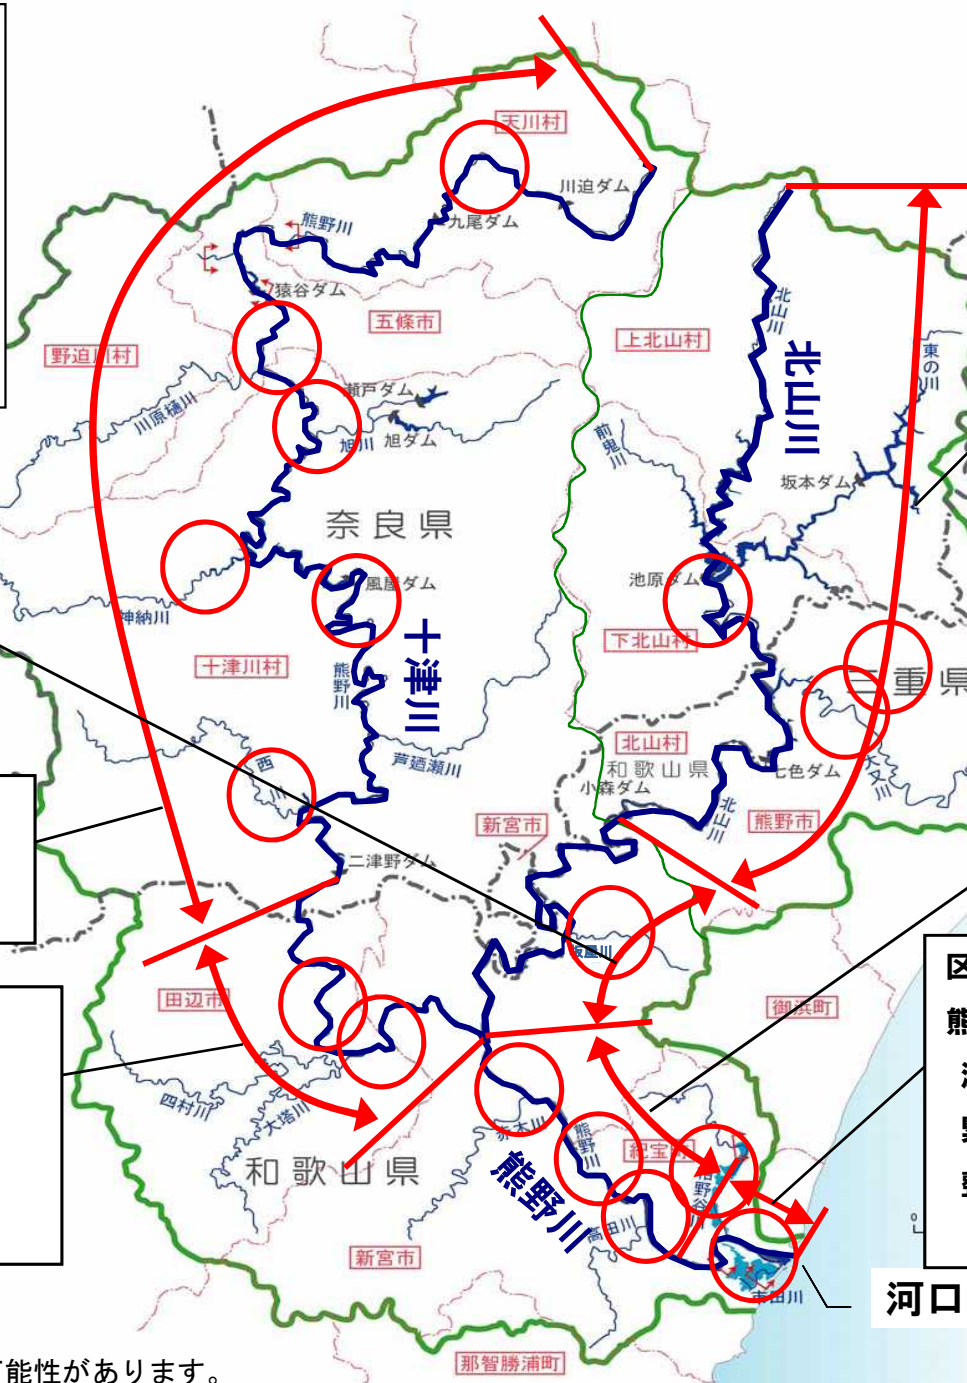

区間⑤【奈良県・三重県】

北山川

堆積土砂 9万m³ (9万m³ : 完了)

支川

堆積土砂 4万m³ (4万m³ : 完了)

整備計画 1.5万m³ (-)

【0.4万m³】

区間①【和歌山県・三重県】

熊野川

堆積土砂 23万m³ (22万m³)

【1.5万m³】

整備計画 13万m³ (13万m³ : 完了)

支川

堆積土砂 11万m³ (11万m³)

【0.3万m³】

区間④【国交省】

熊野川

激特対策 215万m³ (215万m³ : 完了)

緊特対策 90万m³ (90万m³ : 完了)

整備計画 570万m³ (-)

【7.1万m³】

河口

(ダム管理区間は除く)

※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。
