


堆積土砂対策の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川整備課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図

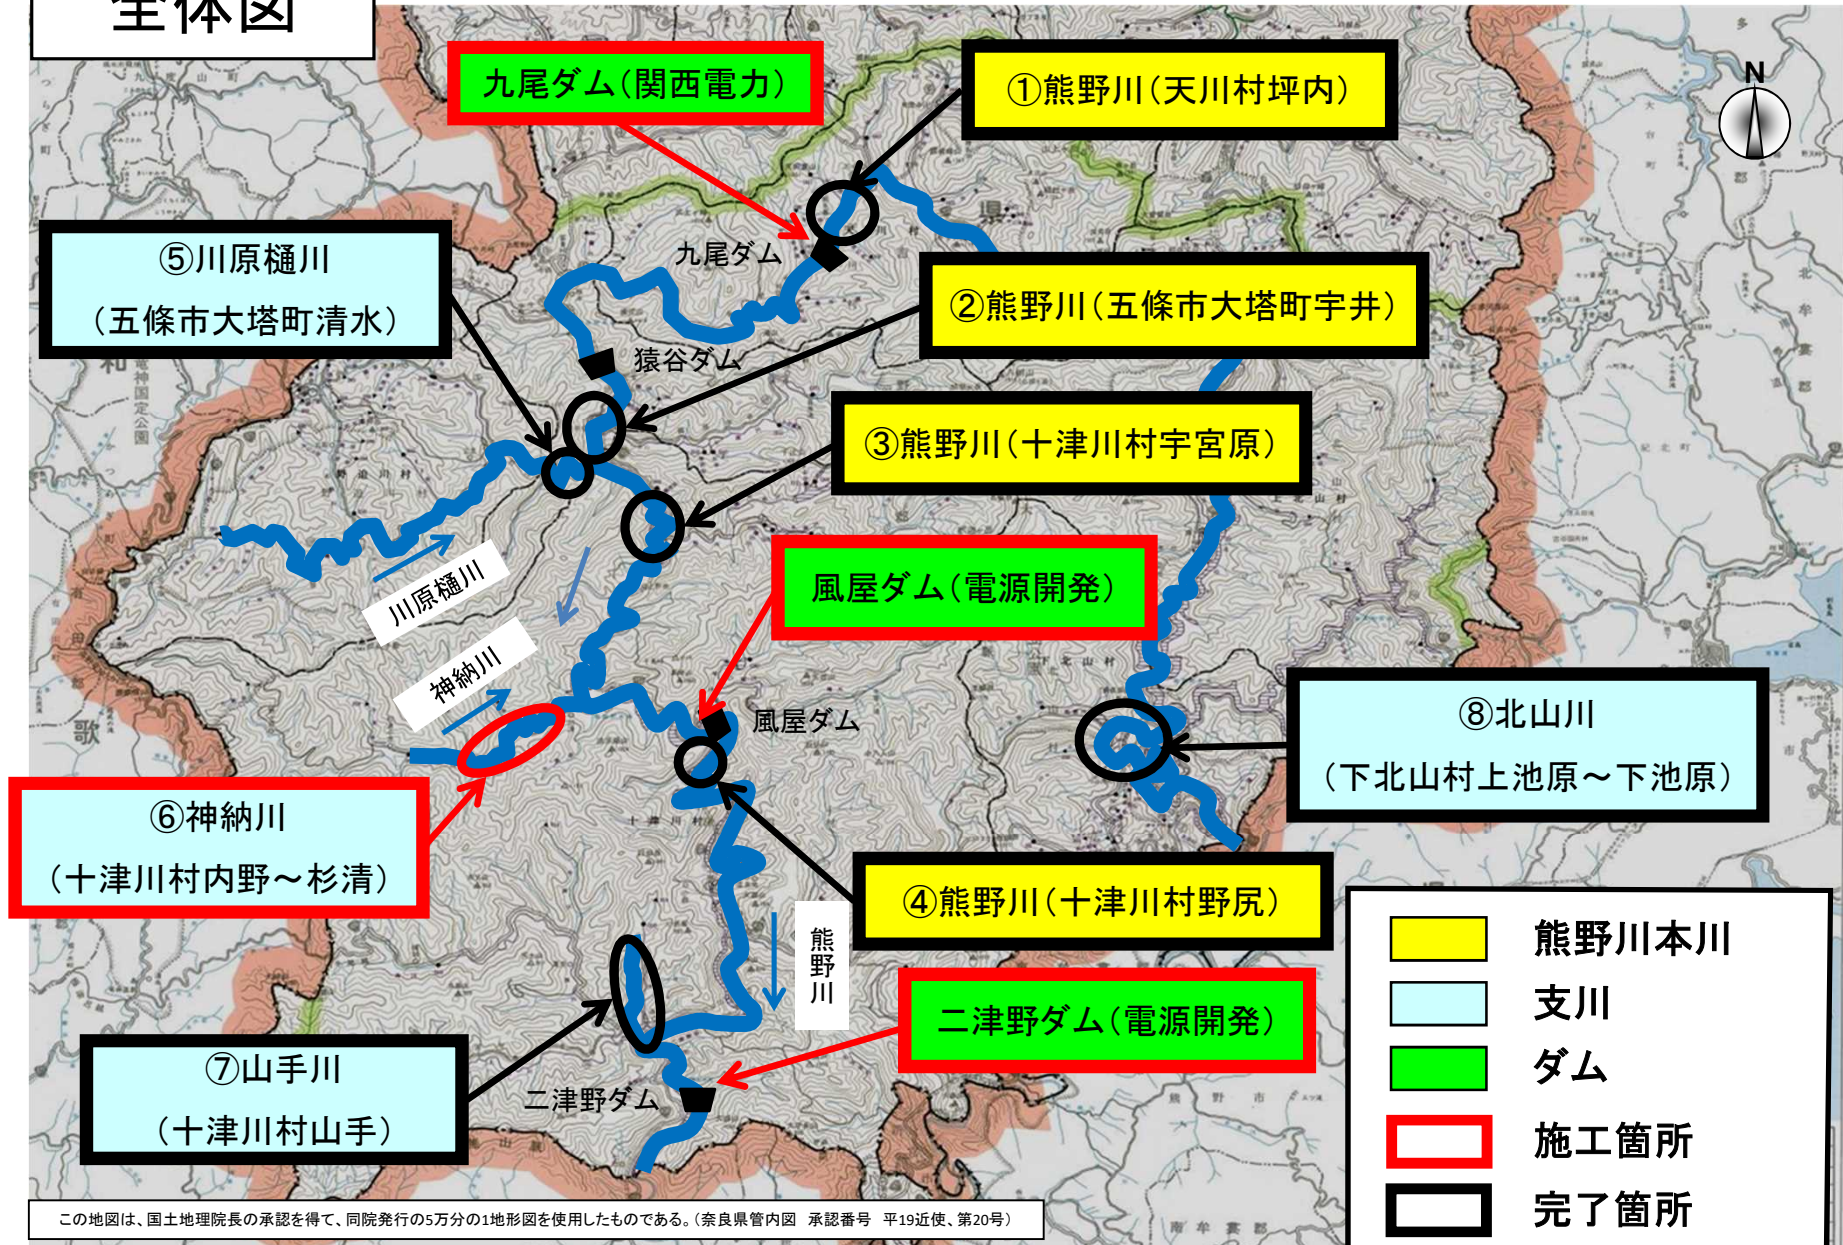

堆積土砂撤去(災害復旧事業分) 工程表(奈良県施行分)

参考

| 河川名 | 箇所 | 撤去土砂量 | | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 熊野川 (くまのがわ) | ① 天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small> | H23 | 8万m ³ | ■ | 完了 | | | | |
| | ② 大塔町 宇井 <small>(うい)</small> | H23 | 47万m ³ | ■ | | | 完了 | | |
| | ③ 十津川村 宇宮原 <small>(うぐはら)</small> | H23 | 112万m ³ | | ■ | | 完了 | | |
| | | H25 | 台風18号分12万m ³ | | | | ■ | 完了 | |
| ④ 十津川村 野尻 <small>(のじり)</small> | H23 | 6万m ³ | | ■ | 完了 | | | | |
| 川原樋川 (かわらびがわ) | ⑤ 大塔町 清水 <small>(しみず)</small> | H23 | 14万m ³ | | ■ | | 完了 | | |
| 神納川 (かんのがわ) | ⑥ 十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small> | H23 | 21万m ³ | | | ■ | 完了 | | |
| | | H25 | 台風18号分17万m ³ | | | | ■ | | |
| | | H26 | 台風11号分10万m ³ | | | | | ■ | 完了 |
| 山手川 (やまてがわ) | ⑦ 十津川村 山手 <small>(やまて)</small> | H23 | 4万m ³ | ■ | 完了 | | | | 完了 |
| 北山川 (きたやまがわ) | ⑧ 下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small> | H23 | 9万m ³ | ■ | 完了 | | | | |

- ・23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了
- ・上記災害復旧事業完了後(28年度～R3年度)、川原樋川1.8万m³、神納川8.1万m³、旭川1.1万m³、滝川2.2万m³の堆積土砂撤去を実施。
- ・国、県、関係自治体、関係機関と連携して、更なる堆積土砂対策を推進していく。

2. 新宮川水系堆積土砂処分推進事業

- 神納川(十津川村内野～杉清)

流域対策図

