


熊野川流域の治水対策対応状況【三重県】



瀬原地区 土砂撤去箇所

令和3年度までの対応
 本川堆積土砂の撤去
 (推進費) 和気地区 10,000 m³
 (交付金) 和気地区 76,000 m³、瀬原地区 9,900 m³
 (砂利採取) 浅里地区 57,000 m³
 支川堆積土砂の撤去
 約 160,000 m³
 令和4年度の対応
熊野川支川大又川 2,500 m³堆積土砂撤去 (予定)
熊野川支川北山川 13,100 m³堆積土砂撤去 (予定)

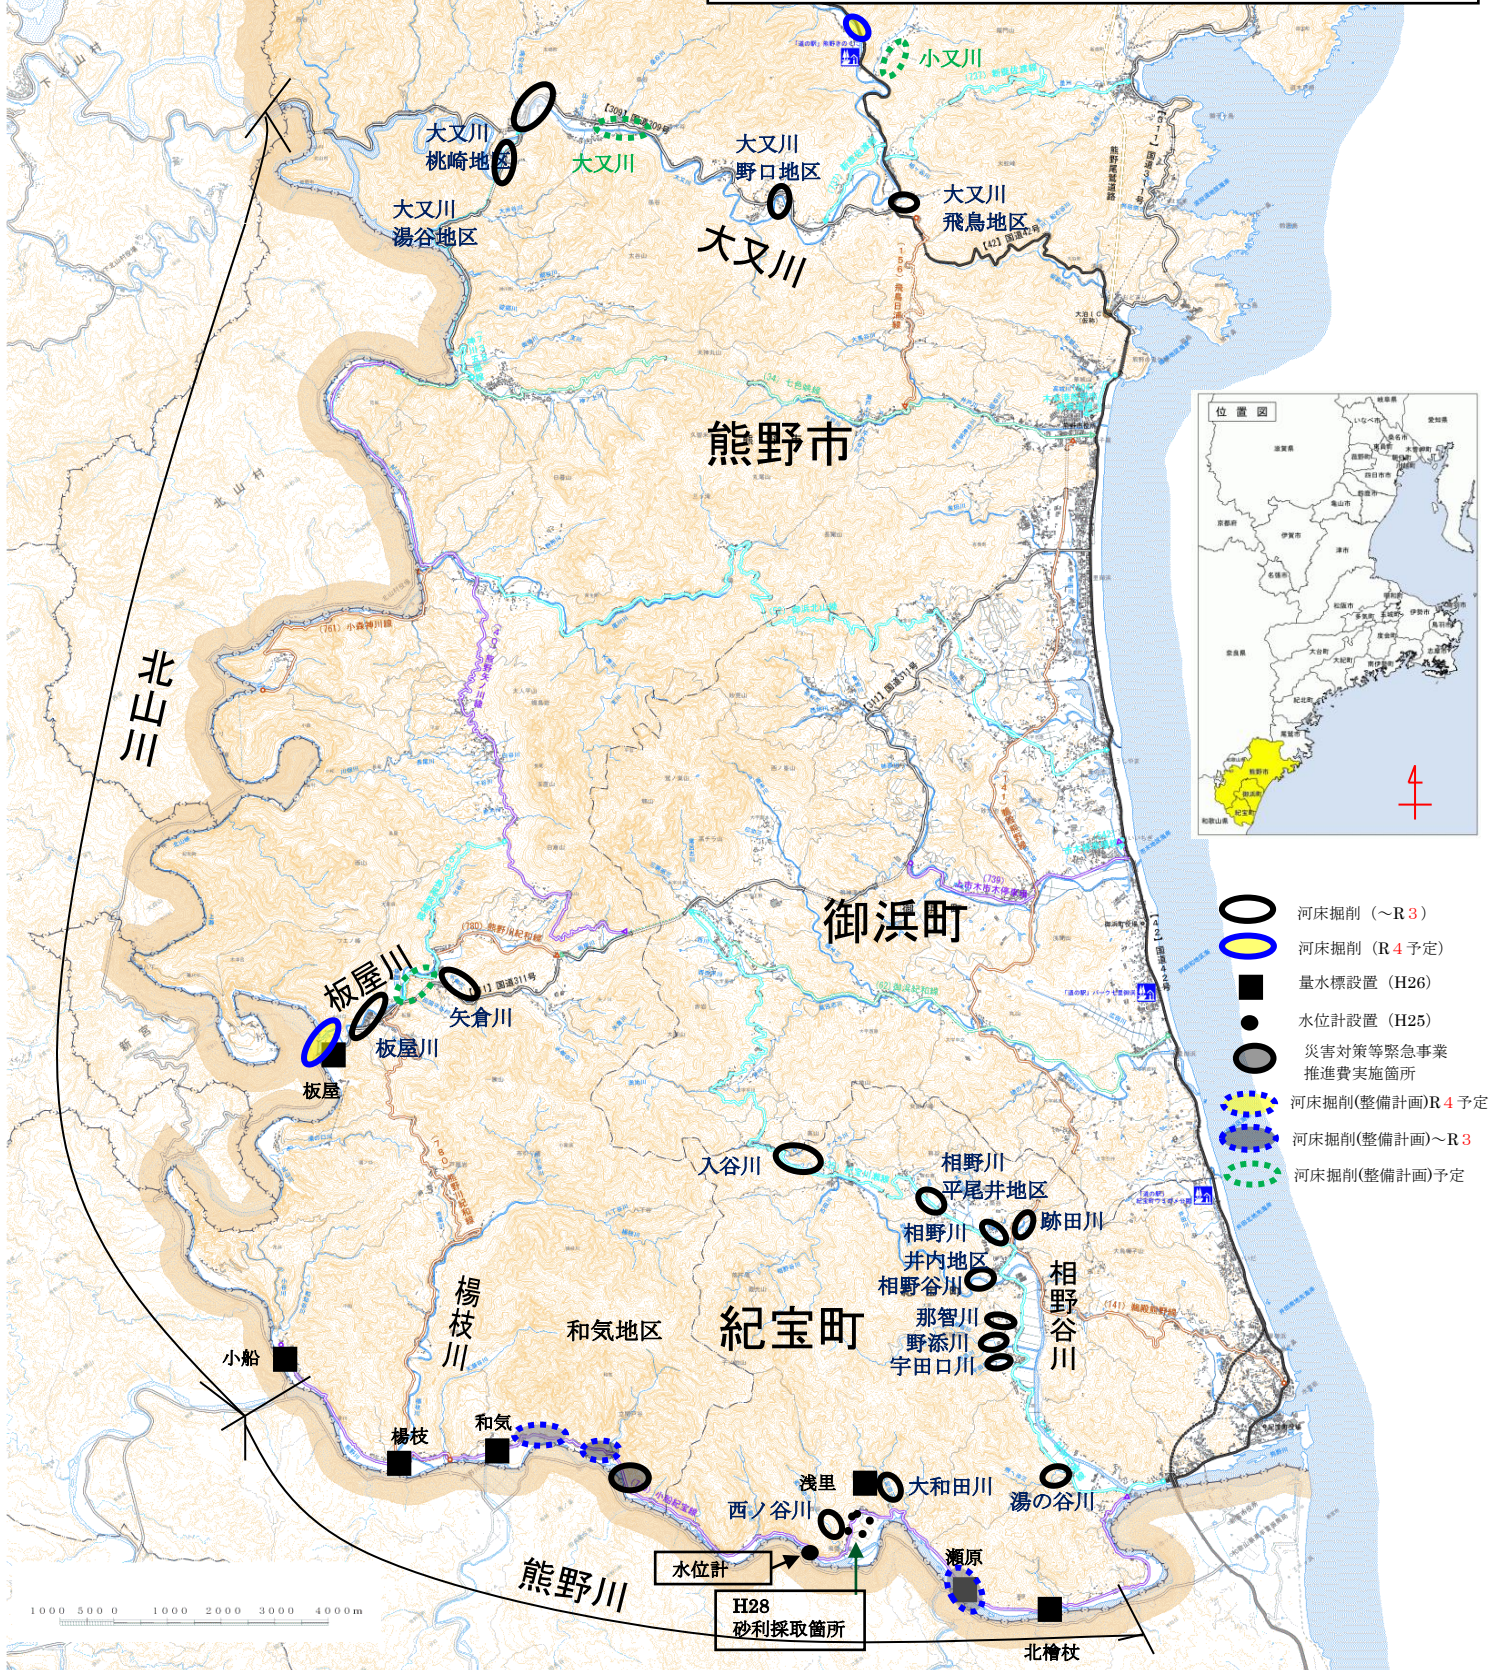

- 河床掘削 (~R3)
- 河床掘削 (R4 予定)
- 量水標設置 (H26)
- 水位計設置 (H25)
- 災害対策等緊急事業推進費実施箇所
- 河床掘削(整備計画)R4 予定
- 河床掘削(整備計画)~R3
- 河床掘削(整備計画)予定
