



河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

令和3年10月現在

資料2-4

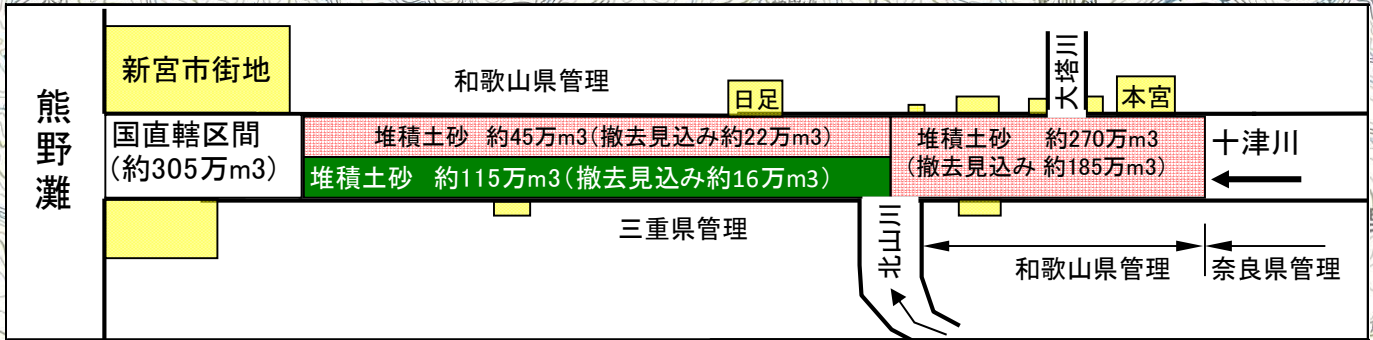

注1: 堆積土砂量は、水面上0.5m以上の堆積土砂量であり、台風12号で堆積した土砂量とは異なる。
注2: 撤去見込み量には、撤去済み量を含む

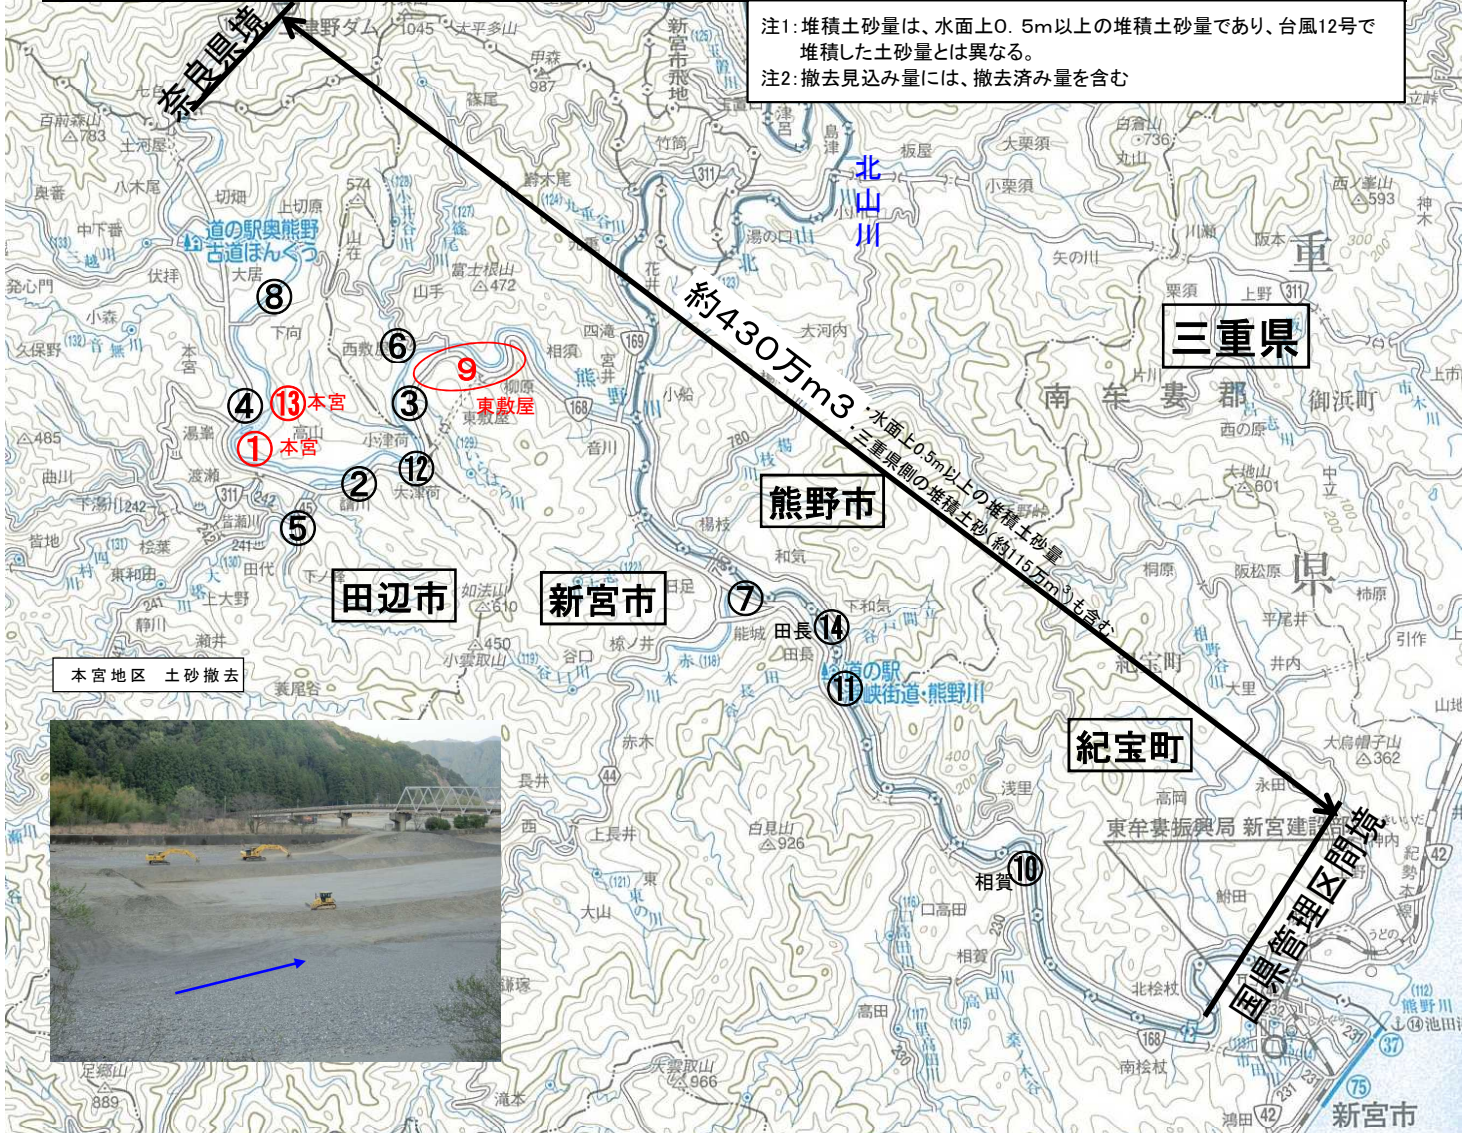

土砂撤去状況								
NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	R2まで	R3掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮	交付金	県	約 39万㎡	約 1万㎡	約 40万㎡	～R3(H33)
②	熊野川	田辺市 請川	20条工事	市	約 44万㎡	—	約 44万㎡	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万㎡	—	約 2万㎡	完了
④	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万㎡	—	約 7万㎡	完了
⑤	熊野川	田辺市 大居	推進費	県	約 20万㎡	—	約 20万㎡	完了
⑥	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 20万㎡	約 4万㎡	約 40万㎡	H25～
⑦	熊野川	新宮市 相賀	一般採取	民間	約 2万㎡	—	約 3万㎡	H25～
⑧	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万㎡	—	約 7万㎡	完了
⑨	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	約 14万㎡	—	約 14万㎡	完了
⑩	熊野川	田辺市 本宮	20条工事	市	約 4万㎡	約 1万㎡	約 17万㎡	H29～
⑪	熊野川	新宮市 田長	交付金	県	約 5万㎡	—	約 5万㎡	完了
熊野川合計					約164万㎡	約 6万㎡	約199万㎡	
⑫	音無川	田辺市 一本松	国災	県	約 1万㎡	—	約 1万㎡	完了
⑬	大塔川	田辺市 川湯	県災	県	約 6万㎡	—	約 6万㎡	完了
⑭	篠尾川	新宮市 西敷屋	県災	県	約 1万㎡	—	約 1万㎡	完了
支川合計					約 8万㎡	—	約 8万㎡	
全体					約172万㎡	約 6万㎡	約207万㎡	
