


堆積土砂対策の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川整備課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図

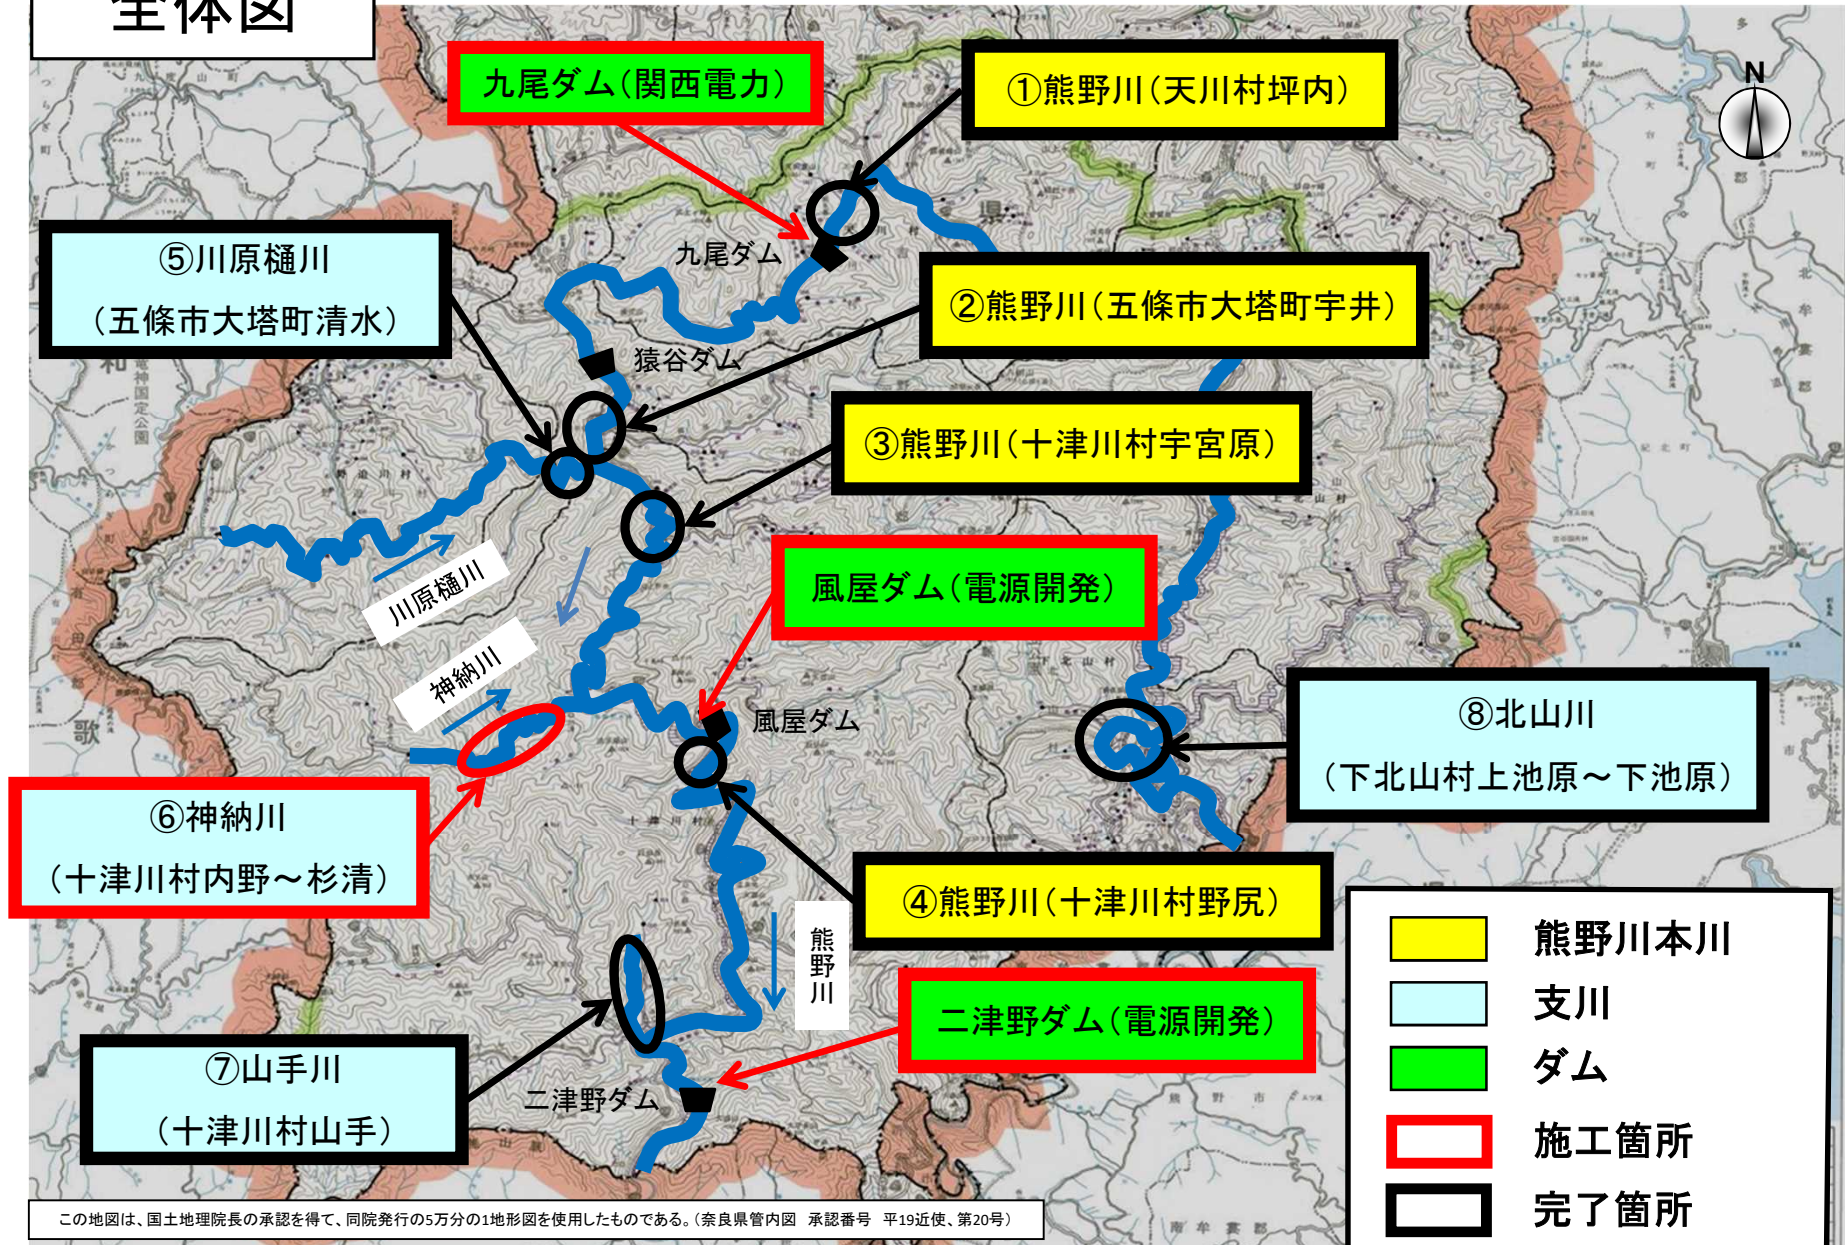

堆積土砂撤去(災害復旧事業分) 工程表(奈良県施行分)

参考

河川名	箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27	H28
熊野川 (くまのがわ)	① 天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small>	H23	8万m ³	■	完了				
	② 大塔町 宇井 <small>(うい)</small>	H23	47万m ³	■			完了		
	③ 十津川村 宇宮原 <small>(うぐはら)</small>	H23	112万m ³		■		完了		
		H25	台風18号分12万m ³				■	完了	
④ 十津川村 野尻 <small>(のじり)</small>	H23	6万m ³		■		完了			
川原樋川 (かわらびがわ)	⑤ 大塔町 清水 <small>(しみず)</small>	H23	14万m ³		■		完了		
神納川 (かんのがわ)	⑥ 十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small>	H23	21万m ³			■		完了	
		H25	台風18号分17万m ³				■		
		H26	台風11号分10万m ³					■	
山手川 (やまてがわ)	⑦ 十津川村 山手 <small>(やまて)</small>	H23	4万m ³	■		完了			完了
北山川 (きたやまがわ)	⑧ 下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small>	H23	9万m ³	■	完了				

- ・23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了
- ・上記災害復旧事業完了後(29年度～R3年度)、川原樋川1.8万m³、神納川8万m³、旭川1.1万m³、滝川2.2万m³の堆積土砂撤去を実施。
- ・国、県、関係自治体、関係機関と連携して、更なる堆積土砂対策を推進していく。

2. 新宮川水系堆積土砂処分推進事業

- 神納川(十津川村内野～杉清)

流域対策図

