

# 熊野川流域における民有林直轄治山事業の 取組状況について

令和4年6月  
近畿中国森林管理局  
計画保全部 治山課



国民の森林・国有林

近畿中国森林管理局



# 十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では、平成23年9月の台風12号に伴う豪雨により多数の大規模な崩壊が発生し、甚大な被害となったことから、被災箇所の早期復旧を図るため、奈良県吉野郡十津川村、天川村、五條市大塔町において緊急かつ計画的に復旧事業を実施中。
- 令和4年度は11箇所において溪間工5基、山腹工7箇所を計画しており、現在6箇所において溪間工3基、山腹工4箇所を実行中。



①赤谷b(被災時)



④坪内(被災時)



②檜股(被災時)




⑤テラ谷(被災時)



③五百瀬2号地(被災時)



⑥野尻(被災時)

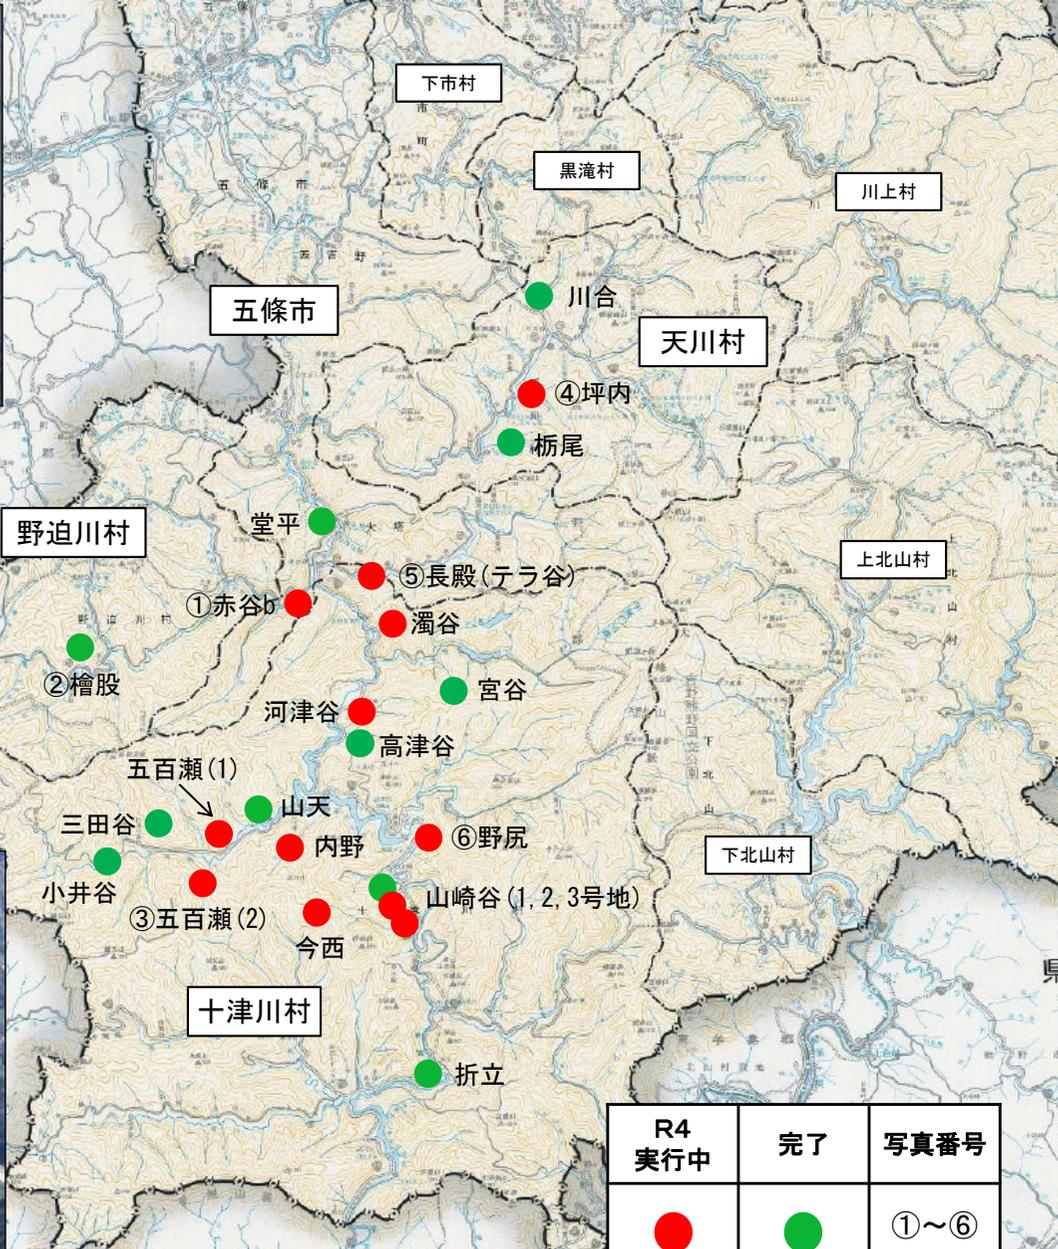

| R4<br>実行中 | 完了 | 写真番号 |
|-----------|----|------|
| ●         | ●  | ①~⑥  |

# 十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況②

## OR 4, 5 実行状況

① テラ谷 (R4. 3月撮影)



山腹工(簡易法砕吹付工・モルタル吹付工)

② 河津谷 (R4. 4月撮影)




溪間工(床固工)

③ 檜股 (R3. 12月撮影) 完成



山腹工(鋼製砕土留工)

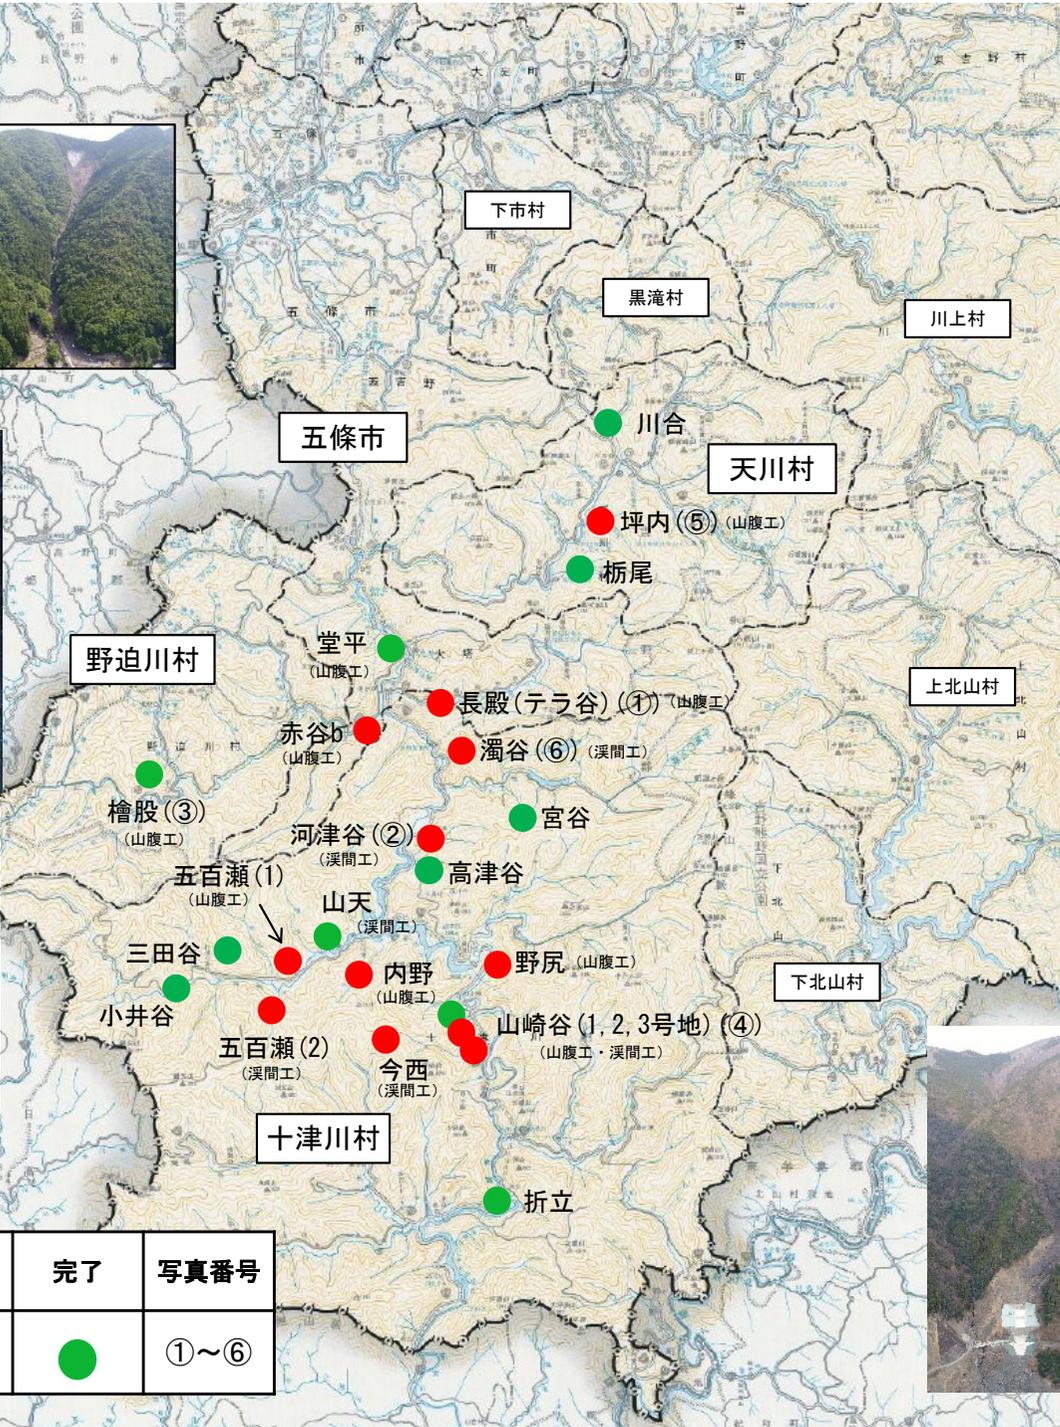

④ 山崎谷 (R4. 3月撮影)

溪間工(谷止工)




山腹工(法砕工)

⑤ 坪内 (R3. 12月撮影)



山腹工(排土工)

⑥ 濁谷 (R4. 4月撮影)

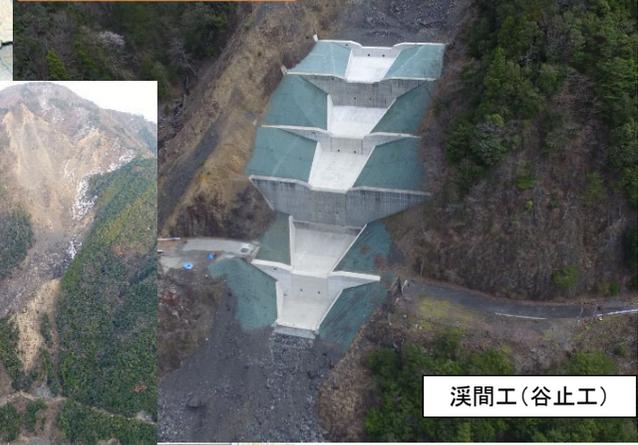

溪間工(谷止工)

| R4<br>実行中 | 完了 | 写真番号 |
|-----------|----|------|
| ●         | ●  | ①～⑥  |

# 十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況③

## 〇完了箇所

### ①三田谷 (完了)



溪間工(鋼製谷止工・コンクリート護岸工)  
山腹工(簡易法枠工・モルタル吹付工・コンクリート土留工・緑化工)

### ②堂平 (完了)



山腹工(アンカー工)

### ③山天 (完了)



溪間工(谷止工)

### ④川合 (完了)



山腹工(土留工・法枠工・緑化工)

### ⑤山崎谷 1号地 (完了)




山腹工(法枠工・モルタル吹付工・緑化工)  
溪間工(護岸工)


### ⑥折立 (完了)



山腹工(法枠工・土留工・緑化工)

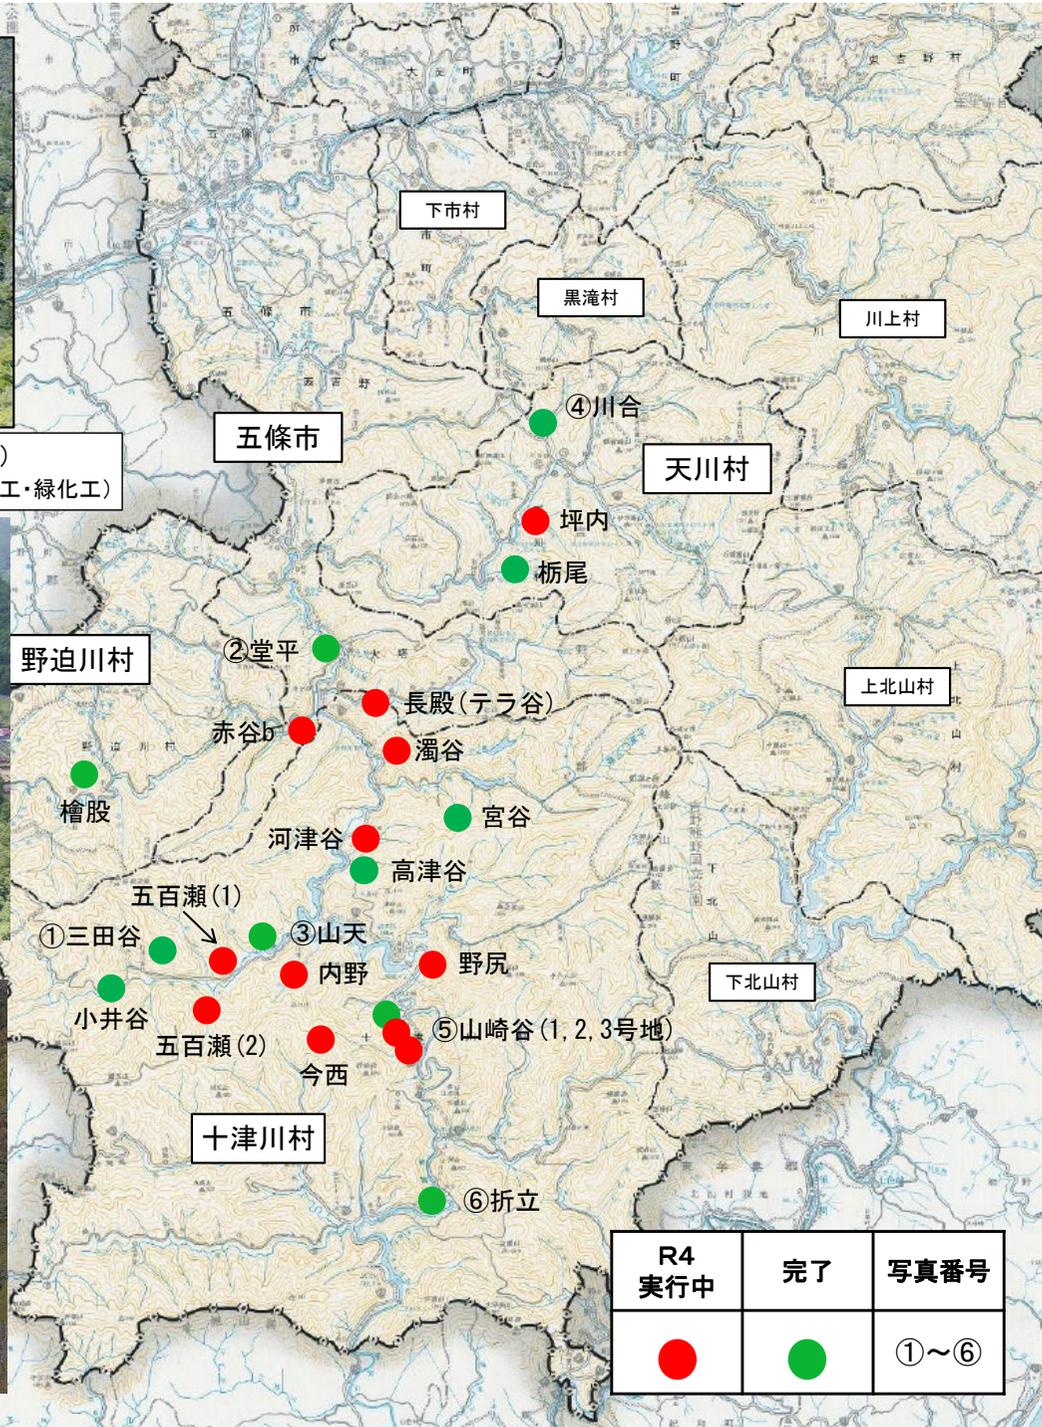


| R4<br>実行中 | 完了 | 写真番号 |
|-----------|----|------|
| ●         | ●  | ①~⑥  |



# 紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では平成23年9月の台風12号災により発生した荒廃箇所の早期復旧を図るため、平成24年度より、和歌山県田辺市内の6箇所について民有林直轄治山事業として事業着手。平成27年度には事業が完了した菖蒲谷を和歌山県へ移管し、また、平成29年度より上秋津を追加、令和2年度には事業が完了した八升前、愛賀合を和歌山県へ移管し、現在4箇所において事業を実施中。
- 令和4年度は4箇所において山腹工4箇所を計画しており、現在全て実行中。

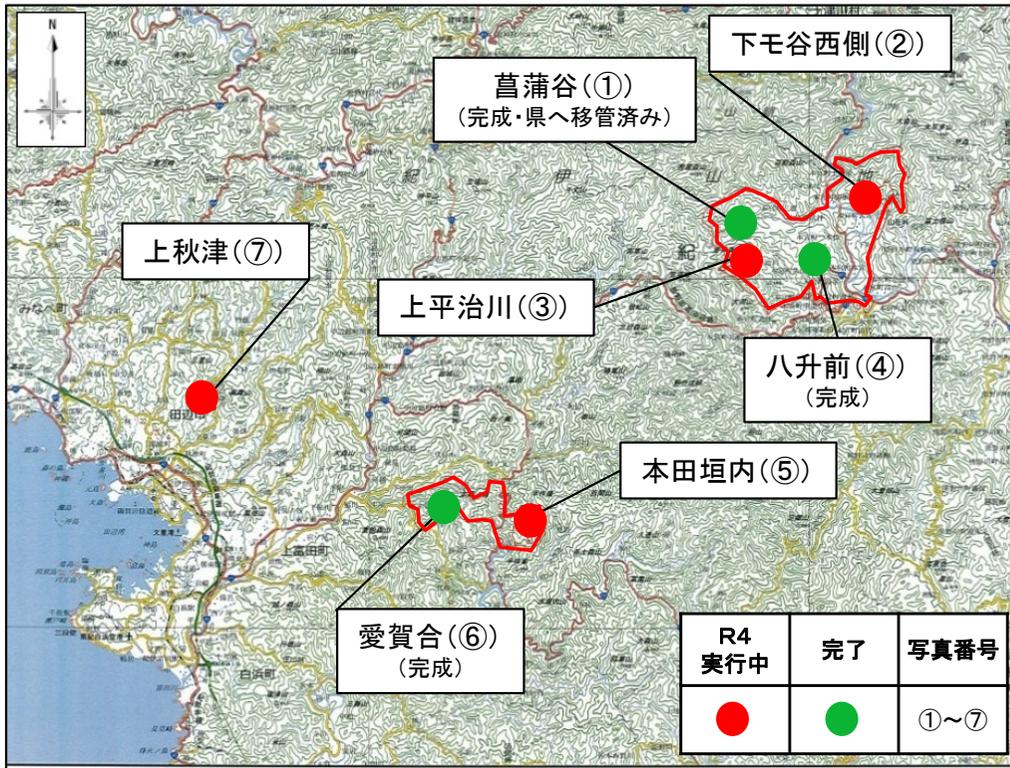

# 紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況②

## OR 4 実行状況

