

# 熊野川堆積土砂除去の取り組み状況

## 除去スケジュール

区間		除去全体予定量 (万m <sup>3</sup> )	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29～	
①河口～相賀	熊野川	215	[Red bar from H23 to H28]							[Red bar from H29 to H29]
	熊野川	23			[Red bar from H25 to H29]					
①相賀～宮井	支 川	11		[Red bar from H24 to H29]						
	※河川管理者等が連携してさらなる堆積土砂の除去及び民間による砂利採取を調整中。									
②宮井～二津野ダム	熊野川	159	[Red bar from H23 to H28]							
	支 川	8	[Red bar from H23 to H24]							
③二津野ダム上流	熊野川	173	[Red bar from H23 to H27]							
	支 川	39		[Red bar from H24 to H27]						
④宮井～小森ダム	北山川	—								
	支 川	1			[Red bar from H25 to H26]					
⑤小森ダム上流	北山川	9		[Red bar from H24 to H25]						
	支 川	4			[Red bar from H25 to H29]					

(ダム管理区間は除く)

※ ①の区間の激特事業についてはH28に完了予定であり、熊野川（本川）の再度災害防止が概ね達成。H29以降についても対応を検討中。  
 ※ ①の区間以外においても各県独自に民間による砂利採取の適用について実施もしくは調整が進められている区間がある。  
 ※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある。

# 熊野川堆積土砂除去の取り組み状況


H28.3月末時点

**凡例**

**区間名**

本川 除去予定量 (H27年度末迄除去量)  
【H28年度除去予定量】

支川 除去予定量 (H27年度末迄除去量)  
【H28年度除去予定量】

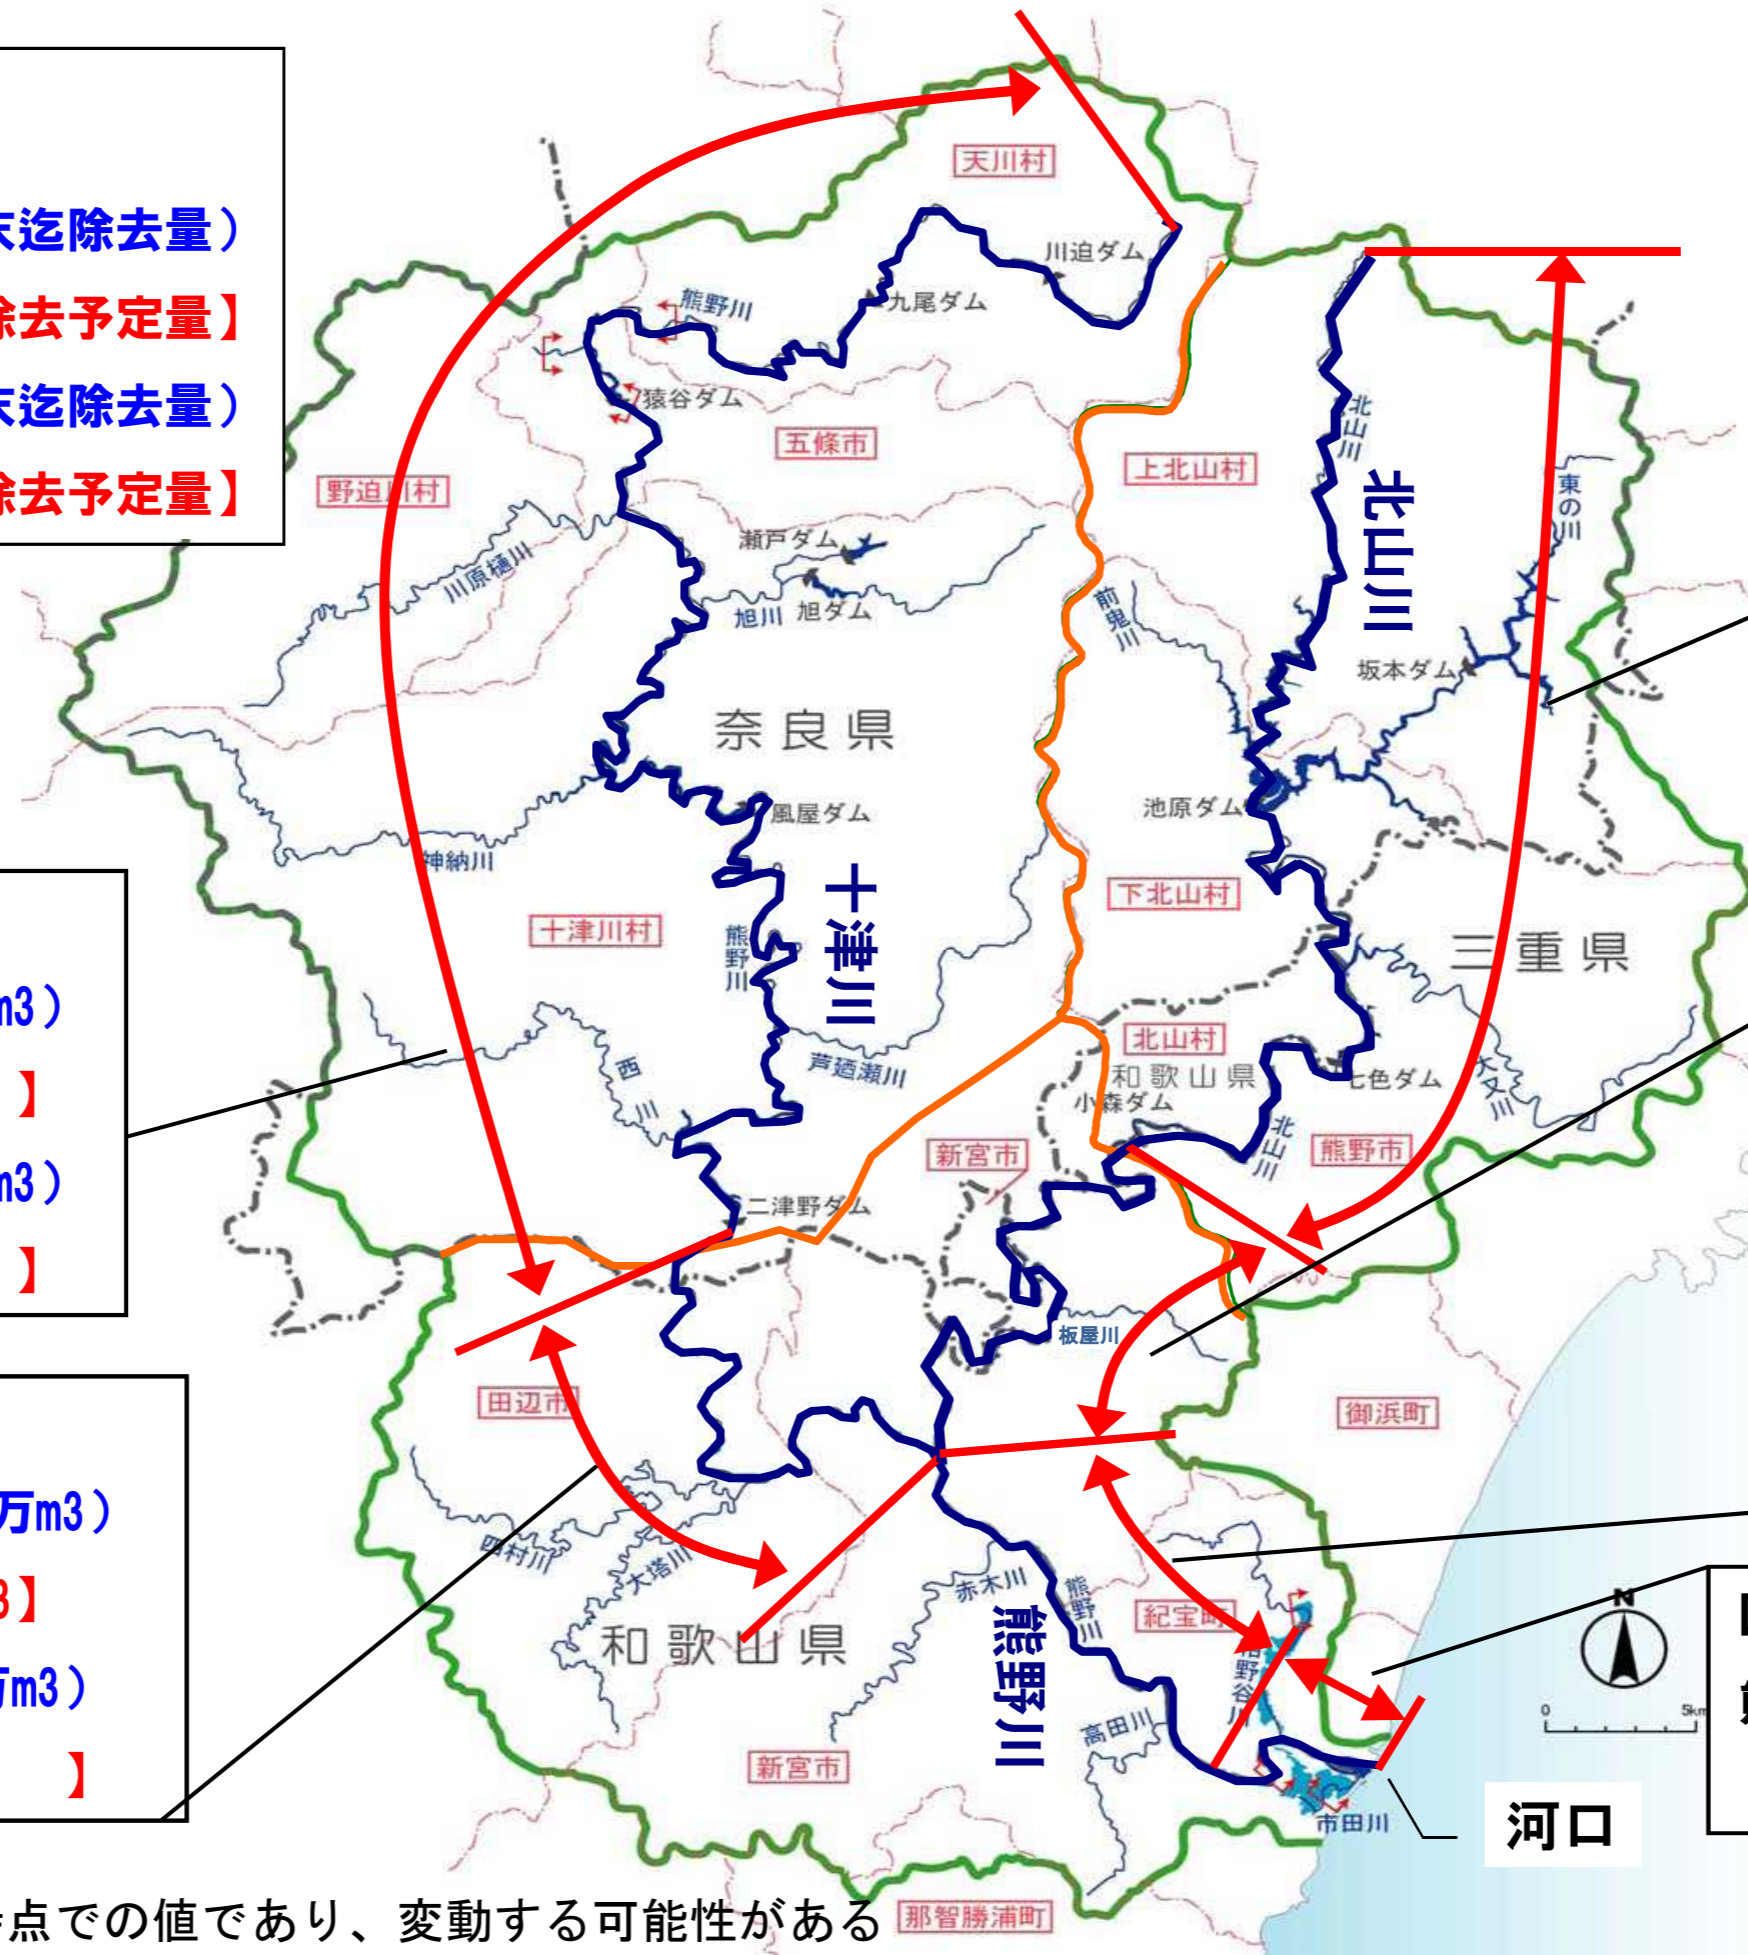

**区間③ (完了)**

熊野川 173 万m<sup>3</sup> (173万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

支川 39 万m<sup>3</sup> (39万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

**区間②**

熊野川 159 万m<sup>3</sup> (105.2万m<sup>3</sup>)  
【16万m<sup>3</sup>】

支川 8 万m<sup>3</sup> (8万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

**区間⑤**

北山川 9万m<sup>3</sup> (9万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

支川 4万m<sup>3</sup> (3.2万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

**区間④ (完了)**

北山川 - 万m<sup>3</sup>

支川 1.2万m<sup>3</sup> (1.2万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

**区間①**

熊野川 23万m<sup>3</sup> (17.4万m<sup>3</sup>)  
【5.1万m<sup>3</sup>】


支川 11万m<sup>3</sup> (9.5万m<sup>3</sup>)  
【 - 】

**区間① (完了予定)**

熊野川 215万m<sup>3</sup> (144.5万m<sup>3</sup>)  
【70.2万m<sup>3</sup>】

※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある (ダム管理区間は除く)

# 熊野川(直轄上流端～北山川合流点)における堆積土砂の対応状況

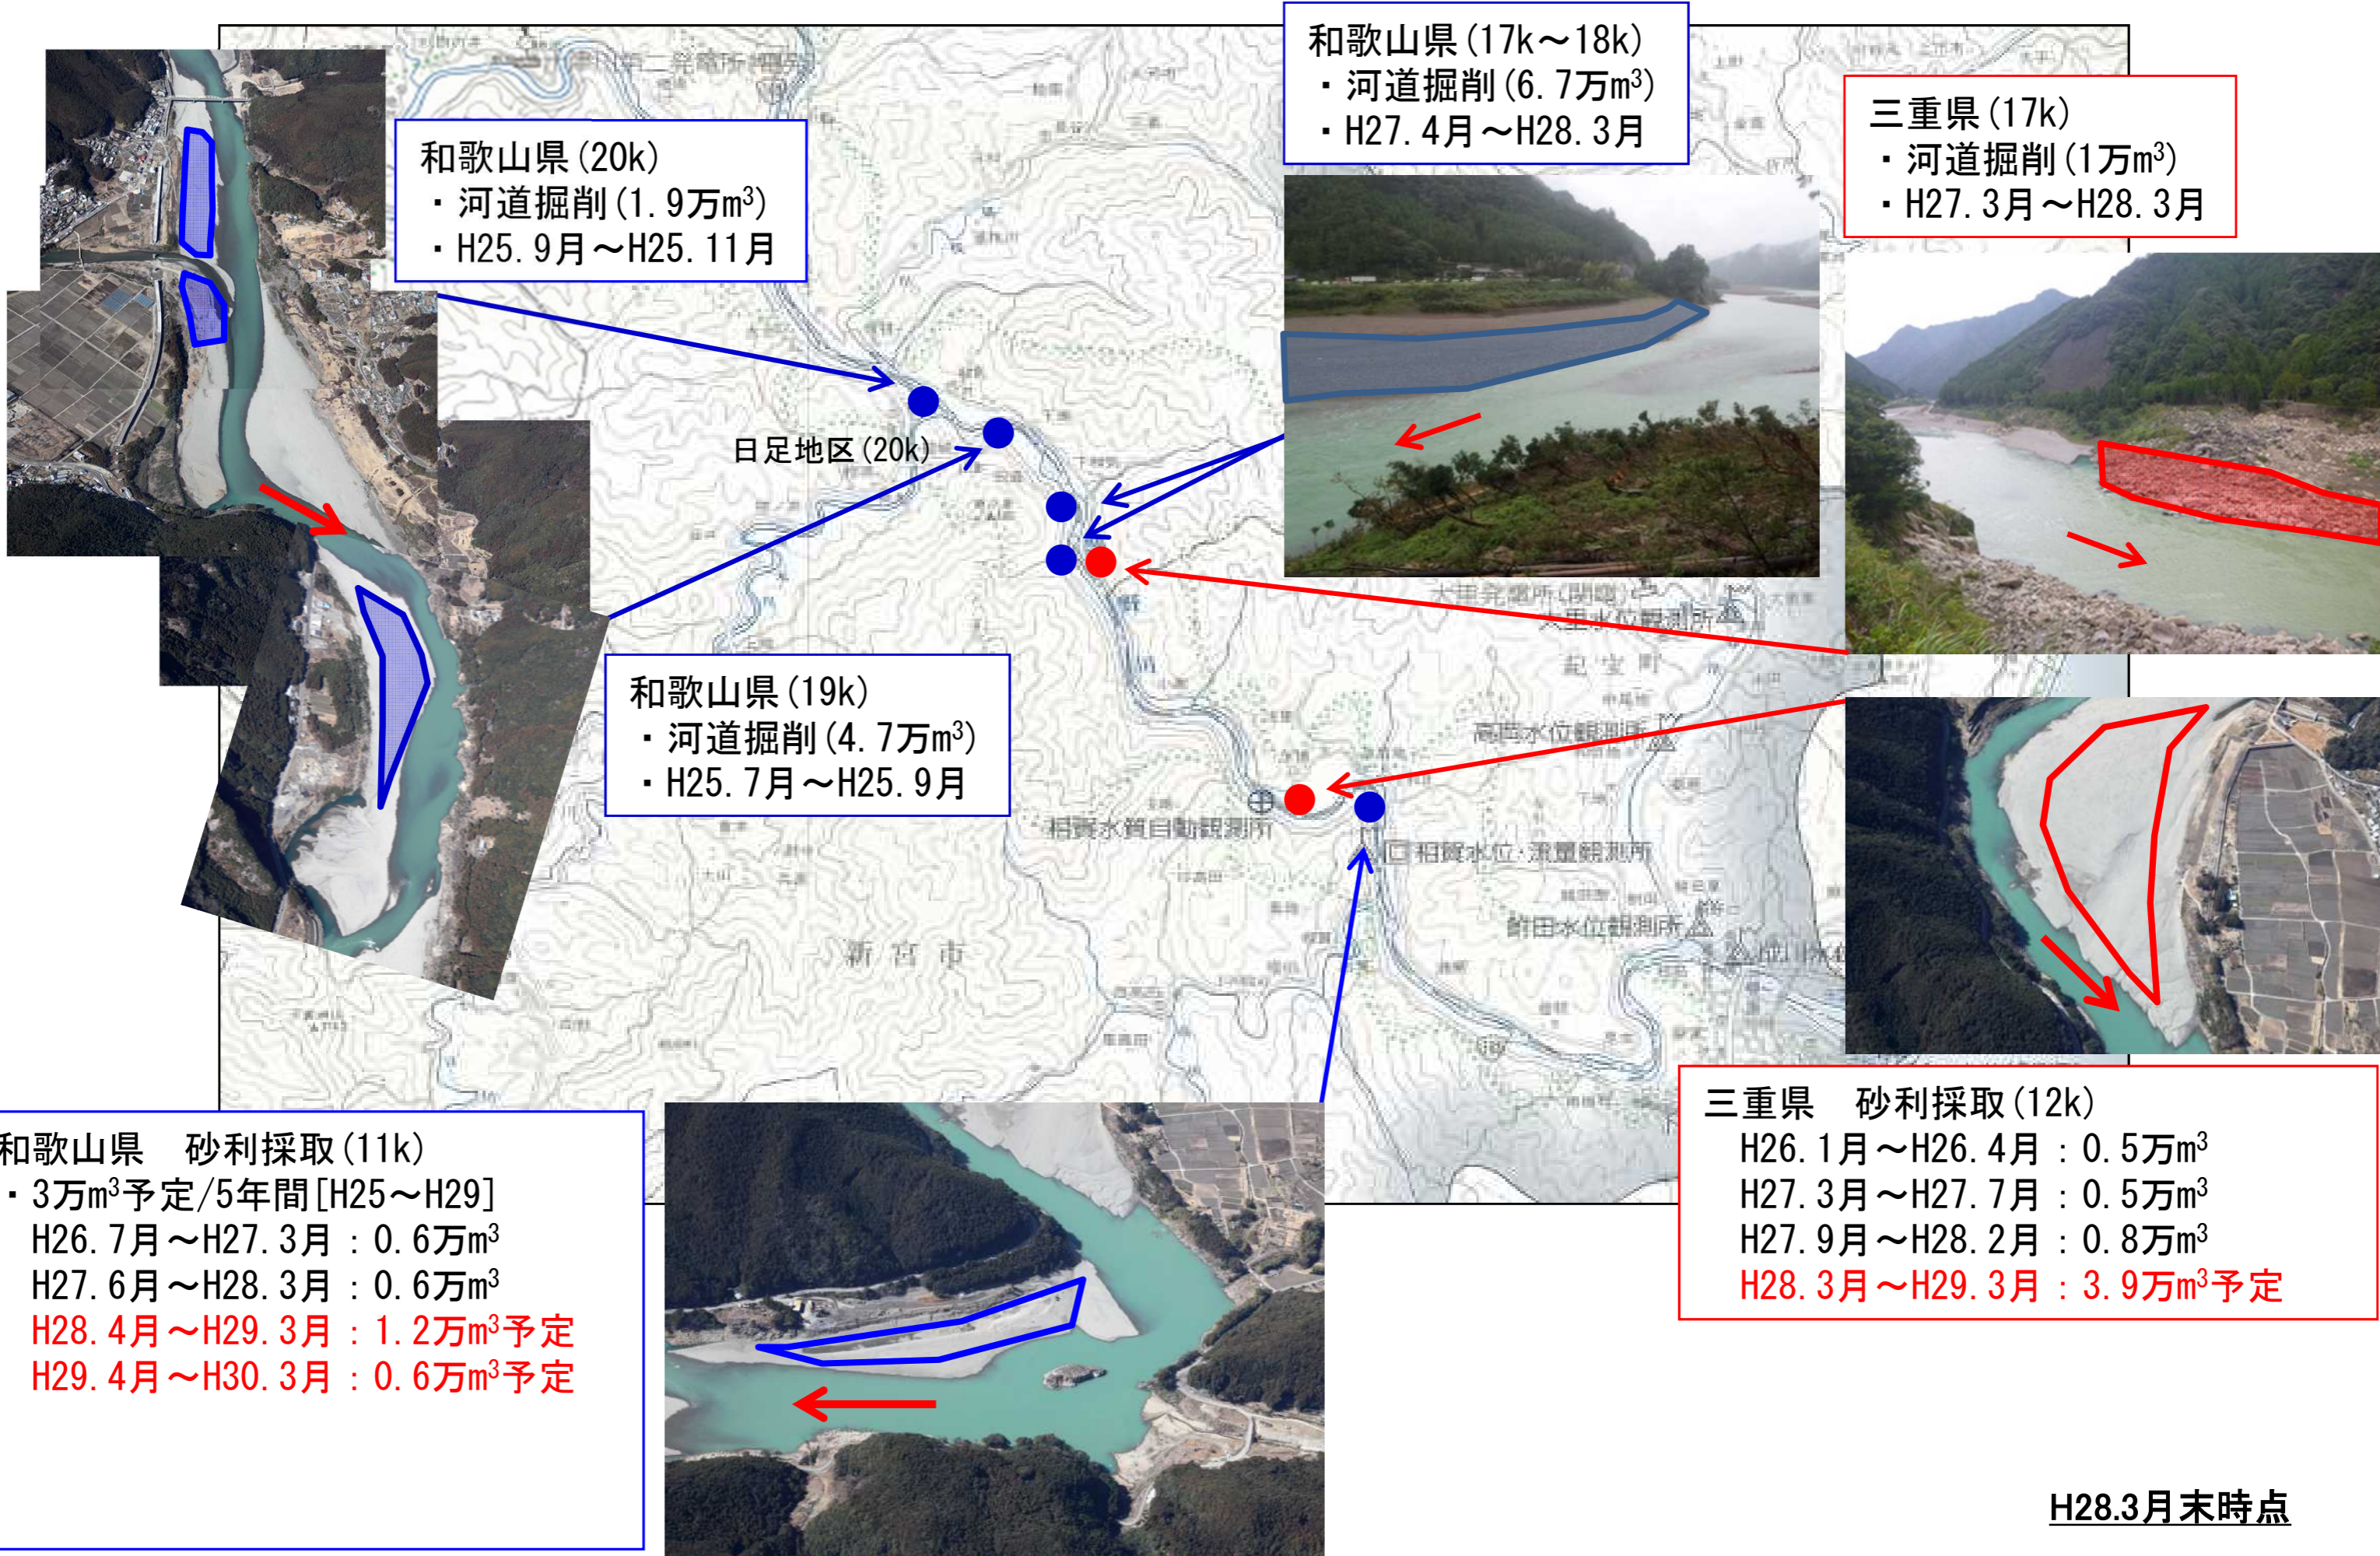

和歌山県 (20k)  
 ・河道掘削 (1.9万m<sup>3</sup>)  
 ・H25. 9月～H25. 11月

和歌山県 (17k～18k)  
 ・河道掘削 (6.7万m<sup>3</sup>)  
 ・H27. 4月～H28. 3月

三重県 (17k)  
 ・河道掘削 (1万m<sup>3</sup>)  
 ・H27. 3月～H28. 3月

和歌山県 (19k)  
 ・河道掘削 (4.7万m<sup>3</sup>)  
 ・H25. 7月～H25. 9月

和歌山県 砂利採取 (11k)  
 ・3万m<sup>3</sup>予定/5年間 [H25～H29]  
 H26. 7月～H27. 3月 : 0.6万m<sup>3</sup>  
 H27. 6月～H28. 3月 : 0.6万m<sup>3</sup>  
 H28. 4月～H29. 3月 : 1.2万m<sup>3</sup>予定  
 H29. 4月～H30. 3月 : 0.6万m<sup>3</sup>予定

三重県 砂利採取 (12k)  
 H26. 1月～H26. 4月 : 0.5万m<sup>3</sup>  
 H27. 3月～H27. 7月 : 0.5万m<sup>3</sup>  
 H27. 9月～H28. 2月 : 0.8万m<sup>3</sup>  
 H28. 3月～H29. 3月 : 3.9万m<sup>3</sup>予定

H28.3月末時点
