
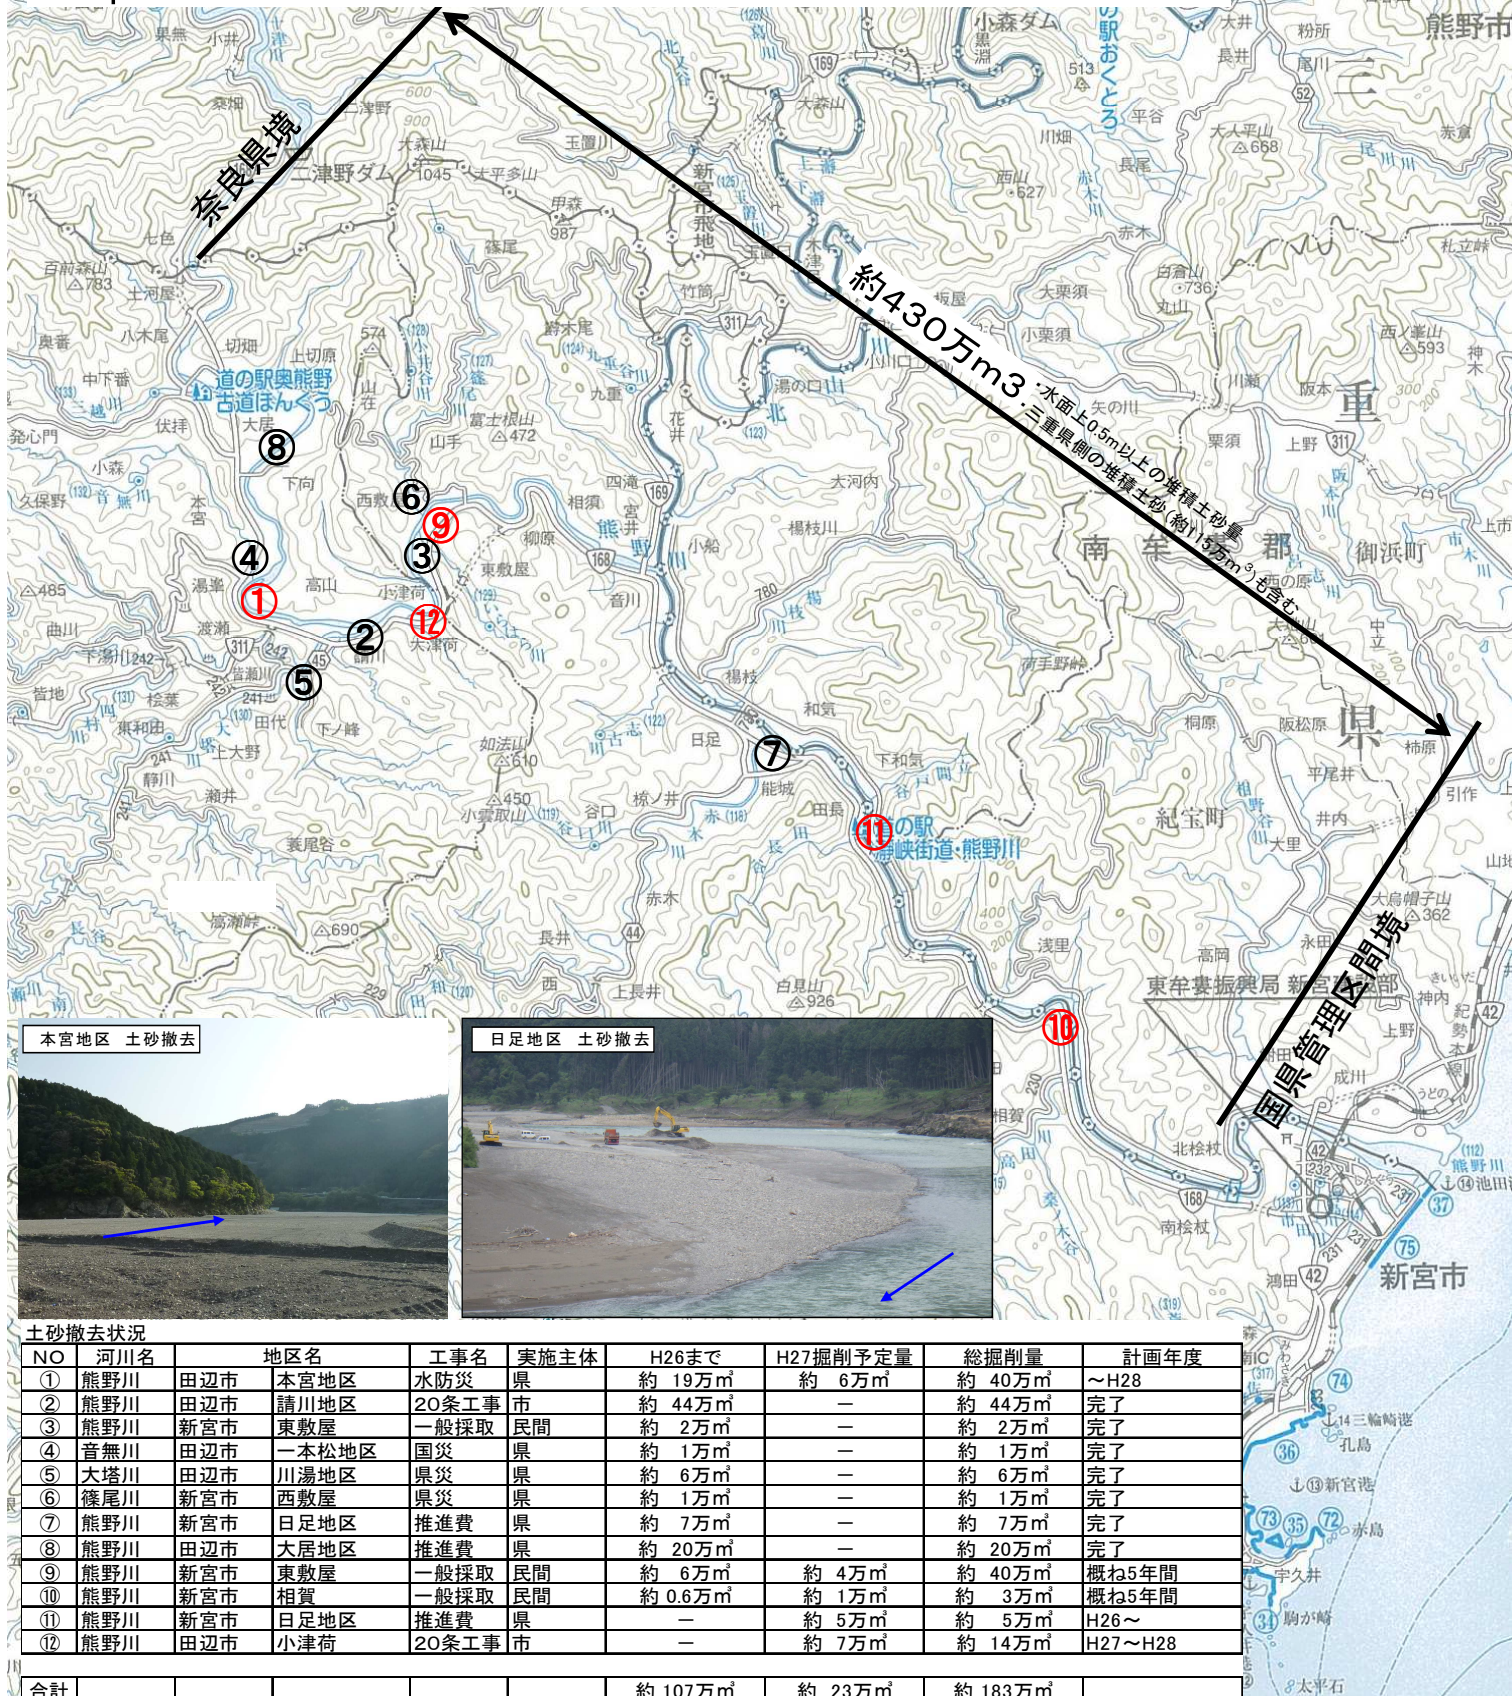


河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

平成27年10月現在

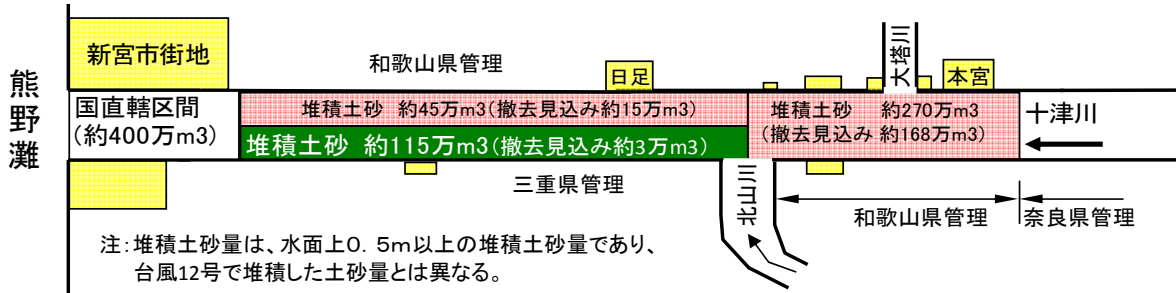

土砂撤去状況

NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	H26まで	H27掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮地区	水防災	県	約 19万m ³	約 6万m ³	約 40万m ³	~H28
②	熊野川	田辺市 請川地区	20条工事	市	約 44万m ³	—	約 44万m ³	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万m ³	—	約 2万m ³	完了
④	音無川	田辺市 一本松地区	国災	県	約 1万m ³	—	約 1万m ³	完了
⑤	大塔川	田辺市 川湯地区	県災	県	約 6万m ³	—	約 6万m ³	完了
⑥	篠尾川	新宮市 西敷屋	県災	県	約 1万m ³	—	約 1万m ³	完了
⑦	熊野川	新宮市 日足地区	推進費	県	約 7万m ³	—	約 7万m ³	完了
⑧	熊野川	田辺市 大居地区	推進費	県	約 20万m ³	—	約 20万m ³	完了
⑨	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 6万m ³	約 4万m ³	約 40万m ³	概ね5年間
⑩	熊野川	新宮市 相賀	一般採取	民間	約 0.6万m ³	約 1万m ³	約 3万m ³	概ね5年間
⑪	熊野川	新宮市 日足地区	推進費	県	—	約 5万m ³	約 5万m ³	H26~
⑫	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	—	約 7万m ³	約 14万m ³	H27~H28
合計					約 107万m ³	約 23万m ³	約 183万m ³	
