


新宮川水系の治水対策対応状況【三重県】 H27. 11. 11

- 平成 27 年度の対応
1. 熊野川支川堆積土砂撤去 約 5,500 m³
 2. 熊野川本川和気地区で約 10,000 m³の土砂撤去実施中
(災害対策等緊急事業推進費)
 3. 熊野川本川浅里地区で、約 5,000 m³の砂利採取実施
引き続き約 7,900 m³の砂利採取実施予定
 4. 砂防事業による河川への土砂流出抑止(3 渓流で事業実施中)
 5. 熊野川浅里地先に設置した水位計による水位観測の実施
 6. 熊野川本川(北檜杖地区、瀬原地区)、清水元川(浅里地区)で量水標を設置予定

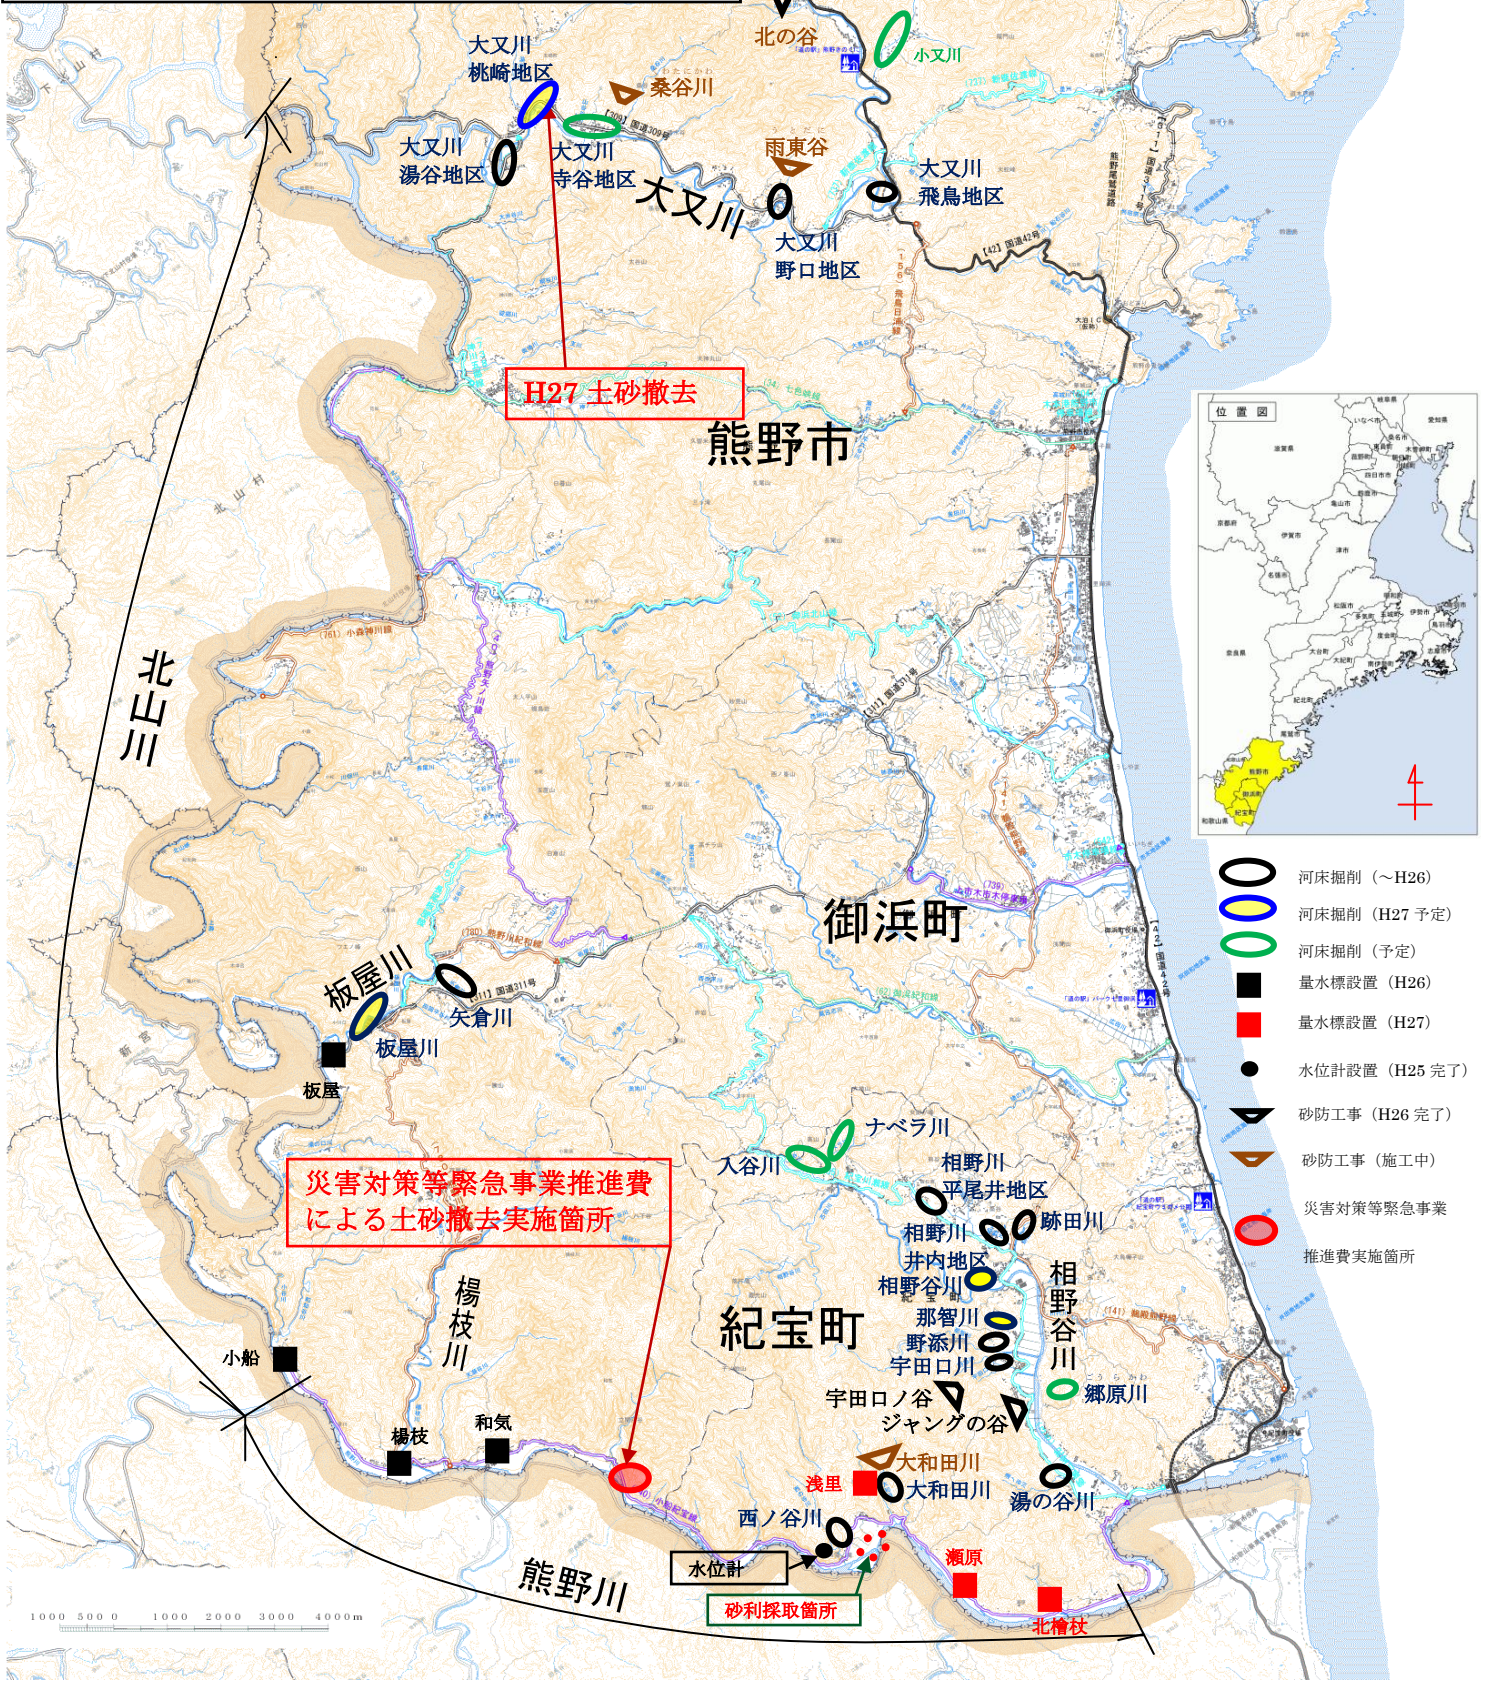

- 河床掘削 (～H26)
- 河床掘削 (H27 予定)
- 河床掘削 (予定)
- 量水標設置 (H26)
- 量水標設置 (H27)
- 水位計設置 (H25 完了)
- ▼ 砂防工事 (H26 完了)
- ▼ 砂防工事 (施工中)
- 災害対策等緊急事業推進費実施箇所

災害緊急事業推進費 進捗状況写真

○着手前



○現在



浅里地区砂利採取状況

