

# 実施計画に係る事業進捗状況

令和7年 11月26日

国土交通省 近畿地方整備局

## ④ー２ 高時川の維持管理 堰堤再整備について（針川堰堤）

○堰堤の再整備工事を実施中。

○令和6年度に左岸側の施工が完了。引き続き、右岸側を施工し、令和7年度中に完成予定。


着手前




施工状況(全景)(R7.10)



整備内容(平面図)

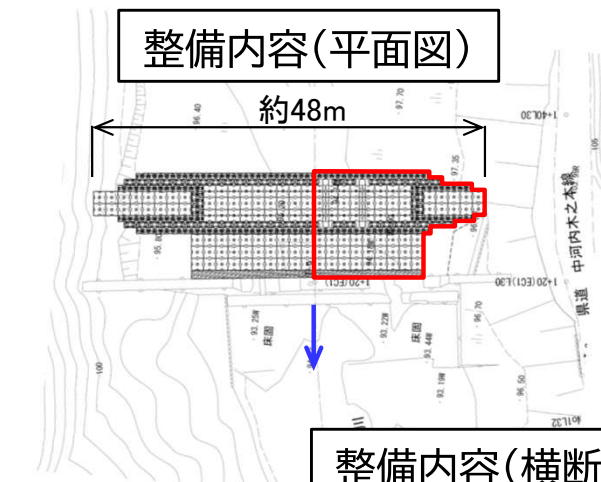


整備内容(縦断図)

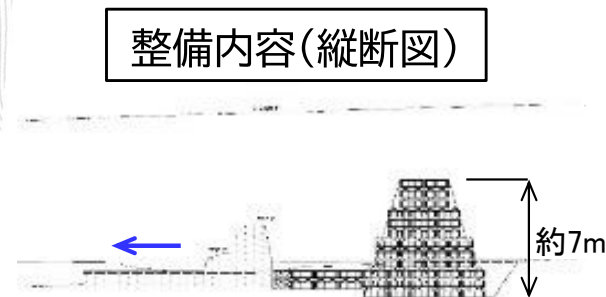

整備内容(横断図)＜上流面＞

施工完了範囲



施工状況(R7.10)



施工状況(R7.10)






## ⑬－１ 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援「ふるさと絵屏風の制作」

- 余呉まちづくり推進会議が主体となり制作するふるさと絵屏風を、国が滋賀県や長浜市と協力して支援。
- 令和5年度には、3地区(余呉、丹生、片岡)のうち、余呉地区の絵屏風が完成。
- 令和6年度は、片岡地区の絵屏風制作に着手。
- 令和7年度は、片岡地区の絵屏風が完成。引き続き丹生地区の絵屏風の制作に着手。

### 「ふるさと絵屏風」を活用した水源地域の活性化や重要性等の認識

#### ■「ふるさと絵屏風」制作の流れ



#### ■「ふるさと絵屏風」とは

- 余呉地域の風土と暮らしを掘り起こし、記録・継承するとともに、地域資源を活かしたまちづくりにつなげることを目的とし作成。
- 地域に暮らす人々の五感体験を集め、地域の風土や暮らしの様子を、地域の人々で絵にしたもの。

#### 活用方法

##### 流域

##### 水源地域

- ①余呉地域の風土と暮らしを記録・継承

- ②流域住民が水源地域の重要性を知るための材料
- ③その他広報・PR（観光関連など）

聞き取り調査の様子



監修者と絵師さんの打合せの様子



完成



余呉ふるさと絵屏風完成おひろめ・絵とき会の様子(R7.7.12実施)

