





- ・今年度も引き続き、九尾ダムと川迫ダムの堆積土砂を掘削・搬出する。
- ・九尾ダムは、約50千 m^3 の掘削・搬出を計画しており、このうち約20千 m^3 を国土交通省工事の紀伊山系直轄砂防事業（冷水山腹工）の押さえ盛土材として搬出していただき、当社は水谷土捨場へ約30千 m^3 を搬出する予定。
- ・川迫ダムは、水谷土捨場へ約5千 m^3 を搬出する予定。

各ダムの堆積土砂量 (千 m^3)

ダム名	年度					差 (H30-H29) (瀬戸H28-H25)
	H26	H27	H28	H29	H30	
川 迫	941	943	940	935	958	23
九 尾	821	791	766	737	741	4
旭	945	980	981	992	1022	30
瀬 戸 ^{※1}	-	-	385	-	-	28

※1 瀬戸ダム：H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、R1年度に測量実施）

九尾ダム・川迫ダムの堆積土砂状況

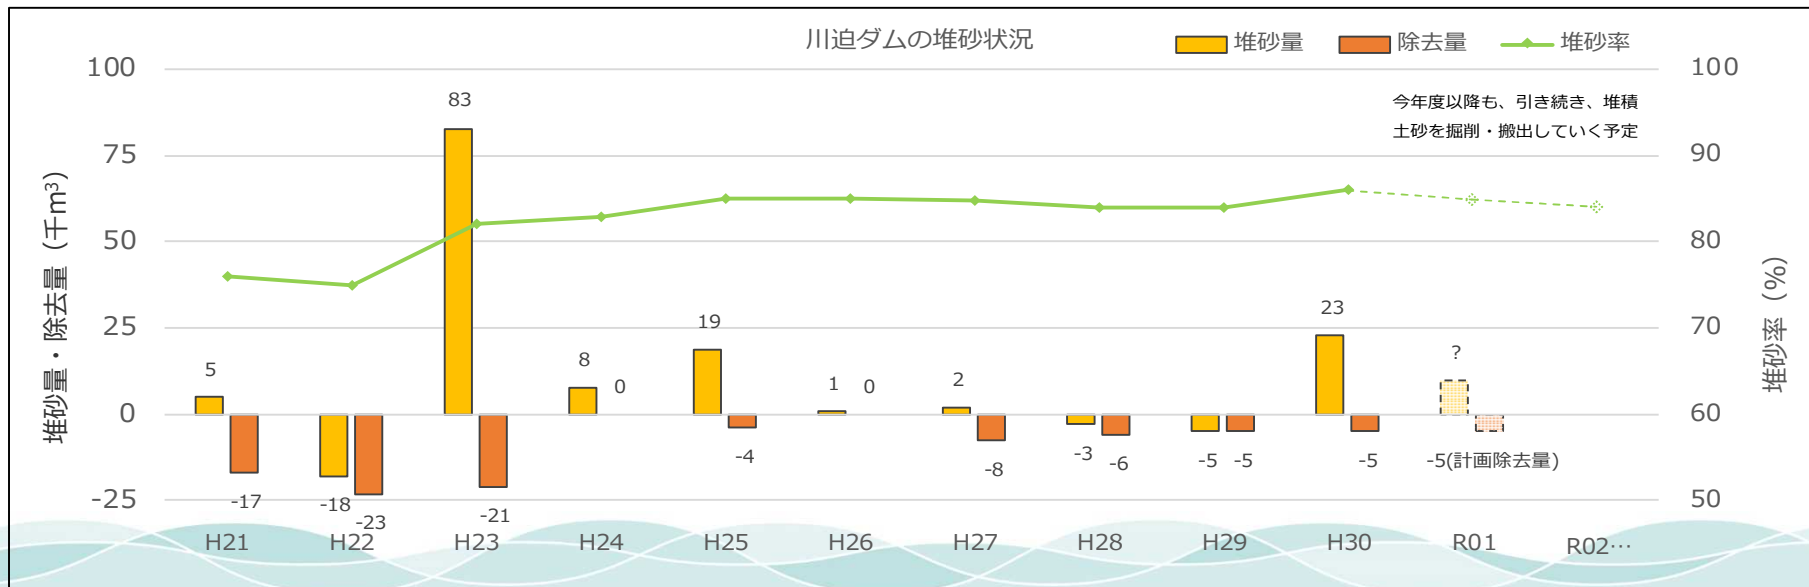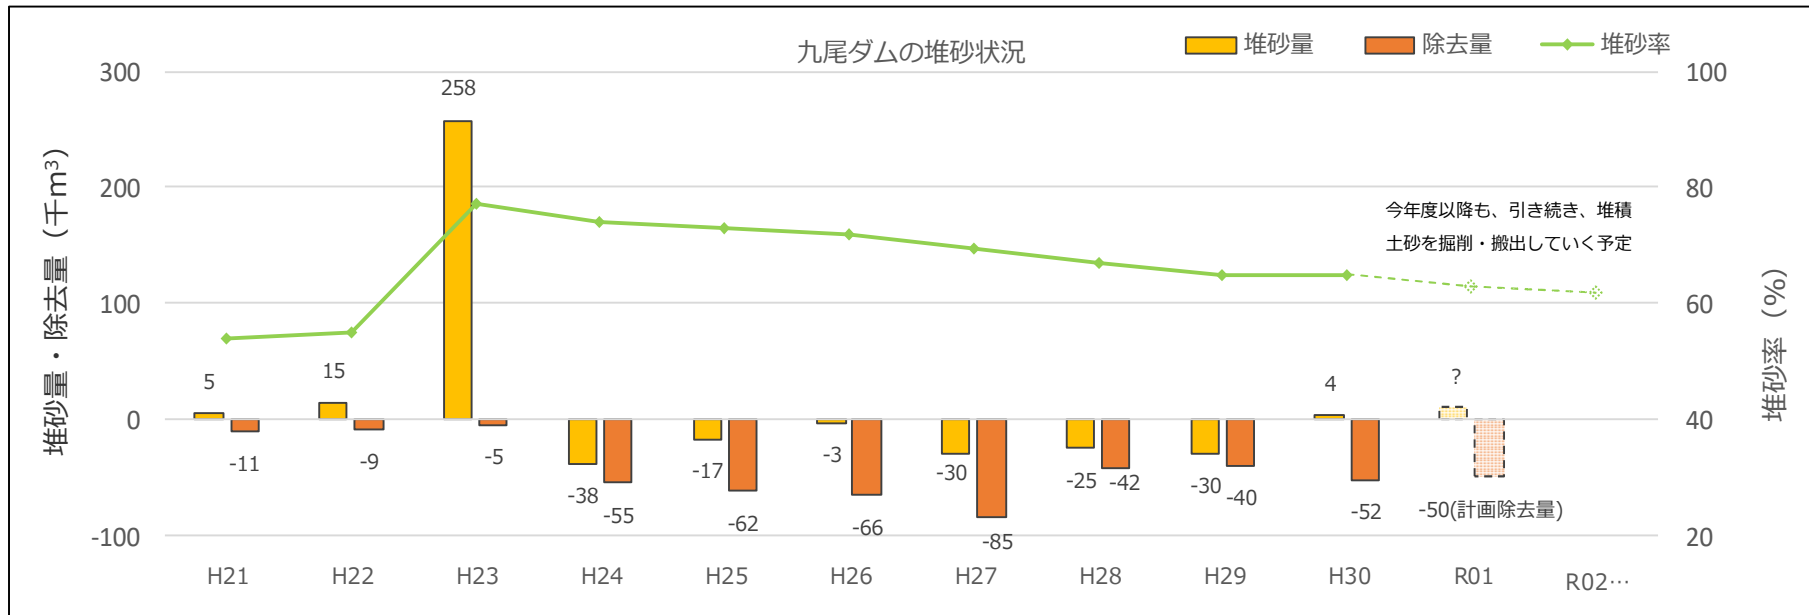

九尾ダムの堆積土砂対策状況

