



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます >>>

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事 【(株)城内組】



令和7年10月9日時点

○防災ステーション建設のための基盤盛土を行う工事です。
9月下旬より、盛土施工を開始しました。(盛土量：約4,000m³/約30,000m³)
盛土材料の製造継続中 (製造量：約10,000m³/約17,000m³)



ICT盛土工施工状況

1日当たり約800m³程度の盛土材を運搬し施工しています。



MCブルドーザによる盛土材敷均し
(敷均し厚 t=34cm)



GNSSを用いた転圧管理システム搭載
10tローラによる転圧 (転圧回数6回)

令和7年9月9日撮影



令和7年10月8日撮影



空撮写真提供



大和川遊水地整備工事 【(株)城内組】



工事概要



○窪田事業所内に仮置きしている表土（草・根混じり土）の搬出が完了しました。



令和7年9月9日撮影
仮置き表土搬出
残土量：約1000m³



令和7年10月8日撮影
仮置き表土搬出完了

空撮写真提供



スキャドロン株式会社

○11月より、土質改良システムを引き継いで当工事で盛土材料の製造を行っていきます。
(予定数量：約5,000m³)



投入パックホウ

自走式混合機

積込パックホウ



工事概要



YAHAGI 矢作建設工業株式会社

- 7月より樋門本体の構築作業を開始しました。
- 10月も引き続き樋門本体の構築作業をおこないます。

主な作業内容

①土工(掘削)

・現在の堤防を掘削します。

②地盤改良工

・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。

③樋門・樋管本體工


・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

←10月の作業内容

④護岸・護床工

・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所

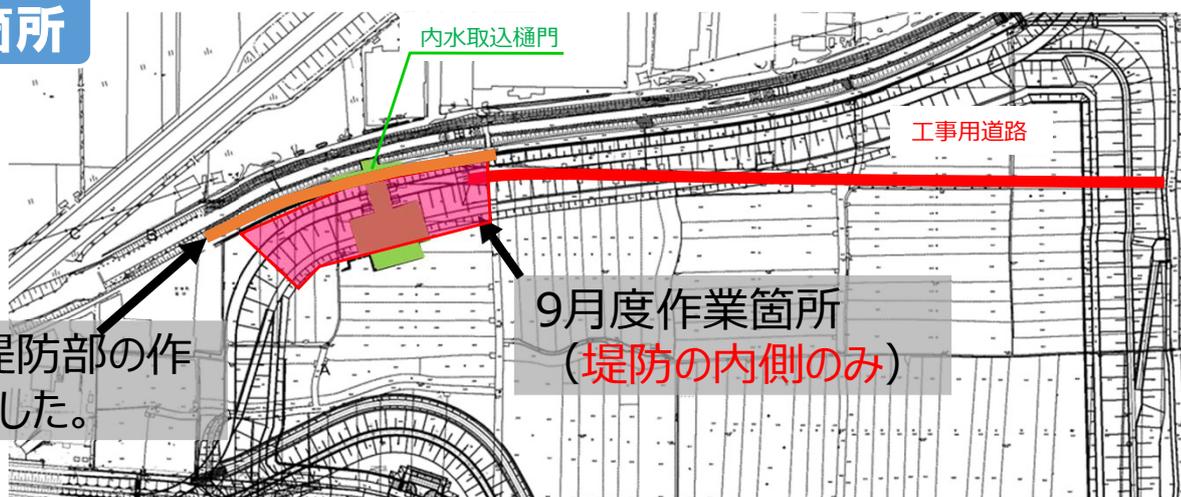

9月度の作業の様子

樋門本体の構造物構築を行いました。



工事に関するご連絡先

【発注者】

近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所

【受注者】

矢作建設工業株式会社

☎0743-84-8010 (昼間)



今月の作業

○現在、樋門本體工（門柱部）の施工を行っています。
今月から、新しく追加されたまほろば盛土の法尻排水工事を行っています。

工事の流れ

今月は、樋門・樋管本體工（門柱部）を施工していきます。
鉄筋の組立及び型枠の組立及びコンクリートの打設がメインの作業になります。
また、法覆護岸工の低水護岸（下段）の施工も順に行っていきます。

現在施工箇所



まほろば盛土の法尻排水について

○今月から、まほろば盛土の法尻排水工事の施工を行っています。
現在、他工事で岡崎川沿いの通行止めを行っていますので、期間中に完了します。（通行止め解除は、他工事の施工完了後になります）
当該作業は、10月末完了を目指しております。

