



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます >>>

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事 【(株)城内組】



○防災ステーション建設のための基盤盛土を行う工事です。
盛土施工の進捗。(盛土量：約18,000m³/約30,000m³)
盛土材料の製造完了。(製造量：17,000m³ 11/3完了)

令和7年11月10日時点



令和7年10月8日撮影



令和7年11月10日撮影



空撮写真提供



大和川遊水地整備工事 【(株)城内組】



工事概要




○11月4日より、土質改良システムを引き継いで当工事で盛土材料の製造を行っています。（製造量：約2,000m³約5,000m³）
11月末で完了する予定です。

令和7年11月10日時点



令和7年10月8日撮影 盛土材製造状況と盛土材仮置き場

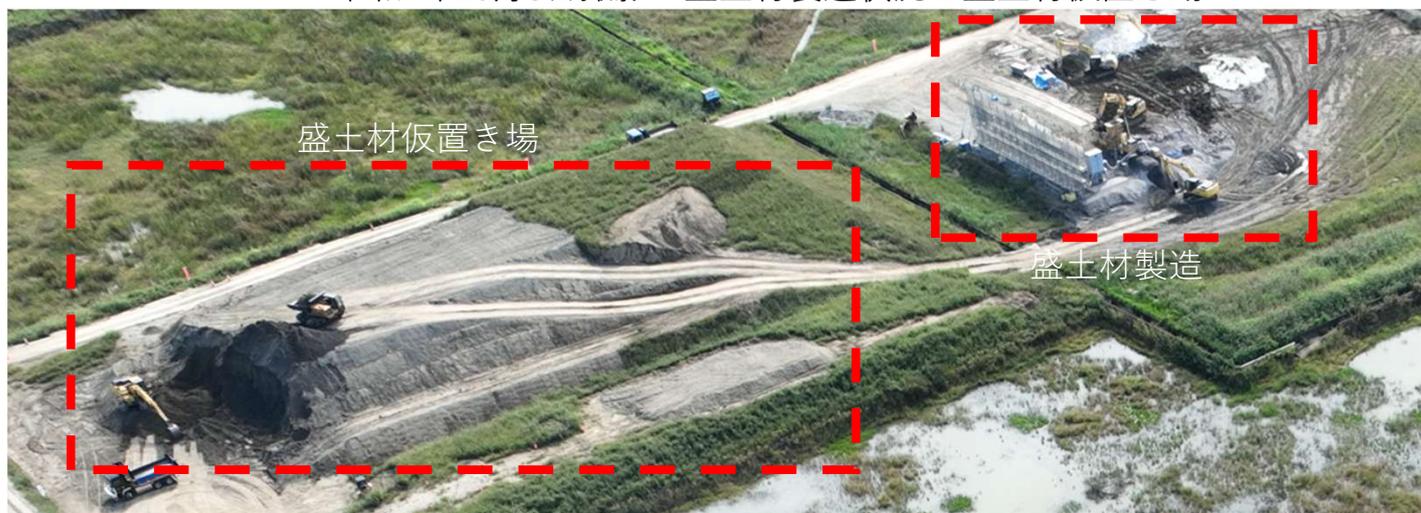

令和7年11月10日撮影 盛土材製造状況と盛土材仮置き場



空撮写真提供

SCADRON



スキャドロン株式会社

工事概要



YAHAGI 矢作建設工業株式会社

- 7月より樋門本体の構築作業を開始しました。
- 11月も引き続き樋門本体の構築作業をおこないます。
- 11月度より堤防道路の掘削に着手しました。

主な作業内容

①土工(掘削)

・現在の堤防を掘削します。

②地盤改良工

・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。

③樋門・樋管本體工


・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

←11月の作業内容

④護岸・護床工

・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所

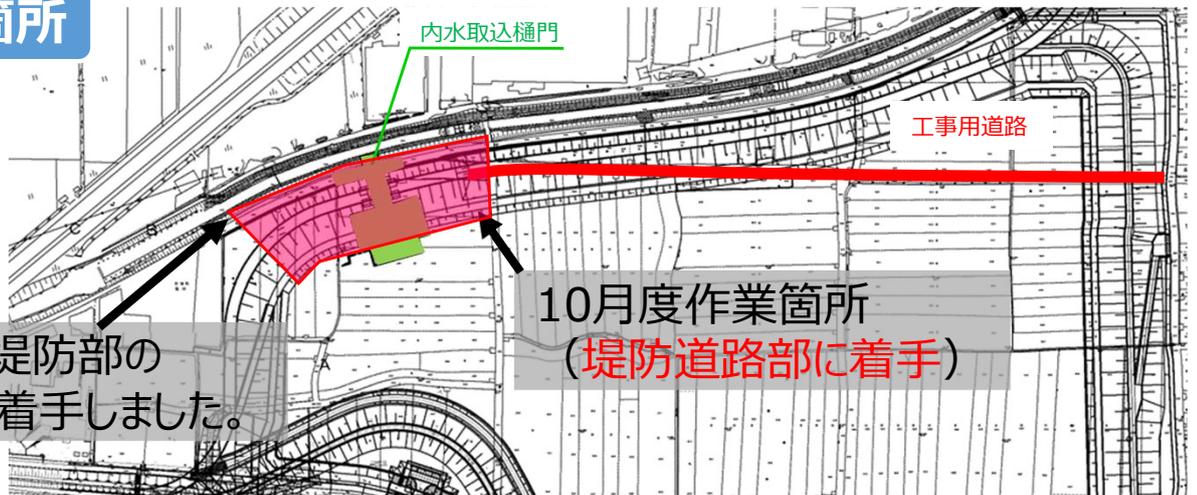

11月度より堤防部の掘削作業に着手しました。

作業の様子



樋門本体の構造物構築を行いました。

工事に関するご連絡先

【発注者】

近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所

【受注者】

矢作建設工業株式会社

☎0743-84-8010 (昼間)



今月の作業

○現在、樋門本體工（門柱部）の施工を行っています。
先月から工事を行った、まほろば盛土の法尻排水工事は完了しました。

工事の流れ

今月は、樋門・樋管本體工（門柱部・操作台部）を施工していきます。

鉄筋の組立及び型枠の組立及びコンクリートの打設がメインの作業になります。

また、今月から築堤盛土の施工も開始していく予定です。

現在施工箇所



まほろば盛土の法尻排水施工完了について

○先月から行っていました、まほろば盛土の法尻排水工事の施工（法尻排水（U型側溝等）及び法面の防草シート敷設）が完了しました。

