堤防の緊急点検結果　概要図
＜紀の川＞

点検結果（要対策）凡例

- 堤防への浸透
- パイピング
- 流下能力の不足断面
- 水衝部の侵食に対する安全性

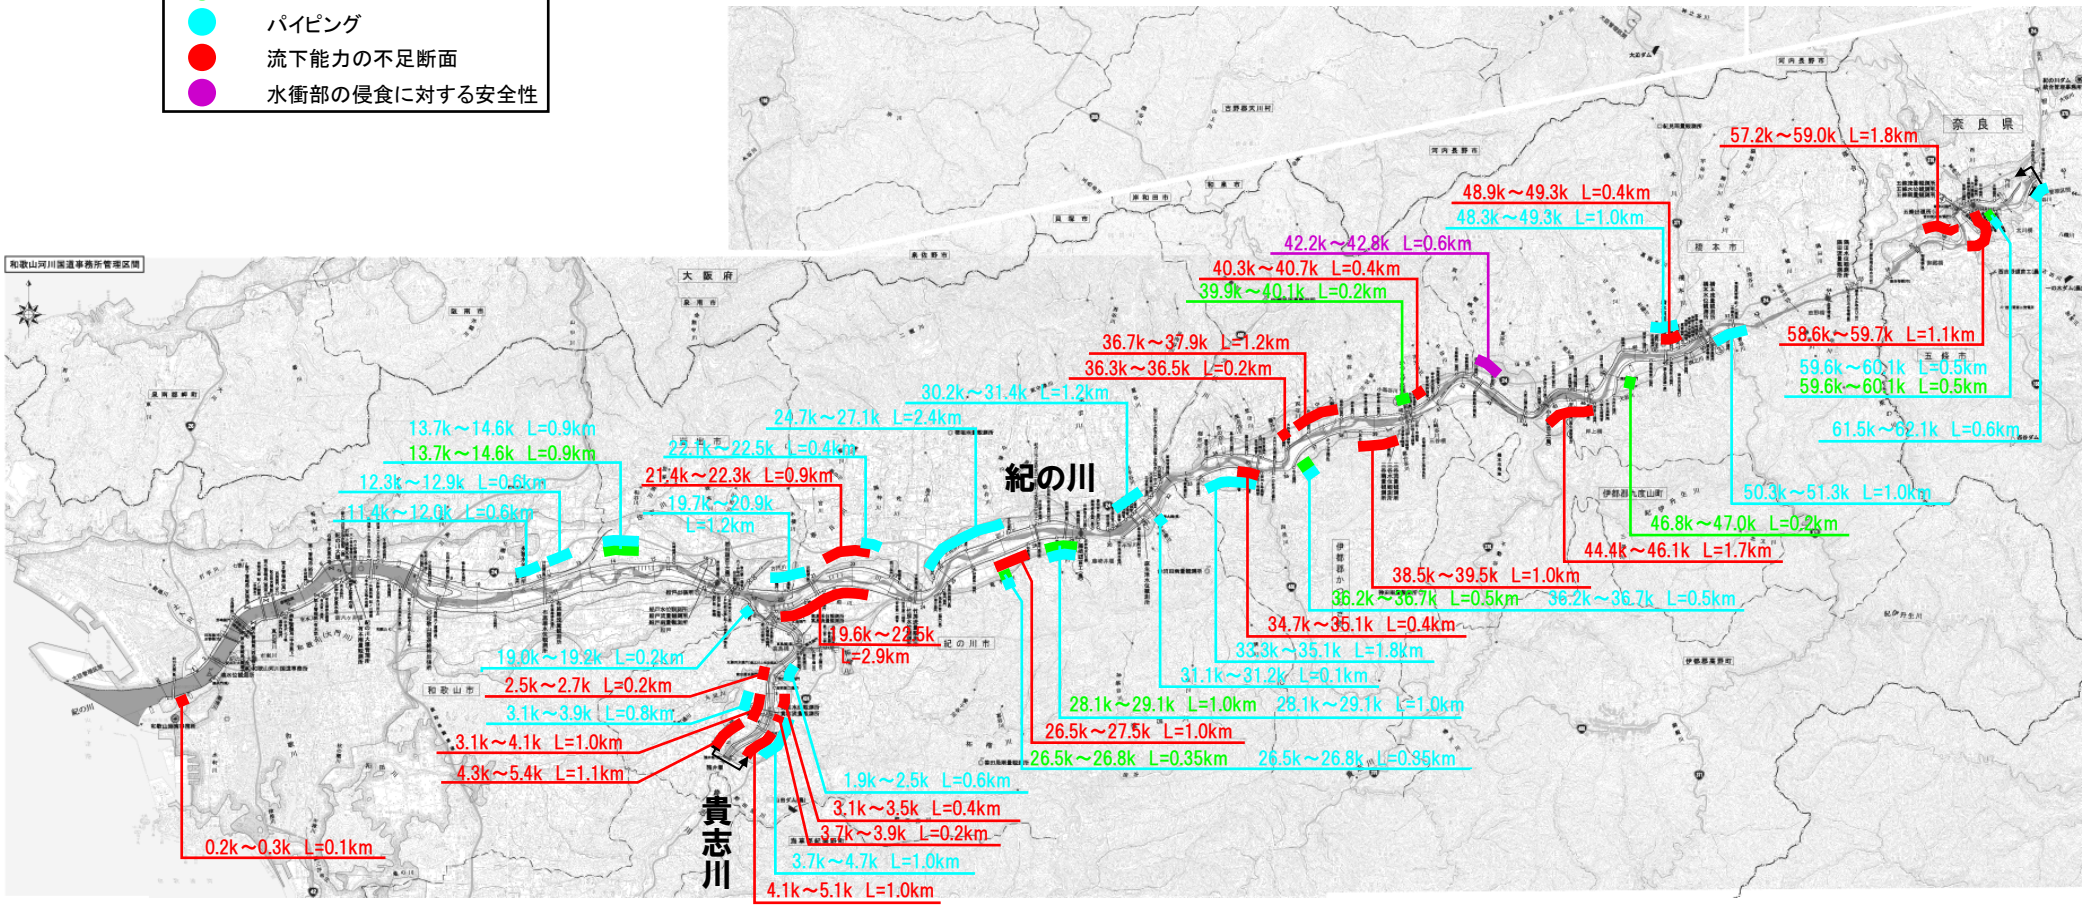

＜緊急点検結果＞

（単位：km）

直轄河川堤防延長	点検対象堤防延長	要対策延長（各対策の重複除く）	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の不足箇所	水衝部等の侵食に対する安全性
			堤防への浸透	パイピング		
111.0	78.5	34.7	3.6	16.7	17.0	0.6

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。
